

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
27	2023	REFORMA DA COBERTURA DO CMEI MENINO DEUS Esta intervenção foi concluída	Contrato 75/2023	180	12/07/2023	R\$ 599.264,14	100,00%

Nº27/2023
Data Inicial: 12/07/2023

REFORMA DA COBERTURA DO CMEI MENINO DEUS

R\$ 599.264,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

52623

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8628	2023	12/06/2023	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1078	580522	01/07/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.7*.4**-08	ART (CREA)	17**2*1**67**	Orçamento	Sim
CPF	06*.7*.4**-08	ART (CREA)	17**2*2**81**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.3*.9**-60	ART (CREA)	17**2*3**99**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.2*.7**-43	ART (CREA)	17**2*3**52**	Fiscalização	Não

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32605	R\$ 848.120,11	23/03/2022	
Contrato	75	2023	76.995.448/0001-54	32606	R\$ 599.264,14	10/05/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32639	Medição	1	Jurisdicionado	29/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	0,10%
32675	Medição	2	Jurisdicionado	28/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	0,10%
32701	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	0,10%
32717	Medição	4	Jurisdicionado	29/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	36,18%

32774	Medição	5	Jurisdicionado	28/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	36,18%
32796	Medição	6	Jurisdicionado	18/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	81,10%
32840	Medição	7	Jurisdicionado	26/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	81,10%
32887	Medição	8	Jurisdicionado	07/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2023	100,00%
32969	Conclusão	9	Jurisdicionado	08/04/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900160248677					

Nº27/2023
Data Inicial: 12/07/2023

REFORMA DA COBERTURA DO CMEI MENINO DEUS

Documentos

R\$ 599.264,14

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Prefeitura Municipal de Pato Branco		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
75/2023 GP	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/11/2023 a 17/01/2024
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 81,10%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS					TOTAL:	599.264,14	36,18	44,91	81,10	216.841,55	269.156,76	485.998,31
1.	TELHADOS				599.264,14	36,18	44,91	81,10	216.841,55	269.156,76	485.998,31	
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento				503.589,38	42,54	53,45	95,99	214.230,62	269.156,76	483.387,38	
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				144.957,24	60,00	40,00	100,00	86.974,34	57.982,90	144.957,24	
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				4.926,28	100,00	-	100,00	4.926,28	-	4.926,28	
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				8.620,99	100,00	-	100,00	8.620,99	-	8.620,99	
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				277.103,25	35,00	65,00	100,00	96.986,14	180.117,11	277.103,25	
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				11.040,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				9.162,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P				36.947,10	35,00	65,00	100,00	12.931,49	24.015,61	36.947,10	
1.1.8.	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO				5.891,52	35,00	65,00	100,00	2.062,03	3.829,49	5.891,52	
1.1.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO				4.941,00	35,00	65,00	100,00	1.729,35	3.211,65	4.941,00	
1.2.	Forro de PVC				91.997,38	2,84	-	2,84	2.610,93	-	2.610,93	
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				2.610,93	100,00	-	100,00	2.610,93	-	2.610,93	
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P				86.246,85	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M				3.139,60	-	-	-	-	-	-	
1.3.	OUTROS				3.677,38	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				475,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA				3.202,08	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Prefeitura Municipal de Pato Branco		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
75/2023 GP	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
PERÍODO DA MEDIÇÃO					
30/11/2023 a 17/01/2024					

Realizado Acumulado: 81,10%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS											
TOTAL:					599.264,14	36,18	44,91	81,10	216.841,55	269.156,76	485.998,31

PATO BRANCO
Local

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-185508/D
ART/RRT: 1720233705221

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.18 15:10:20 -03'00'

Medição 02



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados no CMEI MENINO DEUS, Rua Pedro Ramires De Mello, nº 1067, Bairro Menino Deus, CEP: 85502-050 no município de Pato Branco/PR.

Contrato nº 75/2023/GP

Relatório de Medição nº 02


Empresa Contratada: *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*
Responsável: *Lincoln Fernando Machado de Souza*

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:







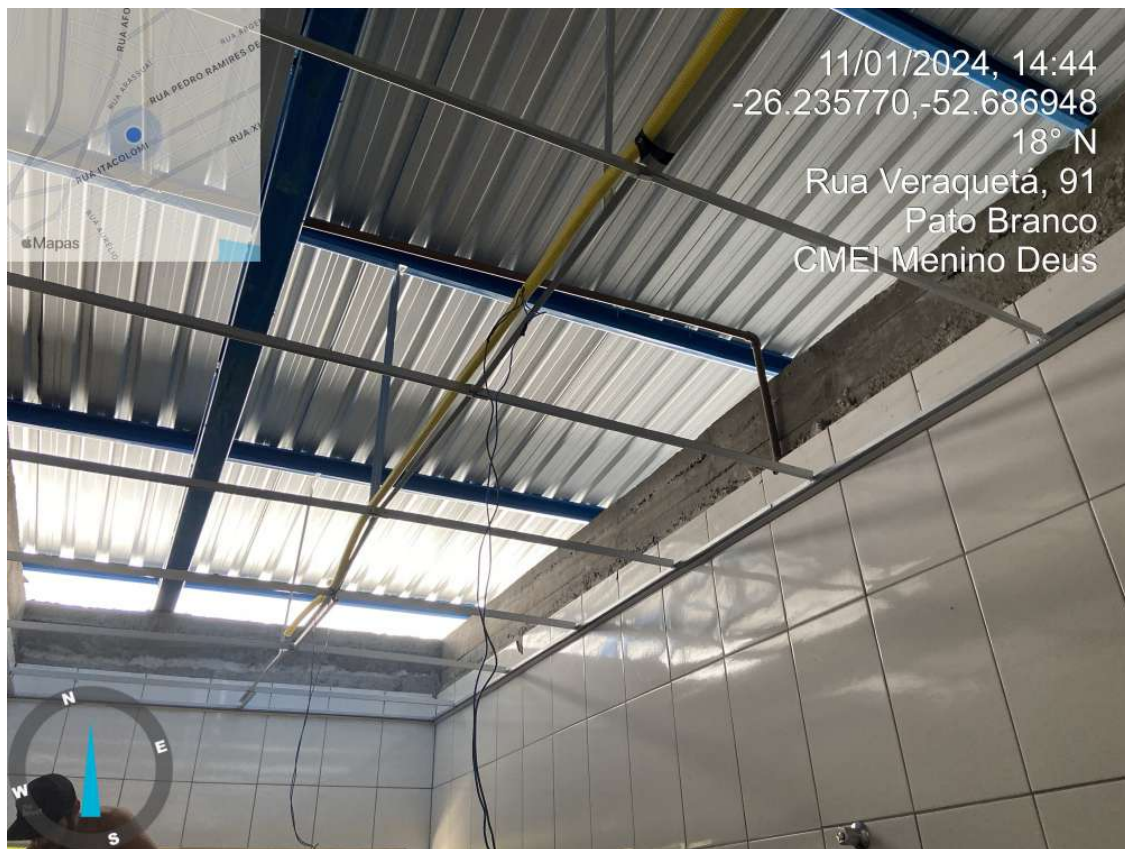







Medição 02



























Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 269.156,76**.

Pato Branco, 17 de janeiro de 2024.

JAKELINE LOUREIRO:
098029749
43

Assinado de forma digital por
JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.18 15:08:30 -03'00'

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
0		0		0		0		0000/00	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/01/1900 a 07/03/2024	
0		0		0		3		Nº MEDIÇÃO 3	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS				TOTAL:							
1.1.	TELHADOS	-	-	-	599.264,14	-	-	-	486.998,31	113.265,83	599.264,14
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	599.264,14	-	-	-	486.998,31	113.265,83	599.264,14
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	2.338,02	62,00	144.957,24	2.338,02	-	2.338,02	144.957,24	-	144.957,24
1.1.1.	AF_07/2019	M2	1.231,57	4,00	4.926,28	1.231,57	-	1.231,57	4.926,28	-	4.926,28
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.231,57	7,00	8.620,99	1.231,57	-	1.231,57	8.620,99	-	8.620,99
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAVA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.231,57	225,00	277.103,25	1.231,57	-	1.231,57	277.103,25	-	277.103,25
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1.231,57	92,00	110.040,00	-	92,00	92,00	-	11.040,00	11.040,00
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	122,16	75,00	9.162,00	-	122,16	122,16	-	9.162,00	9.162,00
1.1.6.	RUPO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1.231,57	30,00	36.947,10	1.231,57	-	1.231,57	36.947,10	-	36.947,10
1.1.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.231,57	86,64	5.891,52	68,00	-	68,00	5.891,52	-	5.891,52
1.1.8.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	68,00	1,83	4.941,00	2.700,00	-	2.700,00	4.941,00	-	4.941,00
1.1.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARVUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	2.700,00	-	91.997,38	-	-	-	2.610,93	89.386,45	91.997,38
1.2.	Forno de PVC	-	-	-	2.610,93	-	-	-	-	-	2.610,93
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.231,57	70,03	86.246,85	-	1.231,57	1.231,57	86.246,85	-	86.246,85
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.231,57	6,68	3.139,60	-	470,00	470,00	3.139,60	-	3.139,60
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	470,00	-	3.677,38	-	-	-	-	-	3.677,38
1.3.	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,00	9,70	475,30	-	49,00	49,00	-	475,30	475,30
1.3.2.	LMPEZA DE OBRA	M2	1.231,57	2,60	3.202,08	-	1.231,57	1.231,57	-	3.202,08	3.202,08

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PMW3.0.4



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0 TROCA DE TELHADOS	000/100
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	(SELECIONAR)	3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS					TOTAL:	599.264,14	-	-	485.998,31	-113.265,83	599.264,14

PATO BRANCO
Local
Data quinta-feira, 7 de março de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREMCAU: 0
ART/RRT: 0

Assinado



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados no CMEI MENINO DEUS, Rua Pedro Ramires De Mello, nº 1067, Bairro Menino Deus, CEP: 85502-050 no município de Pato Branco/PR.

Contrato nº 75/2023/GP

Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
Responsável: Lincoln Fernando Machado de Souza

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 113.266,83**.











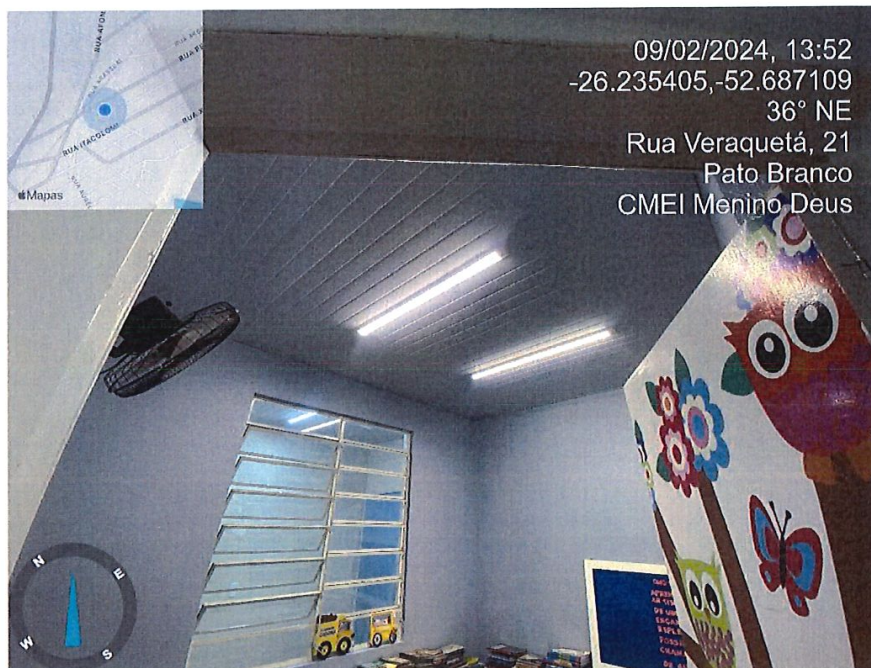





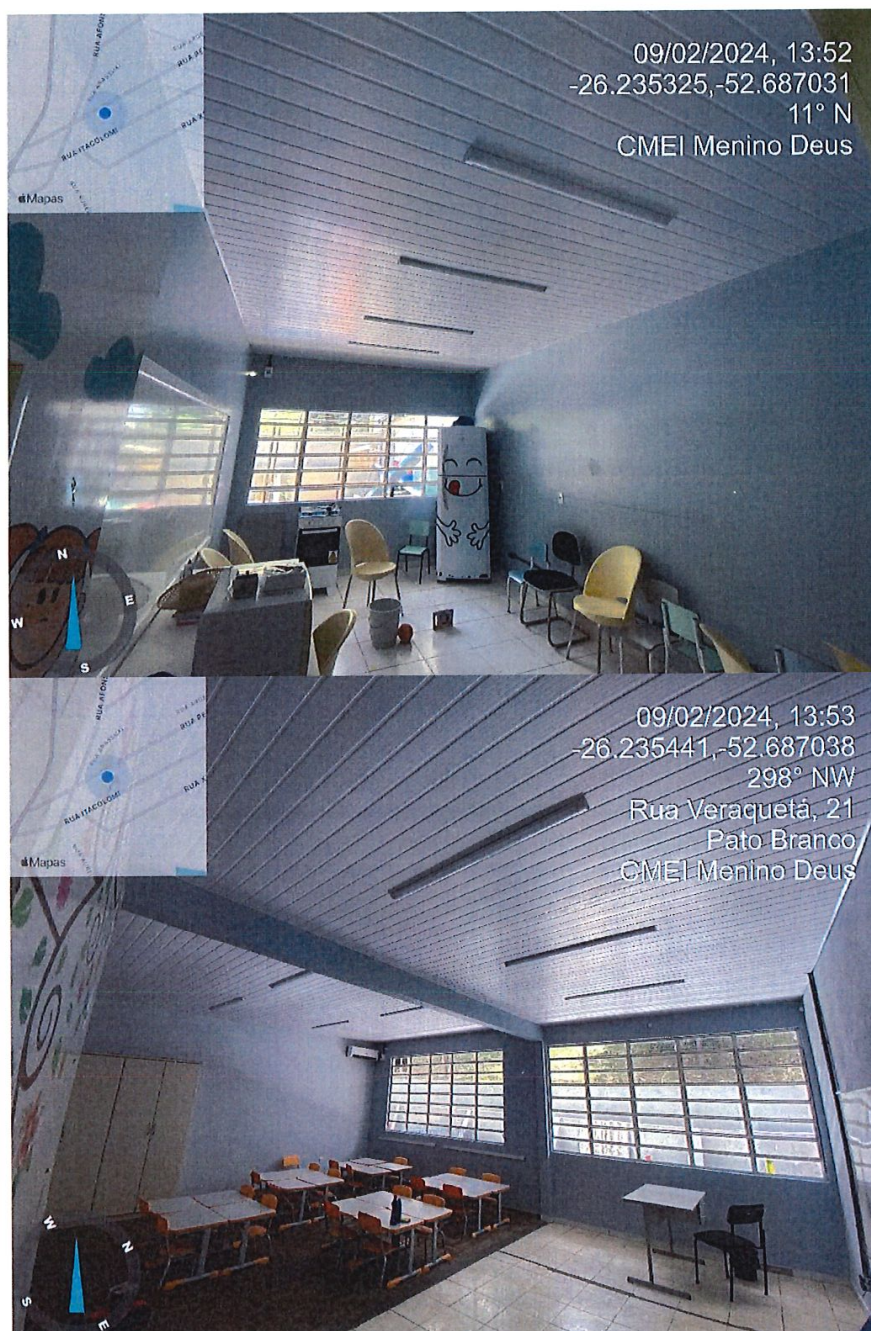

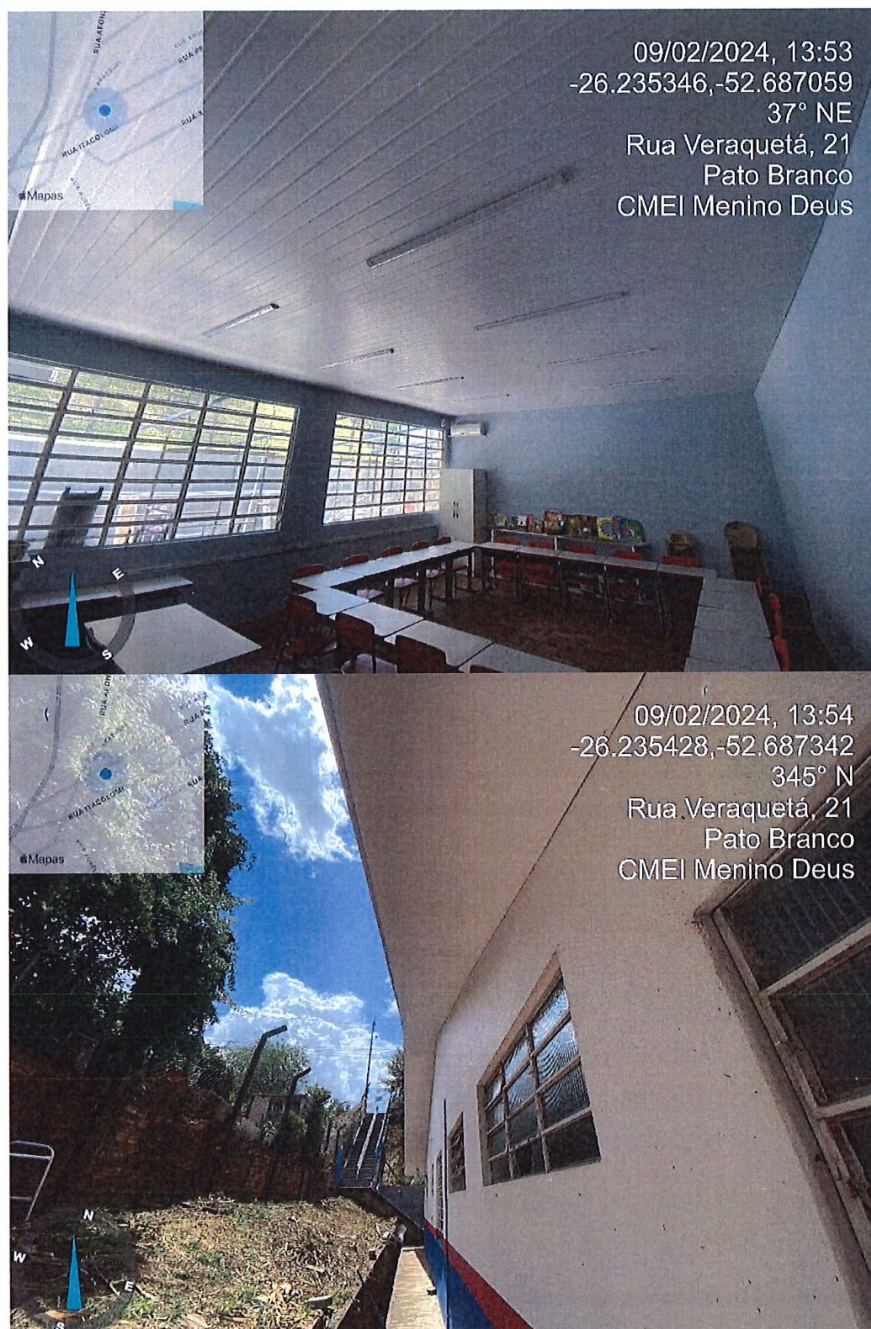



Pato Branco, 26 de fevereiro de 2024.


ADERNANDA PAULA DOS SANTOS
Engenheira Civil
CREA-SC12602-0/D
