

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
33	2023	REFORMA DA UBS DO BAIRRO ALVORADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 160/2023	90	04/12/2023	R\$ 149.911,25	100,00%
33	2023	REFORMA DA UBS DO BAIRRO ALVORADA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	90	04/12/2023	R\$ 149.911,25	100,00%

Nº33/2023
Data Inicial: 04/12/2023

REFORMA DA UBS DO BAIRRO ALVORADA

R\$ 149.911,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

76418

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18646	2023	21/12/2023	12433
3009	2024	11/03/2024	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1129	580522	21/12/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*0**09**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.2**-80	ART (CREA)	17**2*3**77**	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.2**-80	ART (CREA)	17**2*3**77**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32743	R\$ 189.999,95	05/07/2023	
Contrato	160	2023	76.995.448/0001-54	32744	R\$ 149.911,25	06/11/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.448/0001-54	32921	R\$ 68.196,01	05/03/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32784	Medição	1	Jurisdicionado	22/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	50,71%
32826	Medição	2	Jurisdicionado	26/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	50,71%
32870	Medição	3	Jurisdicionado	26/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	50,71%
32920	Medição	4	Jurisdicionado	11/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2023	100,00%

32922	Medição	5	Jurisdicionado	11/03/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
32965	Conclusão	6	Jurisdicionado	08/04/2024			

Nº33/2023
Data Inicial: 04/12/2023

REFORMA DA UBS DO BAIRRO ALVORADA

Documentos

R\$ 149.911,25

Planilha Base

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV
0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE
CURITIBA	03-23 (N. DES.)

Item	Fonte	Código
------	-------	--------

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA

1.		
1.1.		
1.1.1.	Composição	01
1.2.		
1.2.1.	Composição	02
1.3.		
1.3.1.	SINAPI	97638
1.3.2.	Composição	03
1.3.3.	SINAPI	97644
1.3.4.	SINAPI	97645
1.3.5.	SINAPI	97622
1.3.6.	SINAPI	97634
1.4.		
1.4.1.	Composição	04
1.4.2.	SINAPI-I	11587
1.5.		
1.5.1.	SINAPI-I	11795
1.5.2.	SINAPI	86889

1.5.3.	SINAPI	93441
1.6.		
1.6.1.	SINAPI	96359
1.6.2.	SINAPI	88485
1.6.3.	SINAPI	88489
1.6.4.	Composição	05
1.6.5.	SINAPI	103332
1.7.		
1.7.1.	SINAPI	86939
1.7.2.	Composição	06
1.7.3.	SINAPI	97665
1.7.4.	SINAPI	103782
1.7.5.	Composição	07
1.7.6.	Composição	08
1.7.7.	SINAPI	97631
1.7.8.	SINAPI	89362
1.7.9.	SINAPI	89378
1.7.10.	SINAPI	89714
1.7.11.	SINAPI-I	9866

Planilha Base

1.7.12.	SINAPI	91785
1.7.13.	SINAPI	104475
1.7.14.	SINAPI	104473
1.7.15.	SINAPI	98307
1.7.16.	SINAPI	98294
1.8.		
1.8.1.	SINAPI	104476
1.8.2.	SINAPI	89865
1.8.3.	SINAPI	89866
1.8.4.	SINAPI	89868
1.8.5.	SINAPI	89869
1.9.		
1.9.1.	SINAPI	87273
1.10.		

1.10.1.	SINAPI	88424
1.11.		
1.11.1.	SINAPI	100754
1.12.		
1.12.1.	SINAPI	94228
1.12.2.	Composição	13
1.13.		
1.13.1.	SINAPI	104606
1.14.		
1.14.1.	SINAPI	91321
1.14.2.	SINAPI-I	11561
1.14.3.	Composição	12
1.14.4.	SINAPI	102219
1.14.5.	Composição	14
1.15.		
1.15.1.	SINAPI	99814

Encargos sociais:

Para elaboração

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas
 Siglas da Composição do Investimento: RA - R

PATO BRANCO/PR

Local

quarta-feira, 5 de julho de 2023

Data

Planilha Base

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	
DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA		MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	
Descrição	Unidade	Quantidade	
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.20	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE (INTEGRAL) E VIGIA NOTURNO	MÊS	3.00	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18.95	
RETIRAR GUARNIÇÃO E BATENTE DE PORTAS	UN	28.00	
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7.00	
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.25	
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1.47	
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	203.70	
TROCA DE FORRO			
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA METÁLICA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	35.75	
	M2	74.79	
BANCADAS E EQUIPAMENTOS			
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	15.91	
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3.00	

Planilha Base

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00
REVESTIMENTO INTERNO E PAREDE		
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	26.00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,184.00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,184.00
RESSALTO EM GRANITO/MARMORE PARA CONTENÇÃO HIDRÁULICA	M	8.00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3.00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00
FIXAÇÃO HORIZONTAL PIA/LAVATÓRIO COM ARGAMASSA COLANTE (INCLUSO MÃO DE OBRA)	UN	4.00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14.00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	14.00
TROCA FIOS DE COBRE/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	180.00
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA	M2	4.00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16.00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2.00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2.00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3.00
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	M	3.00

Planilha Base

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4.00
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	22.00
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	5.00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9.00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	229.71
PONTO DE AR CONDICIONADO		
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	4.00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12.00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4.00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4.00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4.00
REVESTIMENTO BANHEIROS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	21.08
PINTURA ÁREA EXTERNA		

Planilha Base

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	618.28
PINTURA CERCAMENTO		
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	444.12
COBERTURA		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12.80
CORREÇÃO DE TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DE CALHA, DN 100	M	6.00
RESVESTIMENTO DE PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	203.70
PORTAS/BATENTES		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9.00
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	1.00
COLOCAÇÃO DE BATENTE/ GUARNIÇÃO E PORTA	UN	28.00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	105.84
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE CORRER, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3.00
LIMPEZA FINAL DE OBRA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	203.70

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicac

--

decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapar

Planilha Base

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO BELLEI

CREA/CAU: 164.074/D

ART/RRT:

	BDI 1 24.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0,00%
Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			189,999.95
			189,999.95
			597.41
399.97	BDI 1	497.84	597.41
			12,379.29
3,315.20	BDI 1	4,126.43	12,379.29
			5,111.25
9.37	BDI 1	11.66	220.96
24.55	BDI 1	30.56	855.68
10.76	BDI 1	13.39	93.73
37.98	BDI 1	47.27	200.90
65.71	BDI 1	81.79	120.23
14.28	BDI 1	17.77	3,619.75
			15,777.18
99.42	BDI 1	123.75	4,424.06
121.96	BDI 1	151.80	11,353.12
			16,698.76
618.86	BDI 1	770.30	12,255.47
776.56	BDI 1	966.58	2,899.74

Planilha Base

1,240.10	BDI 1	1,543.55	1,543.55
			34,038.36
110.51	BDI 1	137.55	3,576.30
3.28	BDI 1	4.08	4,830.72
16.88	BDI 1	21.01	24,875.84
26.31	BDI 1	32.75	262.00
132.16	BDI 1	164.50	493.50
			21,157.79
396.57	BDI 1	493.61	1,974.44
59.91	BDI 1	74.57	298.28
1.50	BDI 1	1.87	26.18
40.74	BDI 1	50.71	709.94
38.38	BDI 1	47.77	8,598.60
124.53	BDI 1	155.00	620.00
3.85	BDI 1	4.79	76.64
10.81	BDI 1	13.46	26.92
7.98	BDI 1	9.93	19.86
41.75	BDI 1	51.97	155.91
23.62	BDI 1	29.40	88.20

Planilha Base

52.42	BDI 1	65.25	261.00
159.21	BDI 1	198.17	4,359.74
189.00	BDI 1	235.25	1,176.25
53.94	BDI 1	67.14	604.26
7.56	BDI 1	9.41	2,161.57
			1,437.08
203.47	BDI 1	253.26	1,013.04
19.63	BDI 1	24.43	293.16
8.36	BDI 1	10.41	41.64
6.33	BDI 1	7.88	31.52
11.59	BDI 1	14.43	57.72
			2,056.99
78.40	BDI 1	97.58	2,056.99
			17,546.79

Planilha Base

22.80	BDI 1	28.38	17,546.79
			18,790.72
33.99	BDI 1	42.31	18,790.72
			1,874.46
108.34	BDI 1	134.85	1,726.08
19.87	BDI 1	24.73	148.38
			18,123.19
71.48	BDI 1	88.97	18,123.19
			23,834.21
885.92	BDI 1	1,102.70	9,924.30
231.59	BDI 1	288.26	288.26
130.35	BDI 1	162.25	4,543.00
18.76	BDI 1	23.35	2,471.36
1,769.45	BDI 1	2,202.43	6,607.29
			576.47
2.27	BDI 1	2.83	576.47

la.

tida; OU - 100% Outros.



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE 01



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVORADA							
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	471,36
1.1.1.		1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,2	R\$ 392,80	R\$ 471,36
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			R\$	9.767,25
1.2.1		2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE (INTERNA) E VIGIA NOTURNO	MÊS	3	R\$ 3.235,75	R\$ 9.767,25
1.3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R\$	4.032,60
1.3.1		97638	DEMOLIÇÃO DE CHAPAS E FERRIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	18,95	R\$ 9,20	R\$ 174,34
1.3.2		3	RETRABALHO DE GUARNIÇÃO E BATENTE DE PORTAS	UN	28	R\$ 24,11	R\$ 675,08
1.3.3		97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	7	R\$ 10,56	R\$ 73,92
1.3.4		97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,25	R\$ 37,30	R\$ 158,53
1.3.5		97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,47	R\$ 64,53	R\$ 94,86
1.3.6		97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	203,7	R\$ 14,02	R\$ 2.855,87
1.4			TROCA DE FORRO			R\$	12.448,23
1.4.1		4	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA METÁLICA	M²	35,75	R\$ 97,64	R\$ 3.490,63
1.4.2		11587	FORRO DE PVC ISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M²	74,79	R\$ 119,77	R\$ 8.957,60
1.5			BANCADES E EQUIPAMENTOS			R\$	13.175,37
1.5.1		11795	GRANITO PARA BANCADEIRA, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	M²	15,91	R\$ 607,77	R\$ 9.669,62
1.5.2		86889	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 762,63	R\$ 2.287,89
1.5.3		93441	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.217,86	R\$ 1.217,86
1.6			REVESTIMENTO INTERNO E PAREDE			R\$	26.861,07
1.6.1		96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÁZIOS AF_06/2017. PS	M²	26	R\$ 108,53	R\$ 2.821,78
1.6.2		88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1184	R\$ 3,22	R\$ 3.812,48
1.6.3		88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1184	R\$ 16,58	R\$ 19.630,72
1.6.4		5	RESALTO EM GRANITO/MANIORE PARA CONTENÇÃO HIDRÁULICA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	3	R\$ 129,79	R\$ 389,37
1.7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS			R\$	16.692,51
1.7.1		86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUIU SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 389,46	R\$ 1.557,84
1.7.2		6	FIXAÇÃO HORIZONTAL PIA/LAVATÓRIO COM ARGAMASSA COLANTE (INCLUIU MÃO DE OBRA) AF_12/2017	UN	4	R\$ 58,84	R\$ 235,36
1.7.3		97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14	R\$ 1,48	R\$ 20,72
1.7.4		103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBRADOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	14	R\$ 40,01	R\$ 560,14
1.7.5		7	TROCA FIOS DE COBRE/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	180	R\$ 37,69	R\$ 6.784,20
1.7.6		8	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA	M²	4	R\$ 122,30	R\$ 489,20
1.7.7		97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	16	R\$ 3,78	R\$ 60,48
1.7.8		89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 10,62	R\$ 21,24
1.7.9		89378	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 7,83	R\$ 15,66
1.7.10		89714	TUBO PVC, SRIE NORMAL, ESGOTO PRELIMINAR, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00
1.7.11		9866	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", ÁGUA FRIA, PRELIMINAR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMÁRIA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIÇOS AF_10/2015	M	3	R\$ 23,20	R\$ 69,60
1.7.12		91785	FIXAÇÃO DE TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", ÁGUA FRIA, PRELIMINAR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMÁRIA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIÇOS AF_10/2015	M	4	R\$ 51,48	R\$ 205,92



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE 01



1.7.13	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022	UN	22	R\$	156,36	R\$	3.439,92
1.7.14	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELTRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA), AF_11/2022	UN	5	R\$	185,61	R\$	928,05
1.7.15	SINAPI	98307	CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA), AF_11/2022	UN	9	R\$	52,97	R\$	476,73
1.7.16	SINAPI	98294	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	M	229,71	R\$	7,42	R\$	1.704,45
1.8	SINAPI		CABO ELÉTRICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	M				R\$	1.133,92
1.8.1	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022	UN	4	R\$	199,82	R\$	799,28
1.8.2	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	12	R\$	19,28	R\$	231,36
1.8.3	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4	R\$	8,21	R\$	32,84
1.8.4	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4	R\$	6,22	R\$	24,88
1.8.5	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4	R\$	11,39	R\$	45,56
1.9	SINAPI		REVESTIMENTO BANHEIROS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO					R\$	1.622,95
1.9.1	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	M²	21,08	R\$	76,99	R\$	1.622,95
1.10	SINAPI		PINTURA ÁREA EXTERNA					R\$	13.843,29
1.10.1	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES, AF_06/2014	M²	618,28	R\$	22,39	R\$	13.843,29
1.11	SINAPI		PINTURA CERCAMENTO					R\$	14.824,73
1.11.1	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERÍLI EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M²	444,12	R\$	33,38	R\$	14.824,73
1.12	SINAPI		COBERTURA					R\$	1.478,98
1.12.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	12,8	R\$	106,40	R\$	1.361,92
1.12.2	COMPOSIÇÃO	13	CORREÇÃO DE TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DE CALHA, DN 100	M	6	R\$	19,51	R\$	117,06
1.13	SINAPI	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 9 M² E 10 M², AF_02/2023_PE	M²	203,7	R\$	70,20	R\$	14.299,74
1.13.1	SINAPI		REVESTIMENTO DE PISO					R\$	14.299,74
1.14	SINAPI		PORTAS/BATENTES					R\$	18.805,00
1.14.1	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ÍTEMS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	9	R\$	870,03	R\$	7.830,27
1.14.2	SINAPI	11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1.100 MM E PESO DE ATÉ 85 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRAÇO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	UN	1	R\$	227,44	R\$	227,44
1.14.3	COMPOSIÇÃO	12	COLOCAÇÃO DE BATENTE/GUARNIÇÃO E PORTA	UN	28	R\$	128,02	R\$	3.584,56
1.14.4	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M²	105,84	R\$	18,42	R\$	1.949,57
1.14.5	COMPOSIÇÃO	14	ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	UN	3	R\$	1.737,72	R\$	5.213,16
1.15	SINAPI		KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE CORRER, FOLHA MÉDIA (NBR 15390) DE 800 X 2100 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN				R\$	454,25
1.15.1	SINAPI	99814	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	203,7	R\$	2,23	R\$	454,25
			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M²					
			TOTAL			R\$			149.911,25

LOCAL: PATO BRANCO, 29 DE SETEMBRO DE 2023

RICARDO ZAUMPIERON MARIN
SÓCIO/PROPRIETÁRIO

DANIEL SIMIONATO
SÓCIO/PROPRIETÁRIO



GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2024

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 160/2023/GP, que entre si celebram o **Município de Pato Branco** e **Marin e Simionato Serviços de Engenharia e Construtora LTDA**, na forma que segue.

Pelo presente Termo, de um lado o **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 85.501-064, Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Jardim das Américas, CEP 85.502-040, Pato Branco - PR, denominado como **CONTRATANTE**, e **Marin e Simionato Serviços de Engenharia e Construtora Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 48.691.405/0001-40, com sede na Rua das Américas, nº 68, Sala 201, Bairro Centro, no município de Coronel Vivida/PR, CEP 85.550 -000, Telefone (46) 999241170, (46) 984060323, E -mail: comercial.engms@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **Ricardo Zampieron Marin**, brasileiro, inscrito no CPF nº 072.530.749 -80, portador do RG nº 10.611.165 -0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Benjamin Bordin, nº 158, Bairro Bordin, no município de Coronel Vivida/PR, CEP 85.550 -000, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tendo certo e ajustado o termo de aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 160/2023, oriundo do **Edital de Tomada de Preços nº 06/2023 - Processo nº 139/2023**, formalizado através do processo administrativo nº 3.123/2024, que independente da sua transcrição, integra o presente instrumento, pactuando-se as seguintes cláusulas e condições.

Cláusula Primeira – Do Prazo de Execução

I – Com base na Lei 8.666/93, especialmente em seu Art. 57, § 1º, Inciso I e II, as partes pactuam prorrogação do prazo de execução contratual para mais 30 (trinta) dias, ou seja, prazo de execução até 04 de abril de 2024.

Cláusula Segunda - Do Acréscimo

I – Com base na Lei nº 8.666/93, especialmente em seu Art. 65, I, alíneas "a" e "b", § 1º, bem como a justificativa apresentada pelo fiscal da obra e da Secretária de Saúde, as partes pactuam o aditivo no valor de **R\$ 68.196,01 (sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e um centavo)**, conforme Anexo I – Planilha de Serviços Itens Acrescidos.

Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária

I – Para suporte da despesa do objeto da presente licitação será empregada a seguinte Dotação Orçamentária:

a) 08.07 Secretaria Municipal de Saúde – Administração da Saúde. 103020043.1.129000 Construção, Ampliação e Reformas da Estrutura Física da Saúde. Fonte 5352. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Código Reduzido: Despesa 14218 – Desdobramento 14234.

Cláusula Quarta – Da Vigência

I – Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Pato Branco, 05 de março de 2024.

Município de Pato Branco – Contratante
Robson Cantu – Prefeito

Marin e Simionato Serviços de Engenharia e Construtora Ltda. - Contratada
Ricardo Zampieron Marin - Representante Legal



ANEXO I - PLANILHA DE SERVIÇOS
ITENS ACRESCIDOS

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROponente / TOMADOR	APELO DO EMPREENDIMENTO
0	01	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	UBS ALVORADA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	03-23 (Nº DES.)	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01	PATO BRANCO - PR
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01									
1.			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01						68.196,01
1.1.			DEMOLICOES E RETIRADAS						68.196,01
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,00	37,98	BDI 1	47,27	283,62
1.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	247,34	14,28	BDI 1	17,77	4.395,23
1.2.			PONTO DE AR CONDICIONADO						1.048,88
1.2.1.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORNO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	M	14,00	60,19	BDI 1	74,92	1.048,88
1.3.			REVESTIMENTO INTERNO E PAREDE						1.308,84
1.3.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,00	132,16	BDI 1	164,50	987,00
1.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,00	4,64	BDI 1	5,78	34,68
1.3.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	6,00	38,45	BDI 1	47,86	287,16
1.4.			PINTURA ÁREA EXTERNA						340,56
1.4.1.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAVOS COM PRESEÇA DE Vãos DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	12,00	22,80	BDI 1	28,38	340,56
1.5.			REVESTIMENTO DE PISO						32.577,73
1.5.1.	SINAPI	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	247,34	71,48	BDI 1	88,97	22.005,84
1.5.2.	SINAPI	88850	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	446,85	16,74	BDI 1	20,84	9.312,35
1.5.3.	SINAPI-4	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM PRETE)	M3	0,80	231,35	BDI 1	287,96	230,37
1.5.4.	SINAPI	98889	SOLEIRA EM GRÁNITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,15	115,64	BDI 1	143,94	1.029,17
1.6.			PORTAS/BATENTES						23.538,39



CABINETE DO PREFEITO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	UBS ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-23 (N. DES.)	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01	PATO BRANCO - PR	24,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01									
16.1.	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	885,92	BDI 1	1.102,70	11.027,00
16.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	41,00	18,76	BDI 1	23,35	957,35
16.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,68	10,76	BDI 1	13,39	76,06
16.4.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM QUARINÇÃO, EIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,68	1.589,45	BDI 1	1.978,39	11.237,26
16.5.	SINAPI-I	43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMÍNIO, TIPO U, COM DIMENSÕES DE 38 X 38 MM PARA PORTA DE CORRER	M	4,60	42,04	BDI 1	52,33	240,72
17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4.003,44
17.1.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBEAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	14,00	189,00	BDI 1	235,25	3.293,50
17.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLACON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	14,00	40,74	BDI 1	50,71	709,94
18.			LIMPEZA FINAL DE OBRA						699,32
18.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	247,11	2,27	BDI 1	2,83	699,32
									RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO - PR
Local
Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BELLEI



Planilha Aditivo 01



CABINETE DO PREFEITO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	UBS ALVORADA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	03-23 (N DES.)	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01	PATO BRANCO - PR
			BDI 1
			24,47%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01									
68.196,01									

DATA: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 172023427795

RECURSO



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 3D41-5C0F-F70F-7F71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 06/03/2024 13:41:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORA (CNPJ 48.691.405/0001-40)
em 06/03/2024 13:53:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:


<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3D41-5C0F-F70F-7F71>









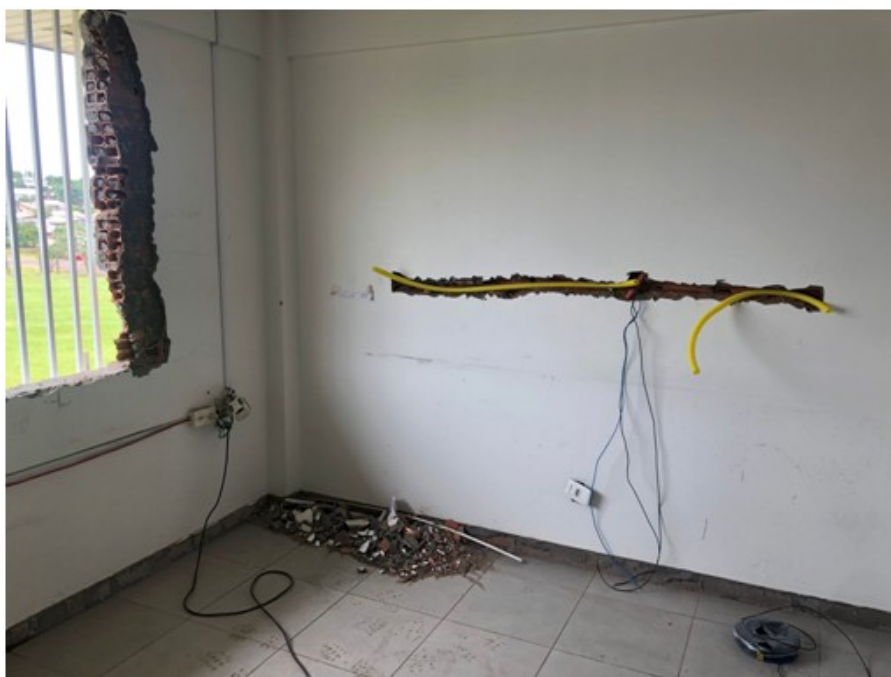

Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	UBS ALVORADA	04/12/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		04/12/2023 a 22/12/2023
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 50,71%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA					TOTAL:	149.911,25	-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57
1.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA				149.911,25	-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				471,36	-	100,00	100,00	-	471,36	471,36	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				471,36	-	100,00	100,00	-	471,36	471,36	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				9.767,25	-	66,69	66,69	-	6.513,78	6.513,78	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE (INTEGRAL) E VIGIA NOTURNO				9.767,25	-	66,69	66,69	-	6.513,78	6.513,78	
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.032,60	-	100,00	100,00	-	4.032,60	4.032,60	
1.3.1.	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				174,34	-	100,00	100,00	-	174,34	174,34	
1.3.2.	RETIRAR GUARNIÇÃO E BATENTE DE PORTAS				675,08	-	100,00	100,00	-	675,08	675,08	
1.3.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				73,92	-	100,00	100,00	-	73,92	73,92	
1.3.4.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				158,53	-	100,00	100,00	-	158,53	158,53	
1.3.5.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				94,86	-	100,00	100,00	-	94,86	94,86	
1.3.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				2.855,87	-	100,00	100,00	-	2.855,87	2.855,87	
1.4.	TROCA DE FORRO				12.448,23	-	100,00	100,00	-	12.448,23	12.448,23	
1.4.1.	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA METÁLICA				3.490,63	-	100,00	100,00	-	3.490,63	3.490,63	
1.4.2.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)				8.957,60	-	100,00	100,00	-	8.957,60	8.957,60	
1.5.	BANCADAS E EQUIPAMENTOS				13.175,37	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM				9.669,62	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2.287,89	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.217,86	-	-	-	-	-	-	
1.6.	REVESTIMENTO INTERNO E PAREDE				26.861,07	-	11,95	11,95	-	3.211,15	3.211,15	
1.6.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017 PS				2.821,78	-	100,00	100,00	-	2.821,78	2.821,78	
1.6.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				3.812,48	-	-	-	-	-	-	
1.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				19.630,72	-	-	-	-	-	-	
1.6.4.	RESSALTO EM GRANITO/MARMORE PARA CONTENÇÃO HIDRÁULICA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X10 CM / ESPESSURA 8 CM E ARGAMASSA DE				206,72	-	-	-	-	-	-	
1.6.5.					280,27	-	100,00	100,00	-	280,27	280,27	

Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	Início de Obra 04/12/23
Nº CTEF 0	Empresa Executora 0	CNPJ 0	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 1
				Período da Medição 04/12/2023 a 22/12/2023	

Realizado Acumulado: 50,71%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA					-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57
TOTAL:					-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57
1.7.1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1.557,84	-	100,00	100,00	-	1.557,84	1.557,84
1.7.2.	FIXAÇÃO HORIZONTAL PIA/LAVATÓRIO COM ARGAMASSA COLANTE (INCLUSO MÃO DE OBRA)			235,36	-	100,00	100,00	-	235,36	235,36
1.7.3.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			20,72	-	100,00	100,00	-	20,72	20,72
1.7.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022			560,14	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	TROCA FIOS DE COBRE/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			6.784,20	-	100,00	100,00	-	6.784,20	6.784,20
1.7.6.	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA			489,20	-	100,00	100,00	-	489,20	489,20
1.7.7.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			60,48	-	100,00	100,00	-	60,48	60,48
1.7.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			21,24	-	100,00	100,00	-	21,24	21,24
1.7.9.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			15,66	-	100,00	100,00	-	15,66	15,66
1.7.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			123,00	-	100,00	100,00	-	123,00	123,00
1.7.11.	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL			69,60	-	100,00	100,00	-	69,60	69,60
1.7.12.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			205,92	-	100,00	100,00	-	205,92	205,92
1.7.13.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022			3.439,92	-	100,00	100,00	-	3.439,92	3.439,92
1.7.14.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022			928,05	-	100,00	100,00	-	928,05	928,05
1.7.15.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			476,73	-	100,00	100,00	-	476,73	476,73
1.7.16.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			1.704,45	-	100,00	100,00	-	1.704,45	1.704,45
1.8.	PONTO DE AR CONDICIONADO			1.133,92	-	100,00	100,00	-	1.133,92	1.133,92

Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APelido do Empreendimento UBS ALVORADA	INÍCIO DE OBRA 04/12/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/12/2023 a 22/12/2023
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 50,71%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA					-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57
1.8.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022			799,28	-	100,00	100,00	-	799,28	799,28
1.8.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			231,36	-	100,00	100,00	-	231,36	231,36
1.8.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			32,84	-	100,00	100,00	-	32,84	32,84
1.8.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			24,88	-	100,00	100,00	-	24,88	24,88
1.8.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			45,56	-	100,00	100,00	-	45,56	45,56
1.9.	REVESTIMENTO BANHEIROS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			1.622,95	-	100,00	100,00	-	1.622,95	1.622,95
1.9.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE			1.622,95	-	100,00	100,00	-	1.622,95	1.622,95
1.10.	PINTURA ÁREA EXTERNA			13.843,29	-	-	-	-	-	-
1.10.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_ 06/2014			13.843,29	-	-	-	-	-	-
1.11.	PINTURA CERCAMENTO			14.824,73	-	45,20	45,20	-	6.700,78	6.700,78
1.11.1.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020			14.824,73	-	45,20	45,20	-	6.700,78	6.700,78
1.12.	COBERTURA			1.478,98	-	100,00	100,00	-	1.478,98	1.478,98
1.12.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019			1.361,92	-	100,00	100,00	-	1.361,92	1.361,92
1.12.2.	CORREÇÃO DE TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DE CALHA, DN 100			117,06	-	100,00	100,00	-	117,06	117,06
1.13.	RESVESTIMENTO DE PISO			14.299,74	-	100,00	100,00	-	14.299,74	14.299,74
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 02/2023_PE			14.299,74	-	100,00	100,00	-	14.299,74	14.299,74
1.14.	PORTAS/BATENTES			18.805,00	-	42,20	42,20	-	7.936,59	7.936,59
1.14.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019			7.830,27	-	44,50	44,50	-	3.484,47	3.484,47
1.14.2.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA			227,44	-	-	-	-	-	-
1.14.3.	COLOCAÇÃO DE BATENTE/CHARNICÃO E PORTA			3.584,56	-	100,00	100,00	-	3.584,56	3.584,56

Medição 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	INÍCIO DE OBRA 04/12/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/12/2023 a 22/12/2023
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 50,71%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA						-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57
TOTAL:						-	50,71	50,71	-	76.012,57	76.012,57
1.14.5.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE CORRER, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)				5.213,16	-	-	-	-	-	-
1.15.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				454,25	-	6,63	6,63	-	30,12	30,12
1.15.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019				454,25	-	6,63	6,63	-	30,12	30,12

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR
Local

sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233427795


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA DA UBS ALVORADA
EMENDA IMPOSITIVA Nº84
EMPENHO: 018646/2023
CONTRATO 160/2023/GP – LOTE 1

Relatório de Medição nº 1

DATA: 22/12/2023

Empresa: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA –

CNPJ 48.691.405/0001-40

Responsável Técnico: DANIEL SIMIONATO – CREA/PR: 74528/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Remoção de Rodapés, piso cerâmico. Execução de piso cerâmico e de tubulações de hidráulica e elétrica.



Foto 2: Remoção de Portas.



Foto 3: Execução de piso cerâmico.



Foto 4: Pontos de hidráulica e elétrica.



Foto 5: Remoção e troca de forro de PVC. Troca da fiação elétrica.



Foto 6: Remoção e troca de forro de PVC.



Foto 7: Troca de fiação elétrica e pontos de ar condicionado.



Foto 8: Remoção de alvenaria e colocação de novas aberturas. Novos pontos de elétrica.



Foto 9: Paredes em drywall. Abertura de óculo.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 76.012,56.

Pato Branco, 22 de Dezembro de 2023.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D











Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	Início de Obra 00/01/00	
Nº CTEF 0	Empresa Executora 0	CNPJ 0	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Período da Medição 23/12/2023 a 11/03/2024	Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA					TOTAL:	149.911,25	50,71	49,29	100,00	76.012,57	73.898,68	149.911,25
1.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA				149.911,25	50,71	49,29	100,00	76.012,57	73.898,68	149.911,25	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				471,36	100,00	-	100,00	471,36	-	471,36	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				471,36	100,00	-	100,00	471,36	-	471,36	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				9.767,25	66,69	33,31	100,00	6.513,78	3.253,47	9.767,25	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE (INTEGRAL) E VIGIA NOTURNO				9.767,25	66,69	33,31	100,00	6.513,78	3.253,47	9.767,25	
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.032,60	100,00	-	100,00	4.032,60	-	4.032,60	
1.3.1.	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				174,34	100,00	-	100,00	174,34	-	174,34	
1.3.2.	RETIRAR GUARNIÇÃO E BATENTE DE PORTAS				675,08	100,00	-	100,00	675,08	-	675,08	
1.3.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				73,92	100,00	-	100,00	73,92	-	73,92	
1.3.4.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				158,53	100,00	-	100,00	158,53	-	158,53	
1.3.5.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				94,86	100,00	-	100,00	94,86	-	94,86	
1.3.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				2.855,87	100,00	-	100,00	2.855,87	-	2.855,87	
1.4.	TROCA DE FORRO				12.448,23	100,00	-	100,00	12.448,23	-	12.448,23	
1.4.1.	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA METÁLICA				3.490,63	100,00	-	100,00	3.490,63	-	3.490,63	
1.4.2.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)				8.957,60	100,00	-	100,00	8.957,60	-	8.957,60	
1.5.	BANCADAS E EQUIPAMENTOS				13.175,37	-	100,00	100,00	-	13.175,37	13.175,37	
1.5.1.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM				9.669,62	-	100,00	100,00	-	9.669,62	9.669,62	
1.5.2.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2.287,89	-	100,00	100,00	-	2.287,89	2.287,89	
1.5.3.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.217,86	-	100,00	100,00	-	1.217,86	1.217,86	
1.6.	REVESTIMENTO INTERNO E PAREDE				26.861,07	11,95	88,05	100,00	3.211,15	23.649,92	26.861,07	
1.6.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017 PS				2.821,78	100,00	-	100,00	2.821,78	-	2.821,78	
1.6.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				3.812,48	-	100,00	100,00	-	3.812,48	3.812,48	
1.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				19.630,72	-	100,00	100,00	-	19.630,72	19.630,72	
1.6.4.	RESSALTO EM GRANITO/MARMORE PARA CONTENÇÃO HIDRÁULICA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X10 CM/ESPESSURA 8 CM E ARGAMASSA DE				206,72	-	100,00	100,00	-	206,72	206,72	
1.6.5.	HORIZONTAL DE 6X14X10 CM/ESPESSURA 8 CM E ARGAMASSA DE				280,37	100,00	-	100,00	280,37	-	280,37	

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2023 a 11/03/2024
				Nº MEDIÇÃO 2	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA					TOTAL:	149.911,25	50,71	49,29	100,00	76.012,57	73.898,68	149.911,25
1.7.1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.557,84	100,00	-	100,00	1.557,84	-	1.557,84	
1.7.2.	FIXAÇÃO HORIZONTAL PIA/LAVATÓRIO COM ARGAMASSA COLANTE (INCLUSO MÃO DE OBRA)				235,36	100,00	-	100,00	235,36	-	235,36	
1.7.3.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				20,72	100,00	-	100,00	20,72	-	20,72	
1.7.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022				560,14	-	100,00	100,00	-	560,14	560,14	
1.7.5.	TROCA FIOS DE COBRE/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)				6.784,20	100,00	-	100,00	6.784,20	-	6.784,20	
1.7.6.	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA				489,20	100,00	-	100,00	489,20	-	489,20	
1.7.7.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				60,48	100,00	-	100,00	60,48	-	60,48	
1.7.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				21,24	100,00	-	100,00	21,24	-	21,24	
1.7.9.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				15,66	100,00	-	100,00	15,66	-	15,66	
1.7.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				123,00	100,00	-	100,00	123,00	-	123,00	
1.7.11.	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL				69,60	100,00	-	100,00	69,60	-	69,60	
1.7.12.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				205,92	100,00	-	100,00	205,92	-	205,92	
1.7.13.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022				3.439,92	100,00	-	100,00	3.439,92	-	3.439,92	
1.7.14.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022				928,05	100,00	-	100,00	928,05	-	928,05	
1.7.15.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				476,73	100,00	-	100,00	476,73	-	476,73	
1.7.16.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				1.704,45	100,00	-	100,00	1.704,45	-	1.704,45	
1.8.	PONTO DE AR CONDICIONADO				1.133,92	100,00	-	100,00	1.133,92	-	1.133,92	

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2023 a 11/03/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA					50,71	49,29	100,00	76.012,57	73.898,68	149.911,25
TOTAL:					149.911,25					
1.8.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022			799,28	100,00	-	100,00	799,28	-	799,28
1.8.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			231,36	100,00	-	100,00	231,36	-	231,36
1.8.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			32,84	100,00	-	100,00	32,84	-	32,84
1.8.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			24,88	100,00	-	100,00	24,88	-	24,88
1.8.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022			45,56	100,00	-	100,00	45,56	-	45,56
1.9.	REVESTIMENTO BANHEIROS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			1.622,95	100,00	-	100,00	1.622,95	-	1.622,95
1.9.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE			1.622,95	100,00	-	100,00	1.622,95	-	1.622,95
1.10.	PINTURA ÁREA EXTERNA			13.843,29	-	100,00	100,00	-	13.843,29	13.843,29
1.10.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_ 06/2014			13.843,29	-	100,00	100,00	-	13.843,29	13.843,29
1.11.	PINTURA CERCAMENTO			14.824,73	45,20	54,80	100,00	6.700,78	8.123,95	14.824,73
1.11.1.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020			14.824,73	45,20	54,80	100,00	6.700,78	8.123,95	14.824,73
1.12.	COBERTURA			1.478,98	100,00	-	100,00	1.478,98	-	1.478,98
1.12.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019			1.361,92	100,00	-	100,00	1.361,92	-	1.361,92
1.12.2.	CORREÇÃO DE TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DE CALHA, DN 100			117,06	100,00	-	100,00	117,06	-	117,06
1.13.	RESVESTIMENTO DE PISO			14.299,74	100,00	-	100,00	14.299,74	-	14.299,74
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 02/2023_PE			14.299,74	100,00	-	100,00	14.299,74	-	14.299,74
1.14.	PORTAS/BATENTES			18.805,00	42,20	57,80	100,00	7.936,59	10.868,41	18.805,00
1.14.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019			7.830,27	44,50	55,50	100,00	3.484,47	4.345,80	7.830,27
1.14.2.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA			227,44	-	100,00	100,00	-	227,44	227,44
1.14.3.	COLOCAÇÃO DE BATENTE/CHARNICÃO E PORTA			3.584,56	100,00	-	100,00	3.584,56	-	3.584,56

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2023 a 11/03/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA											
TOTAL:					149.911,25	50,71	49,29	100,00	76.012,57	73.898,68	149.911,25
1.14.5.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE CORRER, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)				5.213,16	-	100,00	100,00	-	5.213,16	5.213,16
1.15.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				454,25	6,63	93,37	100,00	30,12	424,13	454,25
1.15.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019				454,25	6,63	93,37	100,00	30,12	424,13	454,25

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

PATO BRANCO - PR
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233427795



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA DA UBS ALVORADA
EMENDA IMPOSITIVA Nº84
EMPENHO: 018646/2023
CONTRATO 160/2023/GP – LOTE 1

Relatório de Medição nº 2

DATA: 11/03/2024

Empresa: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA –

CNPJ 48.691.405/0001-40

Responsável Técnico: DANIEL SIMIONATO – CREA/PR: 74528/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2º medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Pintura externa.



Foto 2: Bancadas.

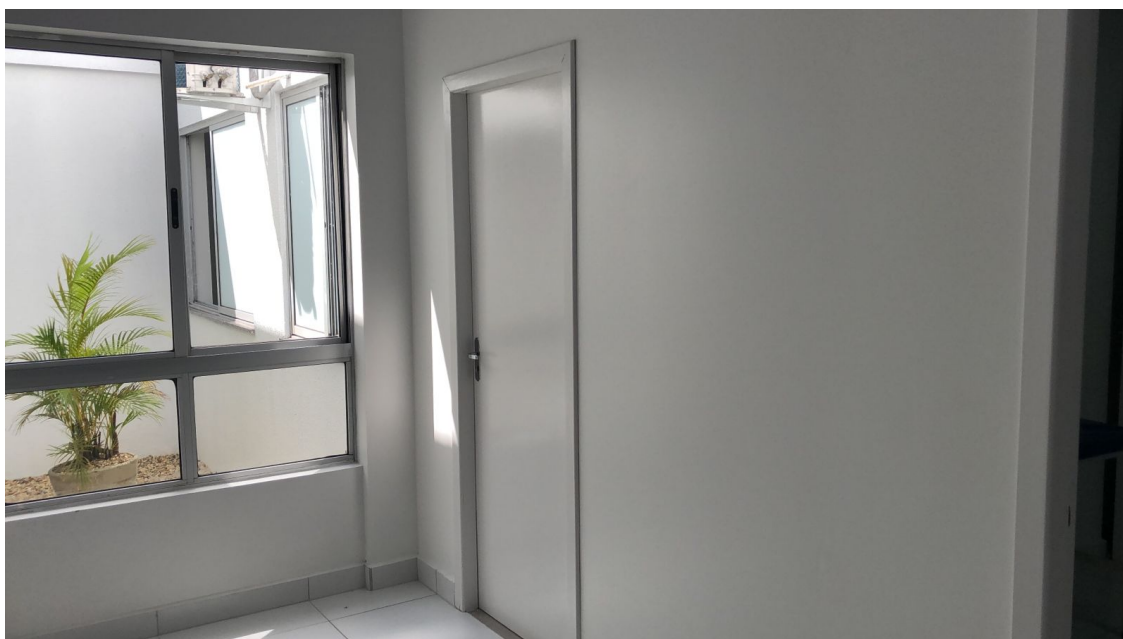


Foto 3: Pintura interna; portas.



Foto 4: Portas.



Foto 5: Luminárias/ Forro de PVC.



Foto 6: Pintura de Cercamento externo.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 73.898,69.

Pato Branco, 11 de Março de 2024.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D















BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	UBS ALVORADA	01/01/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	0		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			01/01/2024 a 11/03/2024		

Realizado Acumulado: 100,00%

[illegible]

Medição 01 Aditivo 01



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS ALVORADA	INÍCIO DE OBRA 01/01/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/01/2024 a 11/03/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALVORADA - ADITIVO 01						-	100,00	100,00	-	68.196,01	68.196,01
TOTAL:						-	100,00	100,00	-	68.196,01	68.196,01
1.6.4.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019				11.237,26	-	100,00	100,00	-	11.237,26	11.237,26
1.6.5.	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER				240,72	-	100,00	100,00	-	240,72	240,72
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.003,44	-	100,00	100,00	-	4.003,44	4.003,44
1.7.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022				3.293,50	-	100,00	100,00	-	3.293,50	3.293,50
1.7.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022				709,94	-	100,00	100,00	-	709,94	709,94
1.8.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				699,32	-	100,00	100,00	-	699,32	699,32
1.8.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019				699,32	-	100,00	100,00	-	699,32	699,32

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233427795

Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA DA UBS ALVORADA
EMENDA IMPOSITIVA Nº84
EMPENHO: 003009/2024
CONTRATO 160/2023/GP – LOTE 1
ADITIVO 01

Relatório de Medição nº 1 - ADITIVO

DATA: 11/03/2024

Empresa: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA –

CNPJ 48.691.405/0001-40

Responsável Técnico: DANIEL SIMIONATO – CREA/PR: 74528/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1º medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Piso e porta.



Foto 2: Piso; Porta; pintura externa.



Foto 3: Fechamento externo.



Foto 4: Fechamento de vidro e veneziana.



Foto 5: Forro. Luminárias.

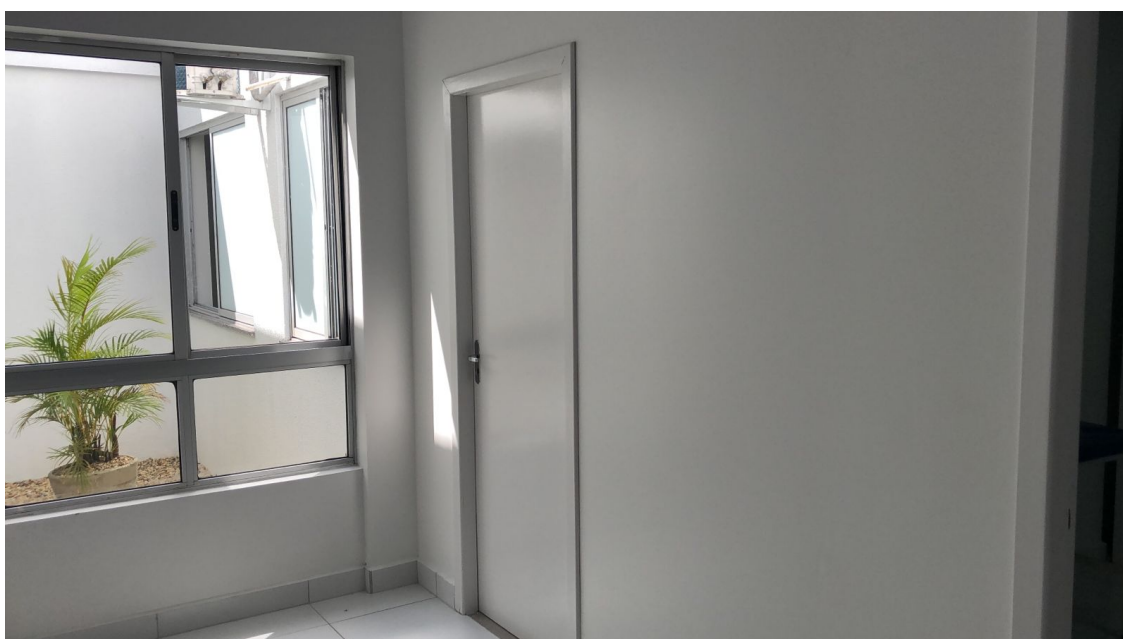


Foto 6: Jardim de inverno; Pintura e portas novas.



Foto 7: Pontos de ar condicionado.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 68.196,01.

Pato Branco, 11 de Março de 2024.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D
