

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
22	2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ Esta intervenção foi concluída	Contrato 80/2023	150	07/06/2023	R\$ 1.087.659,68	100,00%
22	2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	150	07/06/2023	R\$ 1.087.659,68	100,00%

Nº22/2023
Data Inicial: 07/06/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

R\$ 1.087.659,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45821

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9247	2023	27/06/2023	12433
9248	2023	27/06/2023	12433
9249	2023	27/06/2023	12433
9250	2023	27/06/2023	12433
9251	2023	27/06/2023	12433
1362	2024	06/02/2024	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	580522	27/06/2023
12433	1078	580522	27/06/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.2*-80	ART (CREA)	17**2*3**52**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6*-12	RRT (CAU)	13**8*3*	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.7*.4*-08	ART (CREA)	17**2*0**79**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32534	R\$ 1.319.781,25	07/03/2023	
Contrato	80	2023	76.995.448/0001-54	32535	R\$ 1.087.659,68	18/05/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	76.995.448/0001-54	32803	R\$ 295.286,49	01/12/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

32580	Medição	1	Jurisdicionado	28/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	0,10%
32643	Medição	2	Jurisdicionado	14/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	50,19%
32678	Medição	3	Jurisdicionado	28/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	50,19%
32706	Medição	4	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	50,19%
32733	Medição	5	Jurisdicionado	29/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	50,19%
32783	Medição	6	Jurisdicionado	19/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	94,35%
32802	Medição	7	Jurisdicionado	29/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2023	100,00%
32804	Medição	8	Jurisdicionado	29/01/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
32845	Conclusão	9	Jurisdicionado	05/02/2024			

Nº22/2023
Data Inicial: 07/06/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

Documentos

R\$ 1.087.659,68

Planilha Aditivo 01



CABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada Por Preço Global nº 80/2023/GP, que entre si celebram o *Município de Pato Branco* e *MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA*, na forma que segue:

Pelo presente Termo, o *Município de Pato Branco*, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e *MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA*, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.700.335/0001-52, Inscrição Estadual nº 90861294-90, com sede Rua Frei Vitor Berscheid, nº 828, Bairro Centro, no município de Saudades do Iguaçu/PR, CEP: 85568-000 Telefone (46) 3246-1192, E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com, neste ato representada pelo Sr. **Marcio Gallina**, inscrito no CPF nº 027.917.999-58, portador do RG nº 5.980.314-0, residente e domiciliado na Av. Iguaçu, nº 1844, Bairro Centro, no município de Saudades do Iguaçu/PR, CEP: 85.568-000, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tendo certo e ajustado o Aditamento ao Contrato de Empreitada Por Preço Global nº 80/2023, oriundo Edital de *Tomada de Preços nº 03/2023, Processo nº 47/2023*, que tem por objeto a execução da Reforma e Ampliação do CMEI Criança Feliz, localizado na Rua Frederico Sguarezi, 426, Bairro Industrial, neste Município, com área total de 650,18m², sedo 494,43m² a área de reforma, e 155,75m² a área de ampliação, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, de acordo com a justificativa feita pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Educação e Cultura no Processo Administrativo nº 20.180/2023, conforme segue:

Cláusula Primeira – Do Prazo de Vigência

Com base na Lei 8.666/93 no seu artigo 57, §1º inciso I e II, bem como a Cláusula Sexta, Inciso V do contrato original, as partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual até o dia 25/03/2024.

Cláusula Segunda – Do Prazo de Execução

Com base na Lei 8.666/93 no seu artigo 57, §1º inciso I e II, as partes pactuam prorrogação do prazo de execução até o dia 28/02/2024.

Cláusula Terceira – Do Valor

Com base na Lei 8.666/93 no seu artigo 65, inciso I, alínea “a”, fica acrescido o valor de R\$ 295.286,49 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 1.087.659,68 (um milhão oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 1.382.946,17 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária

Para manutenção das despesas será utilizado a seguinte dotação orçamentária:

07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – Fonte 5104 – Ação 1.078 – Despesa 18013 – Desdobramento 18032.

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A8-4397-2C68-F475> e informe o código F3A8-4397-2C68-F475



***Cláusula Quinta- Da Vigência***

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 01 de Dezembro de 2023.

Município de Pato Branco - Contratante

Robson Cantu - Prefeito

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO GALLINA**
Data: 01/12/2023 16:13:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Contratada

Marcio Gallina – Representante Legal

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pato Branco.1doc.com.br/verificacao/F3A8-4397-2C68-F475> e informe o código F3A8-4397-2C68-F475



PREFEITURA DE
PATO BRANCO

CABINETE DO PREFEITO

Anexo I – Acréscimo

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gravado de Selo
#PUBJICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	0
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	09-22 (Nº DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)	PATO BRANCO
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)						295.286,49
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS (REFORMA/AMPLIAÇÃO) - PISO						295.286,49
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	494,89	24,92	BDI 1	29,99	14.841,75
1.1.2.	SINAPI	97096	CONCRETELAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	66,14	505,70	BDI 1	606,56	40.250,16
1.1.3.	SINAPI	90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF 07/2021	M2	581,62	87,93	BDI 1	105,81	61.541,21
1.2.			ELETRICA						28.964,82
1.2.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	700,00	3,04	BDI 1	3,66	2.562,00
1.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	4,32	BDI 1	5,20	4.160,00
1.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	6,80	BDI 1	7,94	3.970,00
1.2.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00	9,14	BDI 1	11,00	4.400,00
1.2.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00	16,18	BDI 1	19,47	5.841,00
1.2.6.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	729,07	BDI 1	877,36	877,36
1.2.7.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	32,00	38,22	BDI 1	45,99	1.471,68
1.2.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	29,84	BDI 1	35,91	359,10
1.2.9.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	14,81	BDI 1	17,82	2.673,00
1.2.10.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	72,77	BDI 1	87,57	1.050,84
1.2.11.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	80,32	BDI 1	96,66	1.159,92

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A8-4397-2C68-F475> e informe o código F3A8-4397-2C68-F475





PREFEITURA DE
PATO BRANCO

CABINETE DO PREFEITO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APeLO DO EMPReENDIMENTO
0	0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	09-22 (N.DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)	PATO BRANCO
			BDI 1 20,34% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)										
1.2.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	14,57	BDI 1	17,53	210,36	RA
1.2.13.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	15,90	BDI 1	19,13	229,56	RA
1.3.			AR CONDICIONADO						12.594,18	
1.3.1.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	9,14	BDI 1	11,00	11.000,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	76,04	BDI 1	91,51	1.281,14	RA
1.3.3.	SINAPI	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	14,00	18,58	BDI 1	22,36	313,04	RA
1.4.			CALÇADA						10.700,27	
1.4.1.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	128,47	69,21	BDI 1	83,29	10.700,27	RA
1.5.			MURO DE ARRIMO						54.438,32	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	88,54	93,79	BDI 1	112,87	9.993,51	RA
1.5.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	M3	7,45	171,48	BDI 1	206,36	1.537,38	RA
1.5.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1,68	61,93	BDI 1	74,53	125,21	RA
1.5.4.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	37,50	109,47	BDI 1	131,74	4.940,25	RA
1.5.5.	SINAPI	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, AF_07/2021	M	72,48	117,11	BDI 1	140,93	10.214,61	RA
1.5.6.	SINAPI	92789	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	350,38	14,06	BDI 1	16,92	5.928,43	RA
1.5.7.	SINAPI	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	520,75	12,23	BDI 1	14,72	7.665,44	RA
1.5.8.	SINAPI	92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	44,01	13,71	BDI 1	16,50	726,17	RA
1.5.9.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,60	238,14	BDI 1	286,58	12.208,31	RA

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A8-4397-2C68-F475> e informe o código F3A8-4397-2C68-F475





PREFEITURA DE
PATO BRANCO

CABINETE DO PREFEITO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	09-22 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)	PATO BRANCO
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)									
1.5.10.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	11,25	81,18	BDI 1	97,69	1.099,01
1.6.			RAMPA DE ACESSO PLAYGROUND					-	35.966,38
1.6.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019_P	M	31,88	657,92	BDI 1	791,74	25.240,67
1.6.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_P	M	63,76	117,67	BDI 1	141,84	9.043,72
1.6.3.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	13,78	101,43	BDI 1	122,06	1.681,99
1.7.			BASE PARA PLAYGROUND					-	35.989,40
1.7.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF -12/2017	M3	14,52	138,88	BDI 1	167,25	2.428,47
1.7.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	12,10	93,79	BDI 1	112,87	1.365,73
1.7.3.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	121,00	170,53	BDI 1	206,22	24.831,62
1.7.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	12,10	505,70	BDI 1	608,56	7.363,58
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO
Local
sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BELLEI
CRECAU: 164.074/D-PR





PREFEITURA DE
PATO BRANCO

CABINETE DO PREFEITO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR		
0	0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	09-22 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)	PATO BRANCO	20.34%	0.00%
					BDI 3
					0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)									
ART/RRT: 1720235939211									295.286,49

Data

ART/RRT: 1720235939211

RECURSO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3A8-4397-2C68-F475

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 01/12/2023 13:51:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A8-4397-2C68-F475>




















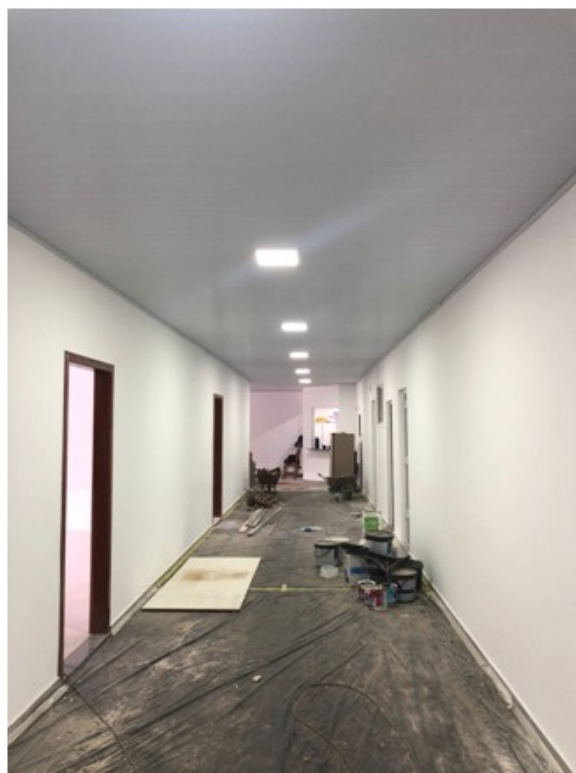













BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução	Período da Medição	Nº Medição
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	11/08/2023 a 15/12/2023	2

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,3
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	-	-	-	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,3	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS (REFORMA)	-	-	-	157.037,45	-	-	-	10.351,93	137.094,41	147.446,3	
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	494,89	27,89	13.802,48	371,17	123,72	494,89	10.351,93	3.450,55	13.802,4	
1.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	118,40	55,72	6.597,25	-	118,40	118,40	-	6.597,25	6.597,2	
1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	331,50	71,94	23.848,11	-	331,10	331,10	-	23.819,33	23.819,3	
1.1.4.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	343,10	30,28	10.389,07	-	343,10	343,10	-	10.389,07	10.389,0	
1.1.5.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	343,10	222,95	76.494,15	-	343,10	343,10	-	76.494,15	76.494,1	
1.1.6.	RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM	M	190,07	27,65	5.255,44	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	10,56	20,92	220,92	-	-	-	-	-	-	
1.1.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.113,96	18,34	20.430,03	-	891,17	891,17	-	16.344,06	16.344,0	
1.2.	ALVENARIA (REFORMA)	-	-	-	13.691,46	-	-	-	6.949,92	6.741,54	13.691,4	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	39,37	69,48	2.735,43	39,37	-	39,37	2.735,43	-	2.735,4	
1.2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	47,00	65,99	3.101,53	47,00	-	47,00	3.101,53	-	3.101,5	
1.2.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	101,27	10,99	1.112,96	101,27	-	101,27	1.112,96	-	1.112,9	
1.2.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	101,27	66,57	6.741,54	-	101,27	101,27	-	6.741,54	6.741,5	
1.3.	TELHADO - ESTRUTURA METÁLICA (REFORMA)	-	-	-	362.623,66	-	-	-	264.458,03	63.731,13	328.189,1	
1.3.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	610,00	63,82	38.930,20	610,00	-	610,00	38.930,20	-	38.930,2	
1.3.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	610,00	4,25	2.592,50	610,00	-	610,00	2.592,50	-	2.592,5	
1.3.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	610,00	9,13	5.569,30	610,00	-	610,00	5.569,30	-	5.569,3	
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	610,00	265,41	161.900,10	610,00	-	610,00	161.900,10	-	161.900,1	
1.3.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	64,00	79,17	5.066,88	-	64,00	64,00	-	5.066,88	5.066,8	



BM - Boletim de Medicação

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			11/08/2023 a 15/12/2023		

Realizado Acumulado: 94.35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,3
1.3.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	610,00	14,08	8.588,80	610,00	-	610,00	8.588,80	-	8.588,80
1.3.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,30	108,44	1.333,81	12,30	-	12,30	1.333,81	-	1.333,81
1.3.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	610,00	56,45	34.434,50	-	-	-	-	-	-
1.3.10.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	1.304,71	1,70	2.218,01	1.304,71	-	1.304,71	2.218,01	-	2.218,01
1.3.11.	CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (REFORMA)	UNIDADE	1,00	6.488,97	6.488,97	1,00	-	1,00	6.488,97	-	6.488,97
1.3.12.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	522,71	2,15	1.123,83	400,16	122,55	522,71	860,34	263,49	1.123,83
1.3.13.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	522,71	103,82	54.267,75	-	522,71	522,71	-	54.267,75	54.267,75
1.3.14.	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	408,40	4,74	1.935,82	-	408,40	408,40	-	1.935,82	1.935,82
1.3.15.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	408,40	5,38	2.197,19	-	408,40	408,40	-	2.197,19	2.197,19
1.4.	ITENS A SUBSTITUIR (REFORMA)	-	-	-	27.234,39	-	-	-	586,69	26.473,92	27.060,69
1.4.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25,00	15,10	377,50	25,00	-	25,00	377,50	-	377,50
1.4.2.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00	11,01	209,19	19,00	-	19,00	209,19	-	209,19
1.4.3.	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR	UNIDADE	2,00	119,50	239,00	-	2,00	2,00	-	239,00	239,00
1.4.4.	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	86,89	173,78	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,00	104,54	104,54	-	1,00	1,00	-	104,54	104,54
1.4.6.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	16,00	60,18	962,88	-	16,00	16,00	-	962,88	962,88
1.4.7.	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	16,00	28,04	448,64	-	16,00	16,00	-	448,64	448,64
1.4.8.	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54 X 44" CM (L X C)	UN	1,00	201,63	201,63	-	1,00	1,00	-	201,63	201,63
1.4.9.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	15,00	186,94	2.804,10	-	15,00	15,00	-	2.804,10	2.804,10
1.4.10.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	317,34	4.760,10	-	15,00	15,00	-	4.760,10	4.760,10

Medição 02



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		2
				PERÍODO DA MEDIÇÃO	
				11/08/2023 a 15/12/2023	

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,38
1.4.12.	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	32,20	83,29	2.681,94	-	32,20	32,20	-	2.681,94	2.681,94
1.4.13.	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	7,00	422,32	2.956,24	-	7,00	7,00	-	2.956,24	2.956,24
1.4.14.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	7,00	47,79	334,53	-	7,00	7,00	-	334,53	334,53
1.5.	PORTAS E PORTÕES/JANELAS (REFORMA)	-	-	-	83.077,64	-	-	-	2.165,35	80.912,29	83.077,64
1.5.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	59,62	11,41	680,26	59,62	-	59,62	680,26	-	680,26
1.5.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	8,32	1.157,53	9.630,65	-	8,32	8,32	-	9.630,65	9.630,65
1.5.3.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	6,00	233,35	1.400,10	-	6,00	6,00	-	1.400,10	1.400,10
1.5.4.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	10,00	330,83	3.308,30	-	10,00	10,00	-	3.308,30	3.308,30
1.5.5.	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	18,16	1.064,95	19.339,49	-	18,16	18,16	-	19.339,49	19.339,49
1.5.6.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	72,33	41,07	2.970,59	36,16	36,17	72,33	1.485,09	1.485,50	2.970,59
1.5.7.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	65,74	596,77	39.231,66	-	65,74	65,74	-	39.231,66	39.231,66
1.5.8.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	6,59	988,86	6.516,59	-	6,59	6,59	-	6.516,59	6.516,59
1.6.	SERVIÇOS INICIAIS (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	4.971,40	-	-	-	4.971,40	-	4.971,40
1.6.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 05/2018	M2	350,70	3,89	1.364,22	350,70	-	350,70	1.364,22	-	1.364,22
1.6.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	2,84	69,48	197,32	2,84	-	2,84	197,32	-	197,32
1.6.3.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	9,93	343,39	3.409,86	9,93	-	9,93	3.409,86	-	3.409,86
1.7.	ALVENARIA (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	50.773,87	-	-	-	36.463,99	14.309,88	50.773,87
1.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	264,12	65,99	17.429,28	264,12	-	264,12	17.429,28	-	17.429,28
1.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	M2	429,92	10,99	4.724,82	429,92	-	429,92	4.724,82	-	4.724,82

Medição 02



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0		0				0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ		00/01/00	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52		(SELECIONAR)		11/08/2023 a 15/12/2023		2	

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,38
1.7.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	429,92	66,57	28.619,77	214,96	214,96	429,92	14.309,89	14.309,88	28.619,77
1.8.	REVESTIMENTO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	40.650,56	-	-	-	-	35.856,54	35.856,54
1.8.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	10,50	55,72	585,06	-	10,50	10,50	-	585,06	585,06
1.8.2.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	110,00	222,95	24.524,50	-	110,00	110,00	-	24.524,50	24.524,50
1.8.3.	RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO, H = 5 CM	M	169,97	27,65	4.699,67	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	4,51	20,92	94,35	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	53,40	71,94	3.841,60	-	53,40	53,40	-	3.841,60	3.841,60
1.8.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	376,52	18,34	6.905,38	-	376,52	376,52	-	6.905,38	6.905,38
1.9.	ITENS A INSTALAR (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	10.040,11	-	-	-	-	9.833,72	9.833,72
1.9.1.	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR	UNIDADE	1,00	119,50	119,50	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	86,89	86,89	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	4,00	60,18	240,72	-	4,00	4,00	-	240,72	240,72
1.9.4.	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	28,04	112,16	-	4,00	4,00	-	112,16	112,16
1.9.5.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	186,94	747,76	-	4,00	4,00	-	747,76	747,76
1.9.6.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	317,34	1.269,36	-	4,00	4,00	-	1.269,36	1.269,36
1.9.7.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	7,60	844,64	6.419,26	-	7,60	7,60	-	6.419,26	6.419,26
1.9.8.	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	12,54	83,29	1.044,46	-	12,54	12,54	-	1.044,46	1.044,46
1.10.	JANELAS/PORTAS (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	7.426,89	-	-	-	-	7.426,89	7.426,89
1.10.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	10,00	596,77	5.967,70	-	10,00	10,00	-	5.967,70	5.967,70
1.10.2.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2,00	233,35	466,70	-	2,00	2,00	-	466,70	466,70

Medição 02



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		11/08/2023 a 15/12/2023	2

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,38
1.10.3.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	3,00	330,83	992,49	-	3,00	3,00	-	992,49	992,49
1.11.	ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	114.839,03	-	-	-	82.461,29	29.555,24	112.016,53
1.11.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	65,95	13.190,00	200,00	-	200,00	13.190,00	-	13.190,00
1.11.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,00	271,23	54.246,00	200,00	-	200,00	54.246,00	-	54.246,00
1.11.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,80	79,17	2.755,12	-	34,80	34,80	-	2.755,12	2.755,12
1.11.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	40,22	8.044,00	200,00	-	200,00	8.044,00	-	8.044,00
1.11.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	108,44	1.084,40	10,00	-	10,00	1.084,40	-	1.084,40
1.11.6.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	200,00	56,45	11.290,00	-	150,00	150,00	-	8.467,50	8.467,50
1.11.7.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	427,80	1,70	727,26	427,80	-	427,80	727,26	-	727,26
1.11.8.	CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)	UNIDADE	1,00	5.169,63	5.169,63	1,00	-	1,00	5.169,63	-	5.169,63
1.11.9.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	166,18	103,82	17.252,81	-	166,18	166,18	-	17.252,81	17.252,81
1.11.10.	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	106,70	4,74	505,76	-	106,70	106,70	-	505,76	505,76
1.11.11.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	106,70	5,38	574,05	-	106,70	106,70	-	574,05	574,05
1.12.	HIDROSSANITÁRIO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	6.245,93	-	-	-	5.379,32	866,61	6.245,93
1.12.1.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36,70	16,46	604,08	36,70	-	36,70	604,08	-	604,08
1.12.2.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00	11,30	565,00	50,00	-	50,00	565,00	-	565,00
1.12.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	180,73	1.084,38	6,00	-	6,00	1.084,38	-	1.084,38
1.12.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	191,94	383,88	2,00	-	2,00	383,88	-	383,88
1.12.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	12,43	124,30	10,00	-	10,00	124,30	-	124,30



BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			11/08/2023 a 15/12/2023		

Realizado Acumulado: 94,35%

[illegible]

Medição 02



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			11/08/2023 a 15/12/2023		

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,38
1.13.9.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	82,80	307,67	25.475,08	82,80	-	82,80	25.475,08	-	25.475,08
1.13.10.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	161,30	233,26	37.624,84	161,30	-	161,30	37.624,84	-	37.624,84
1.13.11.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	25,30	444,93	11.256,73	25,30	-	25,30	11.256,73	-	11.256,73
1.14.	REPAROS ESTRUTURAIS	-	-	-	14.788,43	-	-	-	14.788,43	-	14.788,43
1.14.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	170,10	15,34	2.609,33	170,10	-	170,10	2.609,33	-	2.609,33
1.14.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	297,00	13,68	4.062,96	297,00	-	297,00	4.062,96	-	4.062,96
1.14.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,00	16,39	196,68	12,00	-	12,00	196,68	-	196,68
1.14.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,60	11,49	546,92	47,60	-	47,60	546,92	-	546,92
1.14.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	65,20	17,43	1.136,44	65,20	-	65,20	1.136,44	-	1.136,44
1.14.6.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	10,00	623,61	6.236,10	10,00	-	10,00	6.236,10	-	6.236,10
1.15.	ELETRICO	-	-	-	87.994,00	-	-	-	11.015,00	67.551,00	78.566,00
1.15.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	16,31	195,72	-	12,00	12,00	-	195,72	195,72
1.15.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	17,80	213,60	-	12,00	12,00	-	213,60	213,60
1.15.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	81,45	977,40	-	12,00	12,00	-	977,40	977,40
1.15.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	89,89	1.078,68	-	12,00	12,00	-	1.078,68	1.078,68
1.15.5.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	30,00	18,92	567,60	-	30,00	30,00	-	567,60	567,60
1.15.6.	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	6,00	106,77	640,62	-	6,00	6,00	-	640,62	640,62
1.15.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00	21,52	9.684,00	225,00	-	225,00	4.842,00	-	4.842,00
1.15.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00	12,01	4.804,00	200,00	-	200,00	2.402,00	-	2.402,00
1.15.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	300,00	14,56	4.368,00	150,00	-	150,00	2.184,00	-	2.184,00

Medição 02



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		11/08/2023 a 15/12/2023
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,38
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.15.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	15,87	1.587,00	100,00	-	100,00	1.587,00	-	1.587,00
1.15.11.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.298,93	1.298,93	-	1,00	1,00	-	1.298,93	1.298,93
1.15.12.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *100* MM	UN	10,00	100,82	1.008,20	-	10,00	10,00	-	1.008,20	1.008,20
1.15.13.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 300 X 300 X *100* MM	UN	10,00	181,00	1.810,00	-	10,00	10,00	-	1.810,00	1.810,00
1.15.14.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	800,00	1,53	1.224,00	-	800,00	800,00	-	1.224,00	1.224,00
1.15.15.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.500,00	2,43	3.645,00	-	1.500,00	1.500,00	-	3.645,00	3.645,00
1.15.16.	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	800,00	19,69	15.752,00	-	800,00	800,00	-	15.752,00	15.752,00
1.15.17.	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	300,00	30,07	9.021,00	-	300,00	300,00	-	9.021,00	9.021,00
1.15.18.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	150,00	11,07	1.660,50	-	150,00	150,00	-	1.660,50	1.660,50
1.15.19.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	150,00	15,81	2.371,50	-	150,00	150,00	-	2.371,50	2.371,50
1.15.20.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	200,00	0,94	188,00	-	200,00	200,00	-	188,00	188,00
1.15.21.	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	30,00	351,61	10.548,30	-	30,00	30,00	-	10.548,30	10.548,30
1.15.22.	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	55,00	279,09	15.349,95	-	55,00	55,00	-	15.349,95	15.349,95

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local

Responsável Técnico pela Fiscalização

Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	11/08/2023 a 15/12/2023	2

Realizado Acumulado: 94,35%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	545.856,21	480.353,17	1.026.209,38
Data						CREA/CAU: 164.074/D			ART/RRT: 0		



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

CONTRATO Nº 80/2023/GP

Relatório de Medição nº 2

DATA: 15/12/2023

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO
– CAU/BR Nº 000A910392

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Janelas. Piso Vinílico. Pintura Interna.

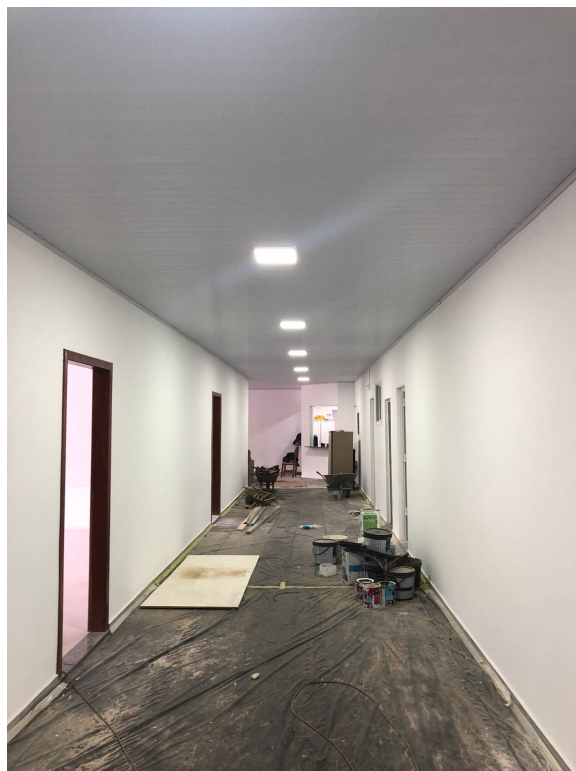


Foto 2: Pintura Interna. Forro em PVC. Iluminação interna.



Foto 3: Portas em alumínio tipo veneziana.



Foto 4: Vaso sanitário com assento. Bancada em granito. Revestimento cerâmico. Janela Basculante.



Foto 5: Porta de Correr, alumínio e vidro.



Foto 6: Janelas de alumínio e vidro; portas em madeira. Piso cerâmico. Pintura externa.



Foto 7: Calhas, Pintura externa, Janelas, Portas.



Foto 8: Bancadas em Granito. Cuba de inox. Torneiras e sifão.



Foto 9: Instalações Elétricas. Disjuntores.


Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 480.353,17.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

Pato Branco, 15 de Dezembro de 2023.

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 174.064/D



BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	16/12/2023 a 29/01/2023	3

Realizado Acumulado: 100,00%

[illegible]



BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução	Período da Medição	Nº Medição
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	16/12/2023 a 29/01/2023	3

Realizado Acumulado: 100,00%

[illegible]

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ		00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		16/12/2023 a 29/01/2023	3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.4.12.	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	32,20	83,29	2.681,94	32,20	-	32,20	2.681,94	-	2.681,94
1.4.13.	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	7,00	422,32	2.956,24	7,00	-	7,00	2.956,24	-	2.956,24
1.4.14.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	7,00	47,79	334,53	7,00	-	7,00	334,53	-	334,53
1.5.	PORTAS E PORTÕES/JANELAS (REFORMA)	-	-	-	83.077,64	-	-	-	83.077,64	-	83.077,64
1.5.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	59,62	11,41	680,26	59,62	-	59,62	680,26	-	680,26
1.5.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	8,32	1.157,53	9.630,65	8,32	-	8,32	9.630,65	-	9.630,65
1.5.3.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	6,00	233,35	1.400,10	6,00	-	6,00	1.400,10	-	1.400,10
1.5.4.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	10,00	330,83	3.308,30	10,00	-	10,00	3.308,30	-	3.308,30
1.5.5.	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	18,16	1.064,95	19.339,49	18,16	-	18,16	19.339,49	-	19.339,49
1.5.6.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	72,33	41,07	2.970,59	72,33	-	72,33	2.970,59	-	2.970,59
1.5.7.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	65,74	596,77	39.231,66	65,74	-	65,74	39.231,66	-	39.231,66
1.5.8.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	6,59	988,86	6.516,59	6,59	-	6,59	6.516,59	-	6.516,59
1.6.	SERVIÇOS INICIAIS (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	4.971,40	-	-	-	4.971,40	-	4.971,40
1.6.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 05/2018	M2	350,70	3,89	1.364,22	350,70	-	350,70	1.364,22	-	1.364,22
1.6.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	2,84	69,48	197,32	2,84	-	2,84	197,32	-	197,32
1.6.3.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	9,93	343,39	3.409,86	9,93	-	9,93	3.409,86	-	3.409,86
1.7.	ALVENARIA (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	50.773,87	-	-	-	50.773,87	-	50.773,87
1.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	264,12	65,99	17.429,28	264,12	-	264,12	17.429,28	-	17.429,28
1.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	M2	429,92	10,99	4.724,82	429,92	-	429,92	4.724,82	-	4.724,82

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CNPJ 16.700.335/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/12/2023 a 29/01/2023
				Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.7.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	429,92	66,57	28.619,77	429,92	-	429,92	28.619,77	-	28.619,77
1.8.	REVESTIMENTO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	40.650,56	-	-	-	35.856,54	4.794,02	40.650,56
1.8.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	10,50	55,72	585,06	10,50	-	10,50	585,06	-	585,06
1.8.2.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	110,00	222,95	24.524,50	110,00	-	110,00	24.524,50	-	24.524,50
1.8.3.	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	169,97	27,65	4.699,67	-	169,97	169,97	-	4.699,67	4.699,67
1.8.4.	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	4,51	20,92	94,35	-	4,51	4,51	-	94,35	94,35
1.8.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	53,40	71,94	3.841,60	53,40	-	53,40	3.841,60	-	3.841,60
1.8.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	376,52	18,34	6.905,38	376,52	-	376,52	6.905,38	-	6.905,38
1.9.	ITENS A INSTALAR (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	10.040,11	-	-	-	9.833,72	206,39	10.040,11
1.9.1.	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR	UNIDADE	1,00	119,50	119,50	-	1,00	1,00	-	119,50	119,50
1.9.2.	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	86,89	86,89	-	1,00	1,00	-	86,89	86,89
1.9.3.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	4,00	60,18	240,72	4,00	-	4,00	240,72	-	240,72
1.9.4.	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	28,04	112,16	4,00	-	4,00	112,16	-	112,16
1.9.5.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	186,94	747,76	4,00	-	4,00	747,76	-	747,76
1.9.6.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	317,34	1.269,36	4,00	-	4,00	1.269,36	-	1.269,36
1.9.7.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	7,60	844,64	6.419,26	7,60	-	7,60	6.419,26	-	6.419,26
1.9.8.	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	12,54	83,29	1.044,46	12,54	-	12,54	1.044,46	-	1.044,46
1.10.	JANELAS/PORTAS (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	7.426,89	-	-	-	7.426,89	-	7.426,89
1.10.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	10,00	596,77	5.967,70	10,00	-	10,00	5.967,70	-	5.967,70
1.10.2.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2,00	233,35	466,70	2,00	-	2,00	466,70	-	466,70

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução		Nº Medição
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		3
		Período da Medição		16/12/2023 a 29/01/2023	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
TOTAL:						-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.10.3.	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	3,00	330,83	992,49	3,00	-	3,00	992,49	-	992,49
1.11.	ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	114.839,03	-	-	-	112.016,53	2.822,50	114.839,03
1.11.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	65,95	13.190,00	200,00	-	200,00	13.190,00	-	13.190,00
1.11.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,00	271,23	54.246,00	200,00	-	200,00	54.246,00	-	54.246,00
1.11.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,80	79,17	2.755,12	34,80	-	34,80	2.755,12	-	2.755,12
1.11.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	40,22	8.044,00	200,00	-	200,00	8.044,00	-	8.044,00
1.11.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	108,44	1.084,40	10,00	-	10,00	1.084,40	-	1.084,40
1.11.6.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	200,00	56,45	11.290,00	150,00	50,00	200,00	8.467,50	2.822,50	11.290,00
1.11.7.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	427,80	1,70	727,26	427,80	-	427,80	727,26	-	727,26
1.11.8.	CALHA QUADRADA EM AÇO GALVANZADO, 100MM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)	UNIDADE	1,00	5.169,63	5.169,63	1,00	-	1,00	5.169,63	-	5.169,63
1.11.9.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	166,18	103,82	17.252,81	166,18	-	166,18	17.252,81	-	17.252,81
1.11.10.	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	106,70	4,74	505,76	106,70	-	106,70	505,76	-	505,76
1.11.11.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	106,70	5,38	574,05	106,70	-	106,70	574,05	-	574,05
1.12.	HIDROSSANITÁRIO (AMPLIAÇÃO)	-	-	-	6.245,93	-	-	-	6.245,93	-	6.245,93
1.12.1.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	36,70	16,46	604,08	36,70	-	36,70	604,08	-	604,08
1.12.2.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00	11,30	565,00	50,00	-	50,00	565,00	-	565,00
1.12.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	180,73	1.084,38	6,00	-	6,00	1.084,38	-	1.084,38
1.12.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	191,94	383,88	2,00	-	2,00	383,88	-	383,88
1.12.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	12,43	124,30	10,00	-	10,00	124,30	-	124,30



BM - Boletim de Medicação

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	16/12/2023 a 29/01/2023	3

Realizado Acumulado: 100,00%

[illegible]

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		3
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			16/12/2023 a 29/01/2023		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	1.087.659,68	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.13.9.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	82,80	307,67	25.475,08	82,80	-	82,80	25.475,08	-	25.475,08
1.13.10.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	161,30	233,26	37.624,84	161,30	-	161,30	37.624,84	-	37.624,84
1.13.11.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	25,30	444,93	11.256,73	25,30	-	25,30	11.256,73	-	11.256,73
1.14.	REPAROS ESTRUTURAIS	-	-	-	14.788,43	-	-	-	14.788,43	-	14.788,43
1.14.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	170,10	15,34	2.609,33	170,10	-	170,10	2.609,33	-	2.609,33
1.14.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	297,00	13,68	4.062,96	297,00	-	297,00	4.062,96	-	4.062,96
1.14.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,00	16,39	196,68	12,00	-	12,00	196,68	-	196,68
1.14.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,60	11,49	546,92	47,60	-	47,60	546,92	-	546,92
1.14.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	65,20	17,43	1.136,44	65,20	-	65,20	1.136,44	-	1.136,44
1.14.6.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	10,00	623,61	6.236,10	10,00	-	10,00	6.236,10	-	6.236,10
1.15.	ELETRICO	-	-	-	87.994,00	-	-	-	78.566,00	9.428,00	87.994,00
1.15.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	16,31	195,72	12,00	-	12,00	195,72	-	195,72
1.15.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	17,80	213,60	12,00	-	12,00	213,60	-	213,60
1.15.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	81,45	977,40	12,00	-	12,00	977,40	-	977,40
1.15.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	89,89	1.078,68	12,00	-	12,00	1.078,68	-	1.078,68
1.15.5.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	30,00	18,92	567,60	30,00	-	30,00	567,60	-	567,60
1.15.6.	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	6,00	106,77	640,62	6,00	-	6,00	640,62	-	640,62
1.15.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00	21,52	9.684,00	225,00	225,00	450,00	4.842,00	4.842,00	9.684,00
1.15.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00	12,01	4.804,00	200,00	200,00	400,00	2.402,00	2.402,00	4.804,00
1.15.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	300,00	14,56	4.368,00	150,00	150,00	300,00	2.184,00	2.184,00	4.368,00

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0		0			0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução		Período da Medição	Nº Medição
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		16/12/2023 a 29/01/2023	3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
TOTAL:						-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68
1.15.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	15,87	1.587,00	100,00	-	100,00	1.587,00	-	1.587,00
1.15.11.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.298,93	1.298,93	1,00	-	1,00	1.298,93	-	1.298,93
1.15.12.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *100* MM	UN	10,00	100,82	1.008,20	10,00	-	10,00	1.008,20	-	1.008,20
1.15.13.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 300 X 300 X *100* MM	UN	10,00	181,00	1.810,00	10,00	-	10,00	1.810,00	-	1.810,00
1.15.14.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	800,00	1,53	1.224,00	800,00	-	800,00	1.224,00	-	1.224,00
1.15.15.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.500,00	2,43	3.645,00	1.500,00	-	1.500,00	3.645,00	-	3.645,00
1.15.16.	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	800,00	19,69	15.752,00	800,00	-	800,00	15.752,00	-	15.752,00
1.15.17.	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	300,00	30,07	9.021,00	300,00	-	300,00	9.021,00	-	9.021,00
1.15.18.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	150,00	11,07	1.660,50	150,00	-	150,00	1.660,50	-	1.660,50
1.15.19.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	150,00	15,81	2.371,50	150,00	-	150,00	2.371,50	-	2.371,50
1.15.20.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	200,00	0,94	188,00	200,00	-	200,00	188,00	-	188,00
1.15.21.	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	30,00	351,61	10.548,30	30,00	-	30,00	10.548,30	-	10.548,30
1.15.22.	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55,00	279,09	15.349,95	55,00	-	55,00	15.349,95	-	15.349,95

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

PATO BRANCO
Local

Responsável Técnico pela Fiscalização

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO


PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		16/12/2023 a 29/01/2023
					Nº MEDIÇÃO
					3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	1.026.209,38	61.450,30	1.087.659,68

Data

CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 0


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

CONTRATO Nº 80/2023/GP

Relatório de Medição nº 3

DATA: 29/01/2023

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO
– CAU/BR Nº 000A910392

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 3ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Piso. Vidros e pintura interna.

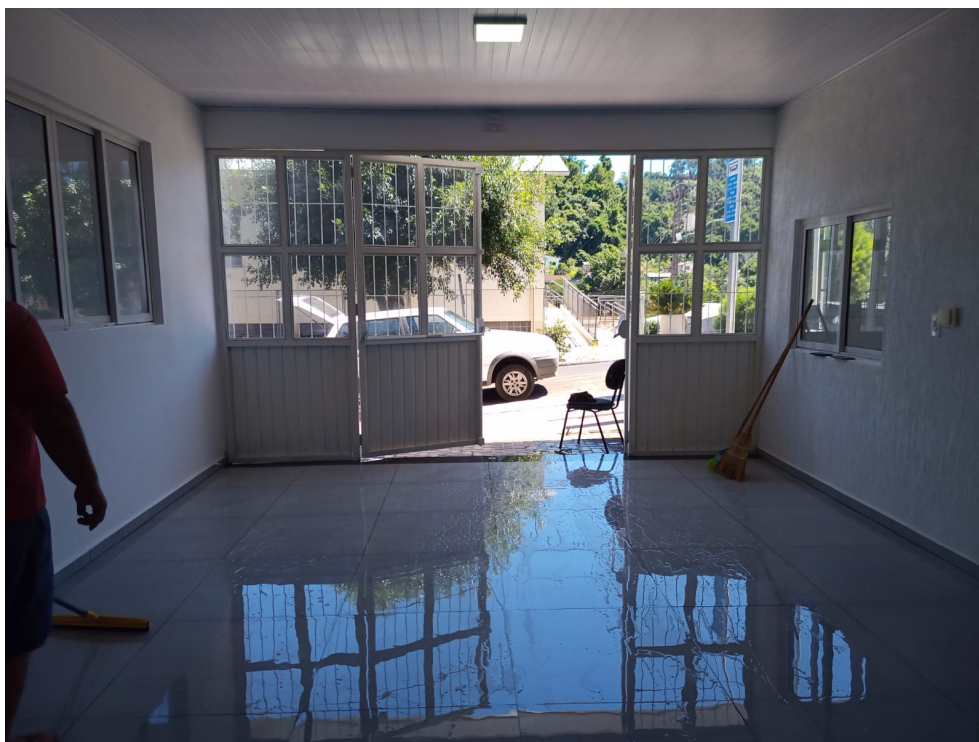


Foto 2: Portão principal com barras antipânico e vidro. Pintura na cor branca.



Foto 3: Área Interna (piso, portas, janelas, forro e iluminação).



Foto 4: Pintura externa. Piso, portas e janelas. Guarda-corpo.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 61.450,30.

Pato Branco, 29 de Janeiro de 2024.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D


EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 174.064/D









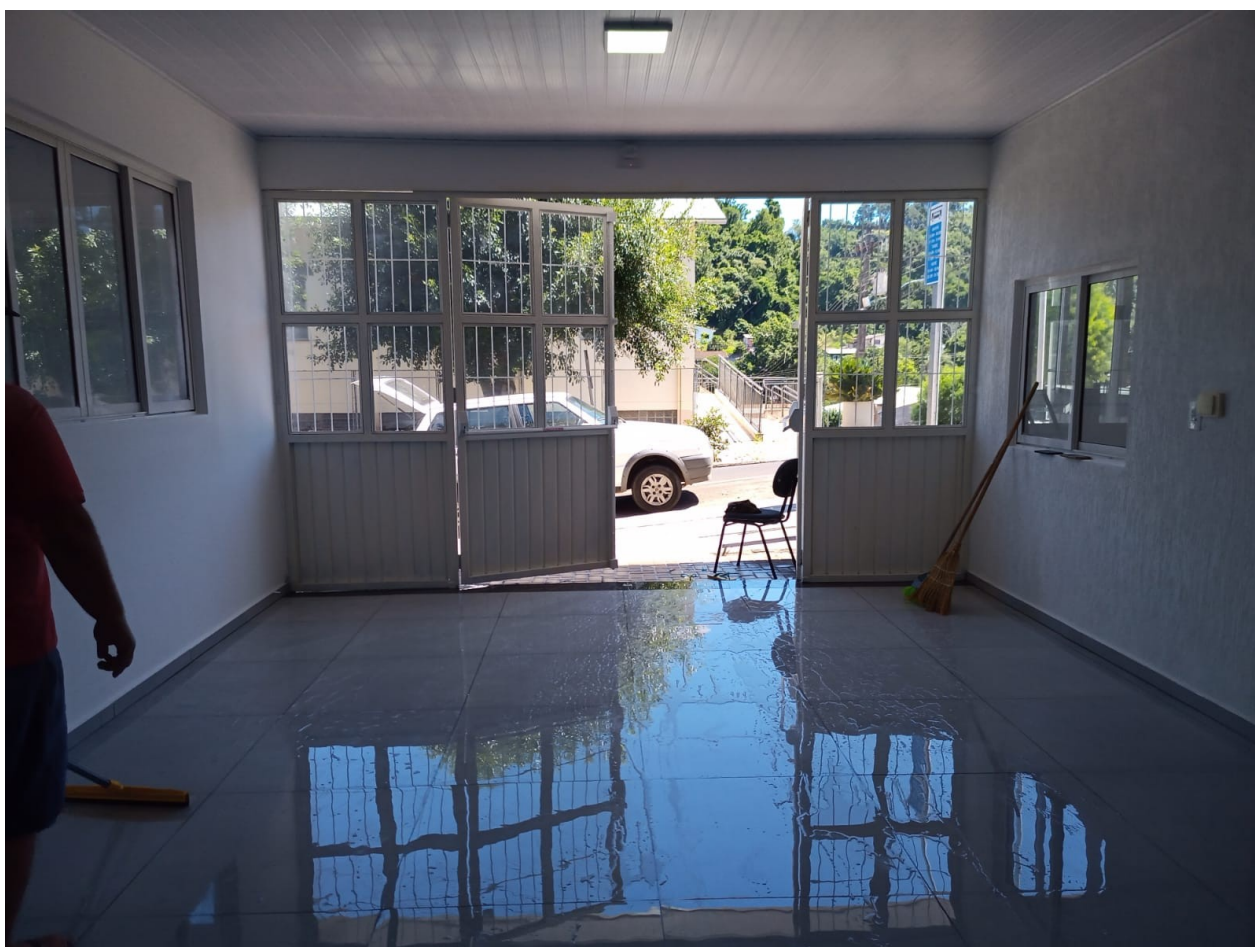







Medição 01 Aditivo 01



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	23/11/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	0	0	(SELECIONAR)		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			23/11/2023 a 29/01/2024		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)					TOTAL:	-	-	-	-	295.286,49	295.286,49
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	-	-	-	295.286,49	-	-	-	-	295.286,49	295.286,49
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS (REFORMA)	-	-	-	116.633,12	-	-	-	-	116.633,12	116.633,12
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	494,89	29,99	14.841,75	-	494,89	494,89	-	14.841,75	14.841,75
1.1.2.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	66,14	608,56	40.250,16	-	66,14	66,14	-	40.250,16	40.250,16
1.1.3.	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	581,62	105,81	61.541,21	-	581,62	581,62	-	61.541,21	61.541,21
1.2.	ELÉTRICA	-	-	-	28.964,82	-	-	-	-	28.964,82	28.964,82
1.2.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	700,00	3,66	2.562,00	-	700,00	700,00	-	2.562,00	2.562,00
1.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	5,20	4.160,00	-	800,00	800,00	-	4.160,00	4.160,00
1.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	7,94	3.970,00	-	500,00	500,00	-	3.970,00	3.970,00
1.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	11,00	4.400,00	-	400,00	400,00	-	4.400,00	4.400,00
1.2.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	19,47	5.841,00	-	300,00	300,00	-	5.841,00	5.841,00
1.2.6.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	877,36	877,36	-	1,00	1,00	-	877,36	877,36
1.2.7.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	45,99	1.471,68	-	32,00	32,00	-	1.471,68	1.471,68
1.2.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	35,91	359,10	-	10,00	10,00	-	359,10	359,10
1.2.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	17,82	2.673,00	-	150,00	150,00	-	2.673,00	2.673,00
1.2.10.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	87,57	1.050,84	-	12,00	12,00	-	1.050,84	1.050,84
1.2.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	96,66	1.159,92	-	12,00	12,00	-	1.159,92	1.159,92
1.2.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	17,53	210,36	-	12,00	12,00	-	210,36	210,36
1.2.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	19,13	229,56	-	12,00	12,00	-	229,56	229,56

Medição 01 Aditivo 01



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APelido do Empreendimento REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	INÍCIO DE OBRA 23/11/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/11/2023 a 29/01/2024
				Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)					TOTAL:	-	-	-	-	295.286,49	295.286,49
1.3.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.000,00	11,00	11.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	11.000,00	11.000,00
1.3.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	91,51	1.281,14	-	14,00	14,00	-	1.281,14	1.281,14
1.3.3.	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	14,00	22,36	313,04	-	14,00	14,00	-	313,04	313,04
1.4.	CALÇADA	-	-	-	10.700,27	-	-	-	-	10.700,27	10.700,27
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	128,47	83,29	10.700,27	-	128,47	128,47	-	10.700,27	10.700,27
1.5.	MURO DE ARRIMO	-	-	-	54.438,32	-	-	-	-	54.438,32	54.438,32
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	88,54	112,87	9.993,51	-	88,54	88,54	-	9.993,51	9.993,51
1.5.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	7,45	206,36	1.537,38	-	7,45	7,45	-	1.537,38	1.537,38
1.5.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M	1,68	74,53	125,21	-	1,68	1,68	-	125,21	125,21
1.5.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	37,50	131,74	4.940,25	-	37,50	37,50	-	4.940,25	4.940,25
1.5.5.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	72,48	140,93	10.214,61	-	72,48	72,48	-	10.214,61	10.214,61
1.5.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	350,38	16,92	5.928,43	-	350,38	350,38	-	5.928,43	5.928,43
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	520,75	14,72	7.665,44	-	520,75	520,75	-	7.665,44	7.665,44
1.5.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	44,01	16,50	726,17	-	44,01	44,01	-	726,17	726,17
1.5.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	42,60	286,58	12.208,31	-	42,60	42,60	-	12.208,31	12.208,31
1.5.10.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	11,25	97,69	1.099,01	-	11,25	11,25	-	1.099,01	1.099,01
1.6.	RAMPA DE ACESSO PLAYGROUND	-	-	-	35.966,38	-	-	-	-	35.966,38	35.966,38
1.6.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	31,88	791,74	25.240,67	-	31,88	31,88	-	25.240,67	25.240,67
1.6.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO	M	63,76	141,94	9.043,72	-	63,76	63,76	-	9.043,72	9.043,72

Medição 01 Aditivo 01



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	23/11/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	0	0	(SELECIONAR)		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			23/11/2023 a 29/01/2024		

Realizado Acumulado: 100,00%


Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRIANÇA FELIZ (ADITIVO)											
TOTAL:					295.286,49	-	-	-	-	295.286,49	295.286,49
1.6.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	M2	13,78	122,06	1.681,99	-	13,78	13,78	-	1.681,99	1.681,99
1.7.	BASE PARA PLAYGROUND	-	-	-	35.989,40	-	-	-	-	35.989,40	35.989,40
1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	14,52	167,25	2.428,47	-	14,52	14,52	-	2.428,47	2.428,47
1.7.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,10	112,87	1.365,73	-	12,10	12,10	-	1.365,73	1.365,73
1.7.3.	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	121,00	205,22	24.831,62	-	121,00	121,00	-	24.831,62	24.831,62
1.7.4.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	12,10	608,56	7.363,58	-	12,10	12,10	-	7.363,58	7.363,58

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D-PR
ART/RRT: 1720235939211



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

CONTRATO Nº 80/2023/GP

Relatório de Medição nº 1

ADITAMENTO

DATA: 29/01/2023

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO
– CAU/BR Nº 000A910392

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Remoção de revestimento cerâmico.



Foto 2: Quadro de energia elétrica (disjuntores).



Foto 3: Muro de Arrimo e base para playground.



Foto 4: Muro de Arrimo e base para playground.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 295.286,49.

Pato Branco, 29 de Janeiro de 2024.


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 174.064/D



