



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 06 de fevereiro 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 228/2022-GP


O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 350.108,13	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 06/02/2023	97,72	342.140,78	2,28	R\$ 7.967,35
A liberar 2. ^a Parcela em				
A liberar 3. ^a Parcela em				
A liberar 4. ^a Parcela em				
A liberar 5. ^a Parcela em				
A liberar 6. ^a Parcela em				

Valor a ser liberado em 06/02/2023 R\$ 342.140,78

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv		Apelo do Empreendimento		Início de Obra	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		Nº Medição	
0		LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA		10.783.587/0001-96		(SELECIONAR)		22/09/2022	
						01 TROCA DE TELHADOS			
						PERÍODO DA MEDIÇÃO			
						22/09/2022 a 06/02/2023			

Realizado Acumulado: 97,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						TOTAL:					
1.1.	TELHADOS	-	-	-	350.108,13	-	-	-	-	342.140,78	342.140,78
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	298.936,07	-	-	-	-	292.851,92	292.851,92
1.1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	638,50	62,00	39.587,00	-	638,50	638,50	-	39.587,00	39.587,00
1.1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	638,50	4,00	2.554,00	-	638,50	638,50	-	2.554,00	2.554,00
1.1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	638,50	7,00	4.469,50	-	638,50	638,50	-	4.469,50	4.469,50
1.1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	666,70	225,00	150.007,50	-	666,70	666,70	-	150.007,50	150.007,50
1.1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	76,00	120,00	9.120,00	-	76,00	76,00	-	9.120,00	9.120,00
1.1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	112,20	75,00	8.415,00	-	112,20	112,20	-	8.415,00	8.415,00
1.1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	260,00	200,00	52.000,00	-	260,00	260,00	-	52.000,00	52.000,00
1.1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	47,00	129,45	6.084,15	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALCOIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	638,50	30,00	19.155,00	-	638,50	638,50	-	19.155,00	19.155,00
1.1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA INSTALAÇÃO	M	33,00	86,64	2.859,12	-	33,00	33,00	-	2.859,12	2.859,12
1.1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUÉLAS DE VEDAÇÃO	CJ	2.560,00	1,83	4.684,80	-	2.560,00	2.560,00	-	4.684,80	4.684,80
1.2.	Ferro de PVC	-	-	-	49.065,76	-	-	-	-	49.065,76	49.065,76
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	638,50	2,12	1.353,62	-	638,50	638,50	-	1.353,62	1.353,62
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	638,50	70,03	44.714,16	-	638,50	638,50	-	44.714,16	44.714,16
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	448,80	6,68	2.997,98	-	448,80	448,80	-	2.997,98	2.997,98
1.3.	OUTROS	-	-	-	2.106,30	-	-	-	-	223,10	223,10
1.3.1.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	46,00	9,70	446,20	-	23,00	23,00	-	223,10	223,10
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	638,50	2,60	1.660,10	-	-	-	-	-	-

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0		0				01TROCA DE TELHADOS		22/09/22	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96		(SELECIONAR)		22/09/2022 a 06/02/2023		1	

Realizado Acumulado: 97,72%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	350.108,13	-	-	-	-	342.148,78	342.148,78

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERNAANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 0

Assinado digitalmente



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA SEDE DON CARLOS**

CONTRATO Nº340/2022/GP



Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 342.140,78.

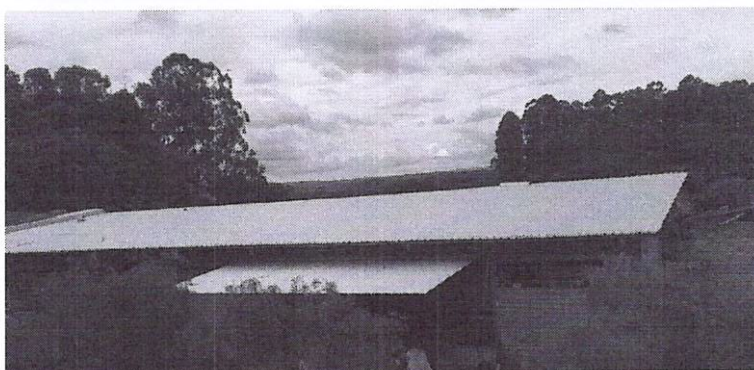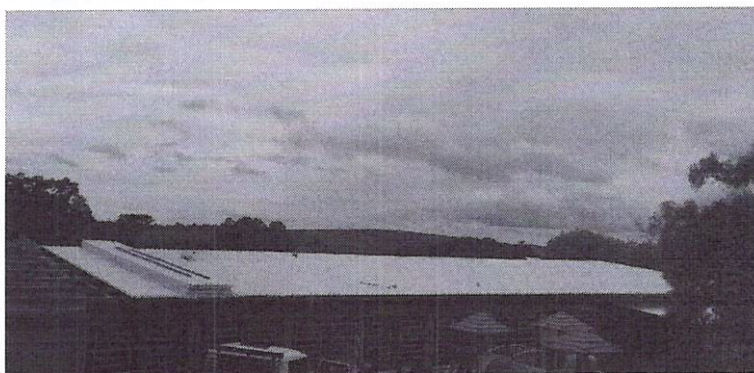



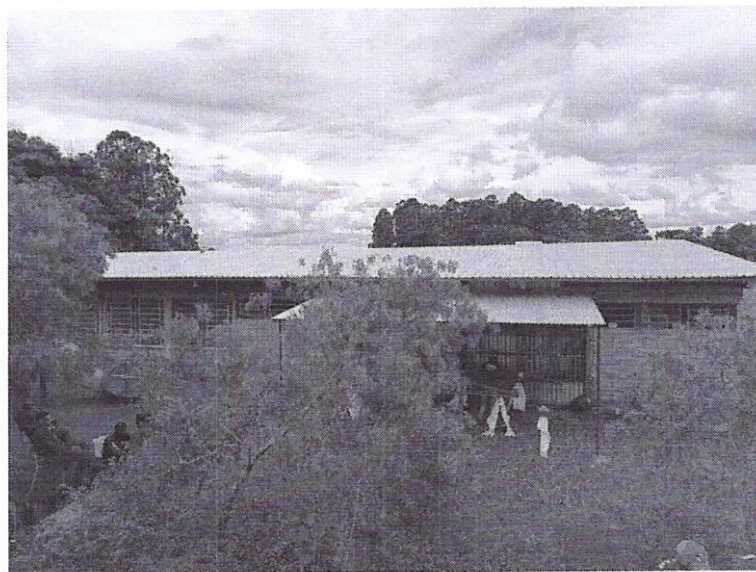

Pato Branco, 08 de fevereiro de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
