


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 13/2022	120	17/05/2022	R\$ 548.287,46	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

59028

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
7172	2022	06/05/2022	12433
1632	2022	01/05/2022	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1132	580522	06/05/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Do (Respons Técnico	ável Doc. (Responsá	vel Técnico) Tipo Doc. (Org Classe)	gão Doc. (Orgão Clas	sse) Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.0**-81	ART (CREA) 17**2*3**09**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*4*.6**-12	RRT (CAU)	12**8*6*	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.0**-46	ART (CREA) 17**2*0**87**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32183	R\$ 599.619,26	22/10/2021	
Contrato	13	2022	76.995.448/0001-54	32184	R\$ 548.287,46	26/01/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32216	Paralisação	1	Jurisdicionado	23/06/2022			
32229	Medição	2	Jurisdicionado	15/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2022	8,12%
32245	Medição	3	Jurisdicionado	22/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2022	8,12%
32261	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2022	8,12%
32277	Medição	5	Jurisdicionado	25/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2022	8,12%

5


32314 Medição 6 Jurisdicionado 28/10/2022 Execução Indireta - Contrato Contrato 13/2022 100,00%

32315 Conclusão 7 Jurisdicionado 28/11/2022

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900109098874



Nº OPERAÇÃO	N° SICONV
1071361-64	899217/2020

LOCALIDADE S	DATA BASE	
CURITIBA	08-21 (N. DES.)	
Item	Fonte	Código

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAI

1.		
1.1.		
1.1.1.	Composição	007
1.1.2.	SINAPI	98525
1.1.3.	Composição	017
1.1.4.	Composição	008
1.1.5.	Cotação	003
1.1.6.	Composição	009
1.2.		
1.2.1.	SINAPI	96527
1.2.2.	SINAPI	93382
1.2.3.	SINAPI	101173
1.2.4.	SINAPI	96622
1.2.5.	SINAPI	96536
1.2.6.	SINAPI	92775
1.2.7.	SINAPI	92778
1.2.8.	Composição	001
1.3.		

1.3.1.	SINAPI	98557
1.4.		
1.4.1.	SINAPI	92427
1.4.2.	SINAPI	92775
1.4.3.	SINAPI	92778
1.4.4.	SINAPI	92720
1.5.		
1.5.1.	Composição	002
1.5.2.	SINAPI	92775
1.5.3.	SINAPI	92777
1.5.4.	Composição	003
1.6.		
1.6.1.	SINAPI	87479
1.7.		
1.7.1.	SINAPI	87894
1.7.2.	SINAPI	87792
1.7.3.	SINAPI	88485

1.7.4.	SINAPI	88426	
1.8.			
1.8.1.	Composição	004	
1.8.2.	SINAPI	96622	
1.8.3.	Composição	005	
1.9.			
1.9.1.	Composição	006	
1.10.			
1.10.1.	SINAPI	100576	
1.10.2.	SINAPI	92396	
1.10.3.	SINAPI	93679	
1.10.4.	Composição	016	
1.10.5.	Composição	018	
1.11.			
1.11.1.	Composição	010	
1.11.2.	Composição	011	
1.11.3.	SINAPI	99260	
1.11.4.	SINAPI	95567	
1.11.5.	SICRO	2003475	

1.11.6.	Composição	030
1.12.		
1.12.1.	SINAPI	91927
1.12.2.	SINAPI	91929
1.12.3.	SINAPI	91933
1.12.4.	Composição	022
1.12.5.	Composição	021
1.12.6.	SINAPI	93662
1.12.7.	SINAPI	93655
1.12.8.	SINAPI	93673
1.12.9.	SINAPI	97667
1.12.10.	SINAPI	97668
1.12.11.	Composição	023
1.12.12.	Composição	024
1.12.13.	Composição	025
1.12.14.	SINAPI	96985
1.12.15.	SINAPI	101882
1.12.16.	SINAPI	92001
1.12.17.	Composição	026
1.12.18.	Composição	027

1.12.19.	Composição	028
1.13.		
1.13.1.	Composição	020
1.13.2.	Composição	031
1.14.		
1.14.1.	Composição	029

Encargos sociais: Para elaboração

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas Siglas da Composição do Investimento: RA - Ra

PATO BRANCO/PR

Local

sexta-feira,22 de outubro de 2021

Data

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO E
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	CONSTRUÇÃ(
DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO / UF PATO BRANC
Descrição	Unidade
RRO INDUSTRIAL	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA E POSTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	М
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE
ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNIDADE
LOCAÇÃO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	UNIDADE
FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	М3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	МЗ
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	М
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³
IMPERMEABILIZAÇÃO	

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2
PILARES	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	МЗ
VIGA CINTA	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE VIGAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3
ALVENARIA	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2
REVESTIMENTOS	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2
PISO	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARGILOSO	M3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	МЗ
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2X2M	M2
ALAMBRADO	
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (3" E 1 1/2") TELA DE ARAME GALVNIZADO REVESTIDO EM PVC 12BWG, MALHA 7,5X7,5CM E PERFIL U, ABAS=5CM, INCLUI PORTÃO DE CORRER1,50X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO	
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M
PORTÃO DE ABRIR METÁLICO, 2,15X2,0M, DUAS FOLHAS, COM REQUADRO, FIXADO EM TUBOS GALVANIZADOS	UN
SISTEMA DE DRENAGEM	
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L=30CM, PARA ÁGUA PLUUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	М
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	UN

EXECUÇÃO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO D=0,20M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	М
ILUMINAÇÃO	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½□) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	М
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	М
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 63 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CÔNICO CONTÍNUO RETO, H:4,0M, TIPO ENGASTADO COM LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL TOPO DE POSTE DE 60W IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CÔNICO CONTÍNUO RETO COM CRUZETA, H:6,0M, TIPO ENGASTADO COM REFLETORES DE 150W IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL, TRILHO DIN, 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 45A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
PINTURA DA QUADRA	
APLICACAO DE TINTA A BASE DE POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV SOBRE PISO (2 DEMÃOS), INCLUSO APLICAÇÃO DE SELADOR PRIMER EPOXI (1 DEMÃO), CATALISADOR E DILUENTE	M2
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	ML
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN

deste orçamento,	, foram utilizados	os encargos	sociais do	SINAPI	para a	Unidade	da F

decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.	
ateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP -	1

Responsável Nome: CREA/CAU: ART/RRT:

MPREENDIMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUTRIAL

: O/PR		BDI 1 20.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0,00%
Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
				599,619.26
				599,619.26
			-	7,510.46
2.88	424.50	BDI 1	509.40	1,467.07
1,271.99	0.34	BDI 1	0.41	521.52
23.50	26.48	BDI 1	31.78	746.83
1.00	2,007.16	BDI 1	2,408.59	2,408.59
1.00	196.68	BDI 1	236.02	236.02
1.00	1,775.36	BDI 1	2,130.43	2,130.43
			-	25,726.21
9.90	126.81	BDI 1	152.17	1,506.48
2.83	31.56	BDI 1	37.87	107.17
52.00	59.22	BDI 1	71.06	3,695.12
1.06	96.47	BDI 1	115.76	122.71
84.90	81.81	BDI 1	98.17	8,334.63
86.97	21.49	BDI 1	25.79	2,242.96
349.22	16.61	BDI 1	19.93	6,959.95
6.36	361.27	BDI 1	433.52	2,757.19
			-	2,956.83

63.67	38.70	BDI 1	46.44	2,956.83
			-	5,489.80
16.44	52.54	BDI 1	63.05	1,036.54
24.63	21.49	BDI 1	25.79	635.21
163.38	16.61	BDI 1	19.93	3,256.16
1.14	410.74	BDI 1	492.89	561.89
			-	10,554.01
42.00	59.93	BDI 1	71.92	3,020.64
49.52	21.49	BDI 1	25.79	1,277.12
215.60	18.69	BDI 1	22.43	4,835.91
3.15	375.75	BDI 1	450.90	1,420.34
			-	5,191.87
62.81	68.88	BDI 1	82.66	5,191.87
			-	15,450.02
206.80	6.34	BDI 1	7.61	1,573.75
206.80	35.23	BDI 1	42.28	8,743.50
206.80	2.65	BDI 1	3.18	657.62

206.80	18.03	BDI 1	21.64	4,475.15
			-	180,907.68
115.06	32.06	BDI 1	38.47	4,426.36
57.53	96.47	BDI 1	115.76	6,659.67
1,124.20	125.88	BDI 1	151.06	169,821.65
			-	117,016.37
1.00	97,513.64	BDI 1	117,016.37	117,016.37
			•	18,716.22
141.10	1.91	BDI 1	2.29	323.12
93.60	55.52	BDI 1	66.62	6,235.63
47.50	60.63	BDI 1	72.76	3,456.10
234.00	24.09	BDI 1	28.91	6,764.94
1.00	1,613.69	BDI 1	1,936.43	1,936.43
			-	44,307.68
88.00	49.17	BDI 1	59.00	5,192.00
88.00	247.91	BDI 1	297.49	26,179.12
2.00	412.94	BDI 1	495.53	991.06
45.25	63.13	BDI 1	75.76	3,428.14
1.00	444.36	BDI 1	533.23	533.23

113.25	58.75	BDI 1	70.50	7,984.13
			-	57,292.44
960.00	5.37	BDI 1	6.44	6,182.40
432.00	7.54	BDI 1	9.05	3,909.60
230.00	15.98	BDI 1	19.18	4,411.40
15.00	103.57	BDI 1	124.28	1,864.20
5.00	96.46	BDI 1	115.75	578.75
3.00	57.23	BDI 1	68.68	206.04
1.00	12.82	BDI 1	15.38	15.38
2.00	92.32	BDI 1	110.78	221.56
350.00	8.05	BDI 1	9.66	3,381.00
70.00	12.35	BDI 1	14.82	1,037.40
6.00	116.12	BDI 1	139.34	836.04
9.00	1,271.34	BDI 1	1,525.61	13,730.49
6.00	2,343.70	BDI 1	2,812.44	16,874.64
1.00	60.63	BDI 1	72.76	72.76
1.00	2,027.11	BDI 1	2,432.53	2,432.53
6.00	31.79	BDI 1	38.15	228.90
1.00	51.02	BDI 1	61.22	61.22
1.00	145.16	BDI 1	174.19	174.19

1.00	894.95	BDI 1	1,073.94	1,073.94
			-	89,560.26
1,124.20	59.57	BDI 1	71.48	80,357.82
504.52	15.20	BDI 1	18.24	9,202.44
			•	18,939.41
1.00	15,782.84	BDI 1	18,939.41	18,939.41

ederação indicada.			

Técnico ANDERSON ROSSATTO 124.502/D 1720210668770

00% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Contrato nº 13/2022/GP.

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Que entre si celebram, o Município de Pato Branco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Robson Cantu, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.700.335/0001-52, Inscrição Estadual nº 9060520400 com sede na Rua Frei Vitor Berscheid, nº 828, CEP 85568-000, na cidade de Saudade do Iguaçu/PR, Telefone (46) 3246-1192, (46) 98405-6851, Email mg.construcaocivil@hotmail.com, neste ato representada por *Marcio Gallina*, inscrito no CPF nº 027.917.999-58, portador do RG nº 5.980.314-0, residente e domiciliado em Saudade do Iguaçu/PR, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execução dos serviços, adiante especificado, cuja licitação foi promovida através do Edital de Tomada de Precos nº 12/2021, Processo nº 248/2021, sob protocolo nº 441391/2021 que independente da sua transcrição, integra o presente contrato que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do Código Civil e do Código do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a construção de quadra Poliesportiva no Bairro Industrial, com área de interferência de 1.312,83m², localizada na Rua Industrial, nº 200, Bairro Industrial neste município com Recursos do Convênio nº 899217/2020 celebrado a União Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município do Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Esporte e Lazer.

CLÁUSULA SEGUNDA - LOCALIZAÇÃO

- I A execução dos serviços terá como ponto de referencia as seguintes localizações e coordenadas:
- a) Rua Industrial, nº 200, Bairro Industrial no Município de Pato Branco.

Coordenadas: **S** 26º 14' 23,01" **O** 52º 40' 06,00"

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR

I - O valor global certo e ajustado para a execução do presente contrato é de *R\$ 548.287,46* (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - PROJETOS E PLANILHAS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- I Em caso de divergência ou duplicidade, em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
- a) Projetos, especificações e memoriais descritivos.
- b) Planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços.
- II A planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços será meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatório.
- **III -** A omissão ou imprecisão dos instrumentos técnicos instrutores de serviços essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço não exime a contratada da responsabilidade por sua execução, sem ônus adicional para a Contratante.

W



IV- As eventuais alterações contratuais que se fizerem necessárias, sob a alegação de falhas ou omissões nos projetos que integram o presente Edital, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, II, do Decreto nº 7.983/13.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES E REGIME DE EXECUÇÃO

- I A presente contratação se dará sob a forma de execução indireta por regime de "empreitada por preço global", conforme art. 10, II, "a" da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
- II Na execução dos serviços, objetos da presente licitação deverão ser observados, de modo geral, as especificações e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações da fiscalização e dos órgãos ambientais e de controle.
- III Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos e instruções da fiscalização do Município de Pato Branco - PR, através da Secretaria de Engenharia e Obras.
- IV A execução dos serviços devem seguir as especificações descritas na NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Memorial Descritivo e planilha de serviços.
- V Toda e qualquer alteração que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

- I Os serviços deverão ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de Serviço, sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei nº 8666/93.
- II Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de serviço após quinze dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Município, dar-se-á início da contagem do prazo de execução.
- III A contratada terá um prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do aceite da Ordem de Serviço, para a execução integral dos serviços contratados.
- IV O período de vigência contratual será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da sua assinatura.
- **V -** O prazo contratual poderá ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- VI O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos
 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO

I - Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- I O Município de Pato Branco pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas especificações e normas indicadas neste contrato e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
- II O pagamento será efetuado conforme Cronograma Físico/Financeiro aprovado, observado o que segue:

M



- III O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.
- IV Não será dispensado na nota fiscal ou fatura informações básicas, como, descrição do objeto e/ou serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da Contratante e da Contratada, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato bem como pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços, mesmo contendo o código de barras.
- V A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverá(ão) ser impressa(s) de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter, no mínimo, o total para cada produto e/ou serviço.
- VI Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação do processo licitatório.
- VII Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- I Para suporte da despesa do objeto da presente licitação serão empregadas as Dotações Orçamentárias:
- a) 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 16.02 Departamento de Esporte e Lazer 278120041.1.132000 Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte: 985 Despesa 7601 Desdobramento 7619.
- b) 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 16.02 Departamento de Esporte e Lazer 278120041.1.132000 Construção de Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) Despesa 1178 Desdobramento 7621.

CLÁUSULA DÉCIMA - RECEBIMENTO DA OBRA

- I O recebimento da obra se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso I alíneas "a" e "b", seus parágrafos e art. 76 da Lei n.º 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:
- a) Recebimento provisório pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada.
- b) Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório pelo Fiscal da Obra, cumpre à contratada a guarda e manutenção da obra em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- c) Após a realização de vistoria que constate não haver defeitos, vícios ou incorreções ou que já tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra emitirá o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório.
- d) Recebimento Definitivo será realizado pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de Engenharia e Mão de Obra do Município de Pato Branco, para atestar se os serviços contemplaram plenamente aos

B



requisitos dos termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, limitado a 90 dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

- e) Durante o prazo de observação de até 90 dias, a comissão designada deverá aferir o adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existência de eventuais problemas durante a utilização do bem, tais como:
- i. O surgimento de fissuras, trincamentos, desníveis ou afundamentos, defeitos de drenagem, surgimento de vazamentos, rachaduras, infiltrações ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.
- f) Os defeitos construtivos verificados deverão ser corrigidos pela empresa executante nos termos do art. 69 da lei Federal nº 8.666/93, antes da emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.
- II Ficam nomeados os servidores responsáveis pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de Engenharia e Mão de Obra do Município de Pato Branco, para atuar na execução do contrato:
- a) Jorge Eduardo Chioquetta Engenheiro Civil, matrícula 7.232-0, da Secretaria de Engenharia e Obras;
- b)Fernanda Zianni Manarim Engenheira Civil, matrícula 7.447-0, da Secretaria de Engenharia e Obras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

- I A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.
- II Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes.
 O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.
- III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- I Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas nesse Termo de Referência.
- II Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a vigência do contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, informando a Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.
- **III -** Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e na proposta de preço apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas.
- IV A contratada é responsável perante o Município, por todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicação escrita, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada, inconveniente pelo Município, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias, sindicais, indenizações e despesas por acidentes de trabalho, considerada como única empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.

W/



- V Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.
- VI Certificar-se preliminarmente de todas as condições exigidas no Contrato, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
- VII Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizações necessárias.
- VIII Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação.
- **IX** A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.
- **X -** Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso na entrega do objeto desta licitação.
- XI A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho.
- **XII -** Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, contratação de pessoal e demais encargos pertinentes aos serviços, serão de total responsabilidade da Contratada.
- XIII Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e prepostos.
- XIV A Contratada deverá apresentar ao gestor e/ou fiscal do contrato, relação atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.
- XV Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).
- **XVI** Quando solicitado, a contratada enviará à fiscalização cópia do relatório de controle tecnológico de concreto relativo às estruturas executadas com mais de 28 (vinte e oito) dias.
- **XVII -** Manter em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
- **XVIII -** A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.
- XIX Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- **XX -** As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou fiscal do contrato.
- **XXI -** Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória.
- **XXII -** Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser apresentados ao fiscal e/ou gestor do contrato, para sua definição e determinação.





XXIII - Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

XXIV - A Contratada deverá apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Município, a ART de execução do projeto em até 2 (dois) dias após a emissão da Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- I As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.
- II Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
- III Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
- IV Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
- V Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.
- VI Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
- VII Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
- VIII Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
- **IX -** Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
- X Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
- XI Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
- XII É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
- XIII Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
- XIV Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- **XV -** Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
- XVI Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
- **XVII -** A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
- a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos:
- b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

N



- **XVIII -** Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- XIV Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- I Designar pessoa responsável para o acompanhamento, avaliação e conferência da execução dos serviços contratados e os mesmos deverão estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de Serviço.
- II Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
- **III** Notificar formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas.
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
- V Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.
- VI Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
- VII Conferir e acompanhar os serviços, através do fiscal e do gestor do contrato, e caso haja alguma divergência com o serviço solicitado e o entregue, requerer a sua reexecução imediata.
- VIII Permitir que os funcionários da Contratada tenham acesso aos locais de execução dos serviços.
- IX Proceder ao recebimento provisório do objeto contratado e, não havendo mais pendências, a administração promoverá o recebimento definitivo do serviço, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens, designada pelo Município, nos termos da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I.
- **X -** Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCAL DA OBRA, GESTOR DO CONTRATO, TÉCNICO RESPONSÁVEL E DO PREPOSTO

I - FISCAL DA OBRA

- a) A administração indica como fiscal do contrato o Engenheiro Civil, Jorge Eduardo Chioqueta, matricula nº 7232-0/1.
- **b)** Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal nº 8.296 de 17 de abril de 2018.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

II - GESTOR DO CONTRATO

- a) A administração indica como **gestor** do contrato o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Alexandre Zocche, matricula nº 11112-0/3.
- **b)** Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal nº 8.296 de 17 de abril de 2018, bem como as atribuições previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

III - TÉCNICO RESPONSÁVEL E DO PREPOSTO

a) - O técnico responsável pelo serviço será, Rodrigo Pires Franco, indicado pela Contratada.

7 de 16

Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br



- b) O contratado manterá como preposto, o Sr. Claudemir Poletto, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato, a quem poderão ser dirigidas eventuais notificações decorrentes da execução do contrato.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO

- I O Município de Pato Branco poderá, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a fiscalização, medição e demais ações que se fizerem necessárias a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado.
- II As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas constantes do cronograma físico financeiro. Para efeito de medição e de faturamento relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico financeiro, que será peça integrante do contrato. O cronograma físico financeiro será apresentado pela Secretaria de Engenharia e Obras, ficando a critério da contratada a apresentação, no ato da apresentação da proposta quando da abertura do processo licitatório, de seu próprio cronograma físico financeiro, respeitando o prazo máximo de execução estabelecido.
- III As medições da obra ou serviços serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem de serviço. A Contratada deverá apresentar a planilha de medição compatível com o cronograma físico e financeiro, tendo, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 5 (cinco) dias úteis para análise e conferência da mesma.
- IV A contratada é obrigada a manter o histórico dos serviços executados e condições climáticas para execução dos trabalhos, tais medidas serão observadas através do preenchimento dos diários de obras(conforme modelo disponibilizado em mídia digital). O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dará pela seguinte forma:
- a) Os Diários de Obra serão preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues à Secretaria de Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitação de cada medição ou sempre que solicitado pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES

- I Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. 5º do Decreto Municipal nº 8.441/19, a Contratada ficará sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado pela Administração inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidade das seguintes espécies:
- a) Advertência.
- b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração.
- d) Declaração de inidoneidade.
- e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
- II As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item I, poderão ser aplicadas cumulativamente com a do subitem "b".
- III Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7° do Decreto Municipal n° 8.441/19:
- i) A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de forma diferente no contrato, poderá ser:





- a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
- I 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos.
- II 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante.
- b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais.
- I 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.
- II 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração.
- ii) O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.
- IV A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
- V Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma.
- **VI -** O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO

- I Constituem motivos para rescisão contratual, o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos e prazos, a lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras a presumir a não conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados.
- II Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei nº 8.666/93, o Município de Pato Branco poderá, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da LL.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- REAJUSTE DOS PREÇOS

- I Os valores constantes da planilha orçamentária poderão ser reajustados pelo IGPM, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentação da proposta de preços.
- II Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
- III Não será concedido reajuste de preços resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorrência da incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.
- IV Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, relativamente a previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerá as condições seguintes:

A



- a) Quando houver atrasos, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerá os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação.
- b) Se os preços diminuírem prevalecerá os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação.
- c) A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer a mora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ANTICORRUPÇÃO

I - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

- I Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco PR. Para dirimir questões relativas ao presente contrato, com a expressa e formal renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
- II Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposições do Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 26 de Janeiro de 2022.

Robson Cantu Robson Cantu Dados: 2022.02.03 14:27:12

Assinado de forma digital por

Município de Pato Branco - Contratante Robson Cantu - Prefeito Municipal

MARCIOCANI Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli - Contratada Marcio Gallina - Representante Legal



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Gaude Siglo

CNPJ: 16.700.535,0001 52

NP 3 CONY PROPONENTE TOMADOR APELIDO BAPPELENDIMENTO SOSSITRUÇÃO DE CUADRA POLESFORTIVA NO BAMEIO CALENCADO DE CLADRA POLESFORTIVA NO BAMEIO CALENDA DE CLADRA POLESFORTIVA NO BAMEIO DE CLADRA POLESFORTIVA NO BAMEIO CALENDA POLESFORTIVA NO BAMEIO CALENDA

Nº OPERAÇÃO 1871361 64

CRONDGRAMA FISICO-FINANCEIRO OGU

Value (BS) 40.764.78 FUNDACOES E VIGABA DRAME PAVISIFATAÇAD IND ADESSO SISTEMA DE DIENAGEN PHILTIPA DA QUACIPIA otal: R\$ 548.287,46 ALAMSHADO PLYEMARIA VIGA CINTA

11 de 16

Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Manuacipe Custo Lundridade Custo Unitario Education Constitutação De Cutadridade Custo Unitario Education Ed	XA		PO - PLANILHA OR(Orçamento Base par	a Lichação - OGU						Grau de Sigio #PUBLICO	
Marchicololus	Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR 8982172020 MARCIO GALLINA CONSTRUÇĂ		MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MA	VO. 335NUUT - 52 TERIAIS DE CONSTRUÇÃO	APELIDO DO CONSTRUÇÃO	EMPREENDIME D DE QUADRA #	NTO OLIESPORTIVA!	IO BAIRRO	NDUS TRIAL		***********
Unidade Outentidade Custo Unitario Freço Unitario Freço Total	LOCALIDADE SINAPI DATA BASE IDESCRIÇÃO DO LOTE CUPITIBA 08-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL		DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CILABRA POLIESPORTIVA N	NO BAIRRO INDUSTRIAL	MUNICIPIO / U PATO BRANC	0 - PR		8011 20,00%	8DI2 0,00%	BDR3 0.00%	
Unidade Ouantidade Custo Unitário Cr.) Com EDO; (FS)											RECURSO
Miles	Fonie Código Descrição		Descrição		Unidade	Ouantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	<u>9</u>	Preço Unitario (com BDI) (RS)	Preço Tetal (RS)	->
Miles Mile	AD DE GUACHTA POLIESPORTIVA NO BARRIO MOUSTRIA. CONSTRUÇÃO DE CUADRA POLIFICAÇÃO NA PROGREMA NO RAIRRO MANISTRIA.	OLESPORTWA NO BARRICO MOUSTRAL. CONSTRUCÃO DE STRANA POLIFISMONTIVA NO	COMSTRUCÃO DE CRIADRA POLIFICIORA NO	RAIDED MEDICATION						548.287.46	-
Mathematical Property Math	2000	0,000	SERVIÇOS PRELIMINIARES						*	6.900,31	L
M	CONTINUEDAD UNITARIO DE CONTRACO DE MANTO DE MANTO DE PRODUCIONA SERVICIONA DE CAMADA VEGETANA VEGETAÇÃO E PEDIENAS SINARPI 88525 ARTICOLES DIGAMETAD DE TRONCO MENTRO DE DE COMPATOR DE	98525	ELACA DE DONA EM L'INFA DE ALCI DAL VANDAL L'IMPEZA ME CANIZADA DE CAMADA VEIGETAL, VE ARVORPES (D'AMETTRO DE TRONCO MENOR ON EL DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE L'ARVORPES (D'AMETTRO DE TRONCO MENOR CONTRA DE CONTRA	GETAÇÃO E PEDUENAS	-	7.00	380.04	BDI 1	466.85	1.349,71	David Control
MAC 15.00 18.45.99 BD11 2.215.92 2.215.91 2.215.92 2.215.91 2.215.92	Dia 017	710	ESTEIRAS, AF 05/2018 REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA E POSTES (secasionneit amento)	DE MADE IRA COM		23.50	24.36	100	28.23	4 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	\$ 6
UNIDADE 1.00 150.96 601 1.96.00 1.	Composição DOS PROFITS DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSITE MANHERA DE	900	ENTRADA PROVISCRIA DE ENERGIA EL ETRICA AEI	NEA TRIFASICA 40A EM	+	1.00	1.846.59	FIGE	2215.91	2.215 41	2
Mail	2003	2003	PATRADA PROVINCAS NE ACTUA		SANGAN		Section and a	B.R.i.			9
MA3 9.50 116.67 BD(11 140.00 1.366.00 MA3 2.63 2.69,04 BD(11 3.4.55 96.53 MA2 1.06 88.75 BD(11 106.50 112.28 KG 88.97 19.77 BD(11 106.50 7.668.17 KG 88.97 19.77 BD(11 22.72 2.062.93 KG 349.22 15.28 BD(11 3.56.84 2.556.82 MZ 6.36 330.37 BD(11 42.72 2.719.38 MZ 6.36 330.37 BD(11 42.72 2.719.38 MZ 6.36 330.34 BD(11 5.80.1 5.556.83 MZ 6.36 346.34 BD(11 5.80.1 5.608.33 MZ 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 MZ 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 MZ 6.36 6.36 6.36 6.36 MZ 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 MZ 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 MZ 6.36		600	LOCAÇÃO DE OBRA COM ECUIPAMENTOS TOPOGR	AFICOS	UNIDADE	1.00	1,633,33	BDI 1	1 960 00	1 940 000	8 8 8
M3 289 116.67 BD(1 140.00 1.386.00 M3 289 299.49 BD(1 34.58 99.59 98.59	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME						•	21 669 89	
M3 285 29.04 BD11 34.85 98.85 M3 1.06 88.75 BD11 106.50 112.88 M3 88.57 BD11 106.50 112.88 M3 88.57 BD11 106.50 112.88 M3 88.57 BD11 22.72 2.062.59 M4 6.36 BD11 398.84 2.538.82 M2 6.36 334.37 BD11 398.84 2.538.82 M2 6.36 334.8 BD11 388.87 2.719.88	SINAPI 98527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDIPAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRA ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS]. AF	ME (NCLUINDO 06/2017	SW	9,90	116,57	BDI 1	140.00	1.386.00	RA
M3 1.05 8011 106.50 112.23 3.392.75 M3 1.05 88.75 8011 106.50 112.23 KG 86.97 19,77 8011 23.72 2.082.39 KG 349.22 15.28 8011 18,34 6.404.69 KG 3349.22 15.28 8011 18,34 6.404.69 KZ 63.67 33.60 8011 42.72 2.719.68 KZ 63.67 33.60 8011 5.80.71 5.091.29	SHARPS 93382 REATERRO NANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.		REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇA AF D42016	O MECANIZADA.	SWS	2.83	29,04	BDI1	34.85	8	2
Ma	SINARPI 101173 MANULAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANDUE. AF DESDIO	-	ESTACA BRICCA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 20CA MANUAL COM TRADO CONCHA, COM AFMADURA DE AF DE/2020	A, ESCAVAÇÃO ARRANQUE	э	52.00	54,48	1108	65.38	3.399,75	2
7 842 75.27 8011 90.22 7.688.17 KG 86.97 19,77 8011 23.72 2.082.93 KG 349.22 15.28 6011 18,34 6.404.69 K 48 6.367 33.60 8011 386.84 2.536.82 K 63.67 33.60 8011 42.72 2.779.89 K 46.34 8011 58.01 56.08.88	SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS OU LAJES SONAPI SE CALO. ESPESSURA DE "S CAT. AF, 04/2017		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM*, AF, 08/2017	PISOS CU LAJES	MG	1,06	88.75	BDI1	106.50	112,88	\$
KG 85.97 19,77 6011 22.72 2.022.99 KG 349.22 15.28 6011 16.34 6.404.69 KZ 636 322.37 6011 356.84 2.558.62 MZ 63.67 35.60 6011 42.72 2.719.86	STANPI 96526 FABRICAÇÃO, MONTACEM E DESMONTAGEM DE FÓRINA PARA VIGA RALDITAME, EN MADEINA SERRADA, 5-25 MM, 4 UTILZAÇÕES. AF_052017		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FI BALDHAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UT	ÓPIM PARA VICA 1LIZAÇÕES. AF_06/2017		84.90	75,27	- INDE	20.00	7.688.17	2
KA 6.26 15,28 EDI 1.6,34 E.04.69 KA 6.36 8302,37 EDI 1.6,34 EDI 1.7, 2.739,58 KZ 65,57 35,60 EDI1 42,72 2.719,58 KRZ 65,54 EDI1 5,50,72 2.719,58	ARNAÇÃO DE PLARIOU VIGA DE UNA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI CONCRETO ARNADO EM UNA EDIFICAÇÃO TÉRREA DU SOBRADO UTUZANDO AÇO CARO DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF., 12:2015		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRRE UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM - MONTAGEM, A	CONVENCIONAL DE A OU SOBRADO F_122018	KG	65.52	17,61	108	Z Z	2.062,93	결
MZ 636 332,37 6011 336,64 2.536,62 MZ 64,04 42,72 2.776,998 MZ 65,66 8011 42,72 2.776,998 MZ 64,34 8011 58,01 58,01 563,68	ARMAÇÃO DE PILAR OU VÍGA DE UNA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAR. SONZE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTUZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM, A	CONVENCIONAL DE OU SCIERADO F_122015		389.23	15.28	BDI 1	18,34	6.404,69	2
MZ 65.67 35.60 BDI1 42.72 2.719.59 MZ 15.44 48.34 BDI1 58.01 583.08	CONCHETAGEN DE ELOCISO DE COROMIENTO E VIDAS PALDRAMIES. FOX Companées 001 ES NEY COMUSO DE BONBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ÁCIBABILINTO.		CONCHETAGEM DE BLOCOS DE CORGAMENTO E VIR 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENS ACABAMENTO.	JAS BALDRAMES, FCK AMENTO E		638	332,37	EDI-1	3358.84 48.84	2.538,62	25
MZ 63.67 35.60 BDI1 42.72 2.719.58 - 5.091.23 - 5.091.23 - 5.091.23		MPERMEABLEAGAO	MAPPENNEABU. CACÃO						,	2759.88	
E M2 16.44 46.34 BDI1 58.01 853.68	SIMAPS 98557 INTERMEDIAL/AU DE SUPENPICIE COM EMILISAO ASFALTICA, DEMANS AF 062018		MATERIAL SOLVENING CONTINUES OF SOLVENING CON	AO ASFALIKA, 2	2442	63.67	35,60	BDI 1	42.72	2.719,58	益
M2 16.44 46.34 BD11 55.01 653.63	FILANES	SHADIN	FLARES							5.051,23	
	SINAPI 92427 MANTAGEN EGSKAVANAGEN EP EPANAE PEPLAKES PETRAKOLLARES E ESTPUTURAS SMILARES, PÉLORETO SIMPLES, EA CHAPA DE MADEIRA COMPENSACA RESINADA, BUTILZAÇÕES, AF_022020		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PI ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, COMPENSADA RESINADA, B UTILIZAÇÕES, AF_O	LARES RETANGULARES E EM CHAPA DE MADEIRA 8/20/20		35.44	46,34	BDIT	58.01	953.65	12

M

Grau de Sigilo #PUBLICO

8D13

8DI 1 20,00%

MUNICIPIO / UIF PATO BRANCO - PR

APELIDO DO EMPREENDMENTO IGONISTRILÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL

PROPONENTE / TOMADOR MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL

DATA BASE 08-21 (N DES.) Nº SICONV 899217/2020

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

оѕиоэзи	+	88	9.A	8		- SE	\$	25	\$		88	I	\$	RA	FA
	Preço Total (RS)	564,22	2.996,39	516.94	07 60 7 60	2,778,14	1.174,61	4.447,85	1.306,71	A 778 57	4.775,07	14,213,36	1.447,60	8.042,45	605,92
	Preço Unitário (com BDI) (RS)	25,72	85. \$£.	453,46		51.79	23,72	20,63	414,83		75,04		7,00	38,89	2,83
	801 (%)	PDH 1	BDI1	BDI1		BDI 1	Fig.	FIQS	1108		- E		BD11	FIG9	BDI1
	Custo Unitario (sem BDI) (RS)	77,21	15,28	377.88		55,14	18,77	17,19	345,69		75.00		29,5	32,4 %	2,44
	Quantida de	24,63	163,38	1.14	7	42,00	49.52	215.60	3,15		82.83		206.80	206,80	205.80
	Unidade	KG	KG	MS		*	W.	Ϋ́	M3		M2		214	ZZ.	M
	Descrição BAHRIO AID LSTEIAL	ARINAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED FICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_122015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONCRETAGEN DE PILAPES, FGK 25 MPA, CCM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEGÃO MEDIA DE PILAMES MENOR OU IGIAAL A D.25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO. AF_122015	VIGACINTA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 3 UTILIZAÇÕES.	ARMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED PSCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO LITLIZANDO AÇO CA-50 DE 5.9 MM - MONTAGEM, AF_122015	ARMAÇÃO DE PILAR DU VIGA DE UNA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMUNA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8.0 MAJ - MONTAGEM. AF _ 122915	CONCRETAGEM DE VIGAS, FOK « 25 MPA. COM USO DE BICIMBA EM EDPIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE VIGAS MENOR OU IGUAL. A 0.25 M°. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURBDOS NA VERTICAL DE 18'A SYSTOM, IEDES SUSIA A LOGO, DE PAREDES COM AREA LÍCIDIDA MANOR OU IGUAL A BAF SEM PROS E ÁRGAMASSA DE ASSENTÂMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF DISCOIA	REVESTMENTOS	CHAPISCO APLÍCADO EN ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁCS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHÁDA, COM COLHER DE PEGREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETOVIERA 400L AF_OS/2014	EMBOÇO DU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128. PREPARO MECÁNICO CON BETONERA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 23 MM. AF 08/2014	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILIDO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08:2014
	Código ES FOHTMANO E	92775	92778	927.20		00.2	92775	77.726	003		87479		87894	87792	88485
	Item Fonte	SINAPI	SINAPI	SINAPI		Сотроядар	SINAPI	SINAPI	Composição		SPACE		SINAPI	SINIAPI	SINARI
	item Consormuente	1.42	1.4.3.	1.44.	1,50	13.1.	5.22	ži Ži	13.4.	3.6.		13.	17.1.	1.72	1.7.3.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (Com BDI) (RS) (RS) (RS) (RS) (RS) (RS) (RS) (RS	206.80 Lusto Unitario 801 Preço Un 206.80 i 6.559 BD1 1 15.06 ED1 1 15.06 BD1 1 15.06 BD1 1 15.06 BD1 1 15.07 BD1	206.80 (seem BD) (RS) (com BD) (rS) (rS) (rS) (rS) (rS) (rS) (rS) (rS	206.80 16.59 BD1 Preço Un 115.06 BD2 BD1 1 115.06 BD2 1 15.59 BD1 1 115.06 BD2 1 15.69 BD1 1 115.00 BD2 1 115.01 BD2 1 115.01 BD2 1 1 115.01	206.80 16.59 BD1 Preço Unitable (cent BD) (FS) (com BD) (com B	206.80 16.59 8D1 Preço Un 115.06 team BD0 (185) (Com BD) (Com B	206.80 16.59 BD1 Preço Unitario (com BD1) (75) (com BD1) (com	15.59 BDI 1 10.75 Com BDI 15.59 BDI 1 10.75 BD	801 Preço Un (com BU) 107.6 100.1 107.6 107.	BD11 107.6 BD11 107.6 BD11 1.7	801 Preço Un (com B00 B011 197.6 B011 1.07.6 B011 1.07.6 B011 1.07.6 B011 2 B011 4
Ouantidade (sem BD) (PS) 206.80 16.59 115.06 28.50 57.53 88.75 1124.20 115.81	206.80 16.59 20.50 116.81 1.124.20 115.81 116.81 11	Custo Unitário (sem BO) (RS) (16.59 88.75 88.75 89.71 115.61 117.61 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 6 6 6 712.55 6 71	Custo Unitario (16.59 (18.7) (18.5) (18.7) (18.7) (19.6) (19.7) (19.6) (Custo Unitario (sem BDI) (RS) (sem BDI) (sem B	Custo Uniterio (16.59 16.59 16.59 17.25 17	Custo Unitario (sem BOI) (RS) (16.59 88.75 88.75 88.75 88.75 88.75 88.76 88.712.55 88.77 8 85.76 9 9 1.484.59	Custo Unitário (sem BDI) (RS) (sem BDI) (sem B			
206,80 115,06 57,53 1,124,20 1,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1.48	1.44	1.44	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	115 88 115 115 115 115 115 115 115 115 1	1115 88 88 712 88 88 712 88 71
							288. (1) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	206.80 115.06 1.00 1.00 1.10 33.60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00	115,06 115,06 11,00 11,0	266,80 1,506 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
	MZ MZ MG	MS MS MS	W W W W W	W KS KS KS CN WS WS	MA ME NE	MA M				
	NU N					0	0.0	2000. 2000. 300. 300.	DOO.	DOCON. THAO THAO
105/MD/G, AGRAMMENTO POLLOC ESPESSION 7 CM, JUNITAS DE DILATAGNOTO POLLOC ESPESSIONA 7 CM, JUNITAS DE DILATAGNOTO POLLOC ESPESSIONA 7 CM, ALAMBRADO PARA CIADARA POLLESPORTIVA COM 11 CALVANIZADO (3° E 1 127 TELA DE ARAME CALVANZA POVO TERRA 15/27, SGAL E FERTE LL, ABASS-SCO DE CORNERE IL, SOSZIONA FERTE LL, ABASS-SCO DE CORNEREN, SOSZIONA FERTE LL, ABASS-SCO DE CORNEREN LL, ABASS-SCO DE										
	90									

W



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO 1071361-64	899217/2020	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CONSTRUC	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL	OLIESPORTIVA	IO BAIRRO	NDUSTRIAL		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CÓNSTRUÇÃO DE QUADRA PÓLIES PORTIVA NO BAIRRO INDLISTRIAL	MUNICIPIO / UF PA TO BRANCO - PR	UF CO - PR		8DI 1 20.00%	8D12 0.00%	BDI 3 0.90%	
-									OSHODBE
llem Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitario (sem BDI) (R\$)	8DI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	->
SINAPI	91927	CARDO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MAY, ANTI-CHAMA O, \$1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 122015	2	960,00	4,94	BDI 1	5.93	5.692,80	\$
SINAPIS	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF. ANTI-CI-MAM 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMANAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12281S	×	432.00	6.94	BDI 1	8,33	3.598,56	8
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 MAR; ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CRICUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	230,00	14,70	Figs	17,64	4.057,20	88
Composição	022	CANYA DE PASSAGEM LUZ TELEFONA, DE EMBUTPI, EM CHAPA DE AGO GALVANTADO, DMENSOES 20 X 20 X 12° CM PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - EORNEG IMENTO E INSTALAÇÃO	N _D	15,00	95,28	1108	114,34	1,715,10	25
Composição	021	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DÍMENSOES DE 0, 30 X 0,30 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25	5,00	88,74	BDI 1	105.49	532.45	\$
SINAPI	53552	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10:2020	Nn	3,00	52,65	BDI 1	53,18	10,00	2
SINAPI	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, ČORRENTE NOMINAL DE 26A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10:2020	N	1,00	97,11	BDI 1	14,15	14,15	RA
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10:2020	N S	2,00	84,93	BDI 1	101.92	203.84	A
SINAP	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ¼) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	M	350,00	7,41	BDI 1	8,89	3,111,50	S
SINAP	9765-8	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGAIXO, PEAD, DN 63 (Z') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	M	70,00	11,36	BDI 1	13,63	954,10	á
Composição	023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 63 IAM (27), APAFANTE, INSTALADO EM PAREDE - PORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO.	2	90'9	106,83	1108	128,20	769,20	RA
Composição	920	POSTE EN AÇO GALVANIZADO, CÓNIDO CONTÍNUO RETO, H-4,0M, TIPO ENGASTEDO COM LUMBRÍA LED GRÍNAME NTAL TOPO DE POSTE DE 60W IIP 69 - FORNEGMENTO E NISTA ACÁO.	N ₅	9.00	1.169,63	BDI 1	1.403,56	12.632,04	RA A
Composição	025	POSITE EM AÇO GALVANIZADO, CÓNICO CONTÍNUO RETO DOM GRUZETA, HASOM, TIPO ENGARIZADO COM REFLETORES DE 159W IP 86 -	N ₅	6,00	2.156,20	BDI 1	2.587.44	15.524,64	2
SINAFI	586965	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/2017	N	\$,00	55.78	BDI 1	56,94	55,94	25
SINAP	101862	CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALYANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_16/2020	3	\$.00	1.864.94	108	2,237,93	2,237,93	28
SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-8T 26 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F 12/2015	Nn	6,00	29,25	1 IGB	35.10	210.80	2
Compusição	920	PIELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 2001/1000M - ECENICHMENTO E MICTALACAO	NS.	1,00	46,94	BDI 1	56.33	55.38	\$

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

#PUBLICO	_	1—1	RECURSO	÷		88	2		á	異な		ä			
#PUBLICO		BDI3 0.00%		Preço Total (RS)	五本民 1987 38	150,26	988.02	70 007 45	71.521,60	8.465,85	15,477,28	16.477,28 RA			
_	NDUSTRIAL	8D12 0,00%		Preço Unitário (com BDI) (R\$)		160,26	968,02		63,62	16,78	•	16.477.28			
	D BAIRRO II	BDI 1 20,00%		108		1108	FIDS 1		1108	1108		BDI t			
	APELIDO DO EMPRERNDIMENTO. CONSTRUÇÃO DE CIJADRA POLLESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL			Custo Unitário (sem BOI) (R\$)		133,55	823,35		\$3,02	13,98		13.731,07			
	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE OLADRA POLI	UF CO - PR		Quantidade		1,00	1,00		1.124,20	504,52		1,00	deração indicada		
	APELIDO DO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR		Unidade		35	NS.		MZ	ML		Nn	ridade da Fe		
Orgamento Base para Licitação - OGU	PROPONENTE / TOMADOR MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUÁDRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL		Descrição	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIES PORTIVA NO BAIRRO INDÚSTRIAL.	TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL, TRILHO DIN, 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 45A - FORNEGRAENTO E INSTALAÇÃO. AF 10-2020	PINTURA DA GUADRA	APLICACAO DE TIVITA A BÁSE DE POLIUPETANO COM PROTEÇÃO UV SOBRE PROS (2 BENADOR) NOLLORO APLICAÇÃO DE SELADOR PRIMER PEDOM (1 DEMÁD), CATALISADOR E DILLIBRITE	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACACA, EM QUADRA POLIESPORTIVA, SOM DE LARGURA.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Para elaboração deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Indicada		
	Nº SICONV 899217/2020	DATA BASE 08-21 (N DES.)		Código	LIESPORTIVANO	027	028		020	031		629	Para elaboraçã		
	0	SINAPI		Fonte	O DE CHADRA PO	Composição	Composição	(4)	Composição	Сотрозіçãо		Сотрозіра	iais:		
	Nº OPERAÇÃO 1071361-64	LOCALIDADE SINAPI CURITIBA		them	CONSTRUÇÃ	1.12.16.	1.12.19.	1.13.	1.13.1.	1.13.2.	1,14,	1.14.1.	Encargos sociais:	Observações:	of annual day

M

16 de 16

U	CAIXA	4	PLE - PLA	NILHA DE	- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS	TO DE EVEN	TOS									Grau de Sigilo #PUBLICO	Sigilo
N° OPERAÇÃO 1071361-64	гаção -64	N° SICONV 899217/2020	PROPONEN MUNICÍPIO	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	NCO	APELIDO E CONSTRUC	APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	AENTO DRA POLIE	SPORTIVA	NOME D	A EMPRES	٨				Š	N° CTE
			Medição:	1	Período:	17/05/20	17/05/2022 a 15/07/2022	/2022	%	Realizado	% Realizado Período.: 8,12%	8,12%		% Reali	% Realizado Acum.:	n.: 8,12%	12%
			QUADRA POLIESP,														
op 。N			1 2	3 4	5 6	7 8 9	10 11	12	13 14	15 ′	16 17		19 20	21	22 23	3 24	2
Evento		Título dos Eventos			Inf	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos	NÚMERO DA	MEDIÇÃO	so anb ma	eventos f	oram conc	luídos					
-	Administração Local	Sal	A administraç	ão local será p	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.	cução dos dema	ais eventos, ir	ndependente	de frentes	de obra.							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	IMINARES	7														
ო	FUNDAÇÕES E V	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME	-														
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	AÇÃO	-														
2	PILARES																100
ဖ	VIGAS CINTA																100
7	ALVENARIA		-														
80	REVESTIMENTOS	S															
ത	PISOS																
10	ALAMBRADOS																
11	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO	DO ACESSO															
12	DRENAGEM		1														
13	ILUMINAÇÃO																
4	PINTURA DA QUADRA	ADRA															
15	ENTRADA DE ÁG	ENTRADA DE ÁGUA/ ENERGIA E REMOÇÃ															
16	DRENAGEM 2 (TI	DRENAGEM 2 (TUBOS/DISSIPADORES/CA															
17	REVESTIMENTO.	REVESTIMENTOS (FUNDO SELADOR E PI															
Handreshipping	Printificati Printificati (State) (spilk) (spilk) (spilk)		CONTRACTOR						ISHAN MANAGEMENT PROPERTY	Therefore many training legitlering	Water Parking Hells Hells Agent	ACTIVITIES RECORDERATE	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	uanimenspostración	memonastationes and memon	resonation and resonant	MUNICIPAL

		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM					Data das Medições	Medicoes					
		15/07/2022											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição
Doríodo.	%	8,12%	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	00'0
	R\$	4	1	1	1	-	-		1	ı		,	9
Aciminado.	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Acuillalano.	R\$	44.541,83	3	44.541,83	44.541,83	44.541,83	44.541,83	44.541,83	44.541.83 44.541,83	11	44.541,83	44.541,83	44.541,

1/1

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	N° SICONV				RECURSO
AUNICIPIO DE PATO BRANCO	1071361-64	899217/2020	VAL	ALORES CONTRATADOS (R\$	··	ogu
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF		REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO	STIMENTO	N° RRE
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL	PATO BRANCO - PR		257.800,00	290.487,46 548.2	48.287,46	1

Repasse (R\$) Contrapartida (R\$)

Saldo a Reprogramar

Percentual previsto em: jul-22 92,41%

Situação do TC/CR: Atrasada

	Execução Física Acum.	8,12%	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0			8,12%		
Control of the Contro	Acumulado incluindo o Período	44.541,83										(8,12%)	20.943,18	23.598,65		44.541,83
,	No Período	44.541,83							•			(8,12%)	20.943,18	23.598,65		44.541,83
values intentions (NA)	Acumulado Período Anterior											(%00'0)		•		
The second secon	BM / PLE Valor Total (R\$) n°	548.287,46		t								(100,00%)	257.800,00	290.487,46		548.287,46
0.00	BM/ PLE n°	-														0
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	Lote de Licitação / nº do CTEF	0										(%)	Repasse	Contrapartida	Outros	Investimento
	Unid.															
	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Situação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Descrição da Meta	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR														
	Meta	1.	2.	3.	4	5.	9		89	6	10.					

Observações:

ROBSON CANTU-44143664968 CANTU-441173564968 Dados: 2022.07.15 1733502-03'00' PATO BRANCO - PR Local

Representante Tomador
Nome: ROBSON CANTU
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social Nome: Cargo:

Responsável Financeiro Nome: MAURO SBARAIN SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Cargo:

vico pefe fiscalização FERNANDA ZIANNI MANARIM FOGENHEIRA CIVIL 107389/D 1720223700901

Profissão: CREA/CAU: ART/RRT: Nome:

sexta-feira, 15 de julho de 2022 Data

Responsável Téch

PMv3.0.4



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Construção de quadra poliesportiva no Bairro Industrial, com área de interferência de 1.312,83 m².

CONTRATO Nº 13/2022/GP

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção EIRELI.

Responsável: Rodrigo Pires Franco.

Página **1** de **7** 15/07/2022



Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





Aw .


Página 2 de 7





fu

Página **3** de **7**

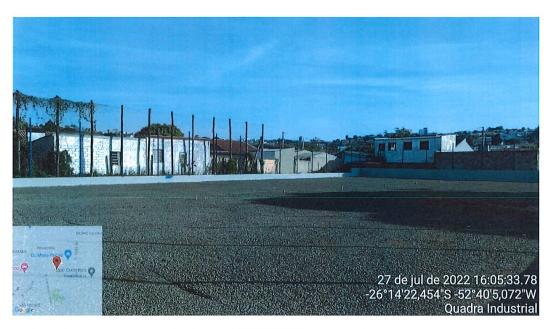



The state of the s

Página **4** de **7**





The





The state of the s



Conforme Cláusula do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de \mathbb{R} \$ 44.541,83.

Pato Branco, 15 de Julho de 2022.

Fernanda Zianni Manarim Engenheira Civil CREA-PR 107.389/D












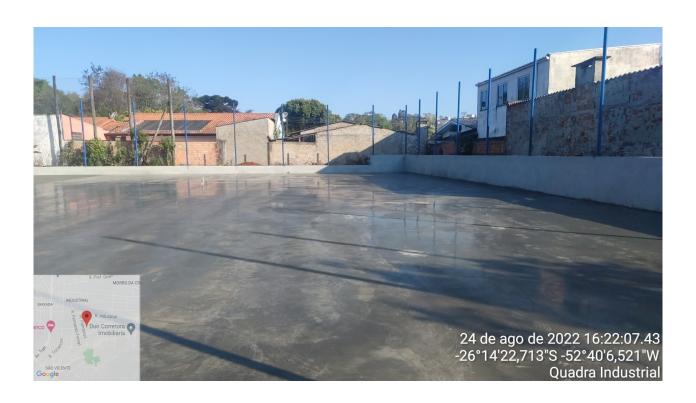



CAIXA		PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU	EVANTAMENT	O DE EVENT	so						Grau #PU	Grau de Sigilo #PUBLICO
N° OPERAÇÃO N° - 1071361-64 895	N° SICONV 899217/2020	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	NCO	APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA O	PREENDIMENT O DE QUADRA	ro POLIESPOR	NOME I	OA EMPRESA				N° CTEF 0
		Medição: 2	Período:	16/07/202:	16/07/2022 a 28/10/2022	72	% Realizad	% Realizado Período.:	91,88%	% Realiza	% Realizado Acum.: 100,00%	100,001
		JOLIESP,										
N° do Título dos Eventos	Eventos	1 2 3 4	5 6 7	7 8 9 10 41 12 13 14 15 16 17 18 Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluidos	10 11 MERO DA ME	12 13 DIÇÃO em qu	14 15 Le os eventos	16 17 foram concl	18 19 Jidos	20 21	22 23	24 25
1 Administração Local		A administração local será p	ração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.	ução dos demais	eventos, indep	endente de fre	entes de obra.					
П	RES											
3 FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME 4 IMPERMEARII 17ACÃO	BALDRAME											
		2		動力の対象を								
6 VIGAS CINTA		2										
ALVENARIA 8 REVESTIMENTOS		- 24										
Γ		2										
	00000	2										
11 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO 12 DEENAGEM	CESSO	× -										
T		2							STATE STATES			
Г		2										
15 ENTRADA DE ÁGUA/ ENERGIA E REMOÇÃ	ENERGIA E REMOÇÃ	2 5										
B	NDO SELADOR E PI	2		- Innumum	- Committee			- Innumum	-	manna		annum .
			September 2015 personal			Data das Medições	ledições					
		-	_	_			_					
	Medições	Medição 1	2 M	Σ	2	9	7	Medição 8	Medição 9	9	-	Medição 12
	Período:	% 8,12% R\$ 44,541.83	94,88% 0,00% 503.745.63 -	%00'0	%00.0	%00'0	%00°0	%00'0	%00'0	%00°0	- %00'0	%00'0
	Acumulado:	8,12%	100,00% 100,00% 548 287 45 548 287 46	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00% 100,00% 548,287,46/ 548,287,46	100,00%	100,00% 548.287.46	100,00%	100,00% 548.287.46
				1	-	-	\vee	Sh	1			
PATO BRANCO - PR						ΙŒ	Responsável 1	Responsável Tecnico pela Fiscalização	scalização		A	
						_	Nome:	-ERNANDA Z	FERNANDA ZIANNI MANARIM	SIM /		
sexta-feira, 28 de outubro de 2022	2						Profissão:	ENGENHEIRA CIVIL	CIVIL			
Data						, ,		1720223700901	7	\		

1/1

Responsável Financeiro Nome: MAURO SBARAIN Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

rod peta Fiscalização FERNANDA ZIANNI MANARIM ENGENHEIRA CIVIL 107389/D 1720223700901

Responsável Téch Nome: Profissão: CREA/CAU: ART/RRT:

sexta-feira, 28 de outubro de 20. Data

1/1

RRE - RELATÓRIO REŜUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

RECURSO		Nº RRE	2	
	VALORES CONTRATADOS (RS).	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº	0 290.487.46 548.287.46	
	Т	REPASSE	257.800.00	
N° SICONV	899217/2020			
Nº OPERAÇÃO	1071361-64	IMINICÍPIO / IJE	PA CONSTRUCTION	N I PONNO DIVI
INDUCATION (TOMANDO	PROPOSITION OF DATO BRANCO	MONIORI DE LA COMPANIORI DE LA COMPANIOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL

		Acriminal Evacinean		Período Acum.	548.287,46 100,00%	%00'0	%00'0 -	%00'0	0.00%	%00.0	%00 0	/800 0	%00°0	%00'0	%00'0	(100,00%)	257.800,00	290.487,46 100,00%		548.287,46	Acrimitado Anterior: 8.12%
(av) por indention	S		No Período		503.745.63											(91,88%)	236.856,82	266.888,81	•	503.745,63	
(ev) accedav	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	Periodo Anterior	44.541.83								1			(8,12%)	20.943,18	23.598,65		44.541.83	The second secon
Saldo a Reprogramar			Valor Total (R\$)		548 287 46	0107070										(100:00%)	257.800.00	290.487,46		548 287 46	
			BM/	9	,	4										New Control Control		a		c.	
Percentual previsto em: out-22 92,41%			Lote de Licitação /	n° do CTEF	c											(%)	Renasse	Contrapartida	Outros	Invoctimento	
Percer out-22			712	5																	
o TC/CR:			0	Guannagae			0	0	0	0	0	0	c			0					
Situação do TC/CR: Adiantada				Situação		0	0	0	0	0	0	c		0	0	0					
8				Descrição da Meta		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR															

Observações:

ROBSON
ROBSON CANTU-44143664968
CANTU-44143664968 Dados: 2022.11.08 11:40:20-031 PATO BRANCO - PR Local

Representante Tomador Nome: ROBSON CANTU Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social Nome: Cargo:

PMv3.0.4



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Construção de quadra poliesportiva no Bairro Industrial, com área de interferência de 1.312,83 m².

CONTRATO Nº 13/2022/GP

Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção EIRELI.

Responsável: Rodrigo Pires Franco.

Página **1** de **8** 15/07/2022



Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:




















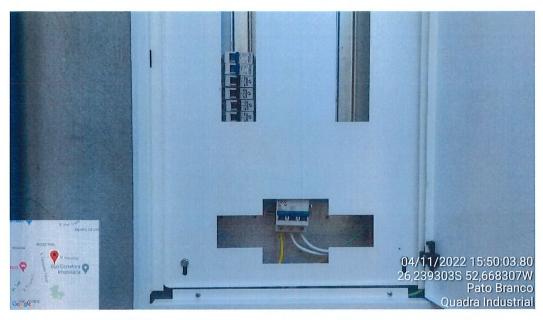











 \bigcirc









Conforme Cláusula do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de R\$ 503.745,63.

Pato Branco, 28 de Outubro de 2022.

Fernanda Zianni Manarim Engenheira Civil CREA-PR 107.389/D







Créditos: Município de Pato Branco







Créditos: Município de Pato Branco



Créditos: Município de Pato Branco

