

BOLETIM DE MEDIÇÃO	
Abrigos de Passageiros	
Data da Ata de Registro de Preços: 18/04/2023	Nº da ATA 120/2023
Contratada: NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 41.171.531/0001-24
Nº do Empenho 1602/2024	
Data de envio do empenho/ordem de serviço: 16/02/2024	Período da Medição 16/02/2024 a 10/05/2024
Objeto: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.	
Localização: R Industrial, 1 77, B Industrial / R Santa Fé, 149, B Industrial / R Dr Francisco Beltrão, 1083, B Industrial / R Anchieta, 769, B São Vicente / R Altamira, 930, B Bonatto / R Willbat, 43, B Morumbi / R Lupicinio Rodrigues, 160, B Morumbi / R Lupicinio Rodrigues, 649, B Morumbi / R Marília, 843, B São Roque / R Terezinha Duarte, sn, São Roque / R Ivai, 1250, B Jardim Floresta / R Ivai, 1053, B Jardim Floresta / R Ivai, 1580, B Jardim Floresta / R Ivai, 677, B Pinheirinho / R Xavier, 146, B Pinheirinho / R Amamai, 275, B Pinheirinho / R Iguatemi, 202, B Pinheirinho.	Valor do empenho: R\$185.691,00(cento e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e um reais)

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Total Medição 01	Valor total (R\$)
01	17	Abrigo de ônibus - dimensão aproximada 3100 MM X 1700 MM X 2500 MM Estrutura: Os pilares da fachada posterior serão em perfil tubular 150x50 (mm) com espessura 2,25mm, com pintura esmalte cinza escuro e fundo anticorrosivo. Os pilares da fachada frontal serão em perfil tubular 100x50 (mm) com espessura de 2,0mm, com pintura esmalte vermelha e fundo anticorrosivo. As vigas de cobertura serão em perfil tubular 150x50 (mm) com espessura 2,25 mm, com pintura esmalte cinza escuro e fundo anticorrosivo. Vidros: Os vidros deverão ser temperados 10 mm de espessura fixos em caixilhos de alumínio cinza escuro fixados na estrutura metálica. Telhamento e Revestimento em ACM na platibanda: A cobertura deverá ser em telha trapezoidal metálica termoacústica e = 30 mm, com pintura no lado inferior na cor branca e calha na traseira da cobertura. A platibanda será em placa de ACM na cor cinza escura com estrutura metálica. Revestimento de madeira: As vigas de cobertura (exceto as vigas de extremidade) serão revestidas em madeira de 1ª qualidade cor imbuia, espessura 18mm, com acabamento em verniz semi brilho. Bancos: Os assentos serão em perfil de chapa 1/8", tubo redondo 3" na traseira, encostos e assentos em chapa perfurada 1,5mm (#16) com divisões entre os assentos em tubo redondo 3/4"x1,5mm	10.923,00	17	185.691,00

Pato Branco, 10 de maio de 2024.

*Fabricio da Silva*

Fabricio Correia da Silva  
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização



MUNICÍPIO DE

**PATO BRANCO**

Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pató Branco • PR  
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.

**Empenho Nº 1602/2024 – 17 abrigos de Passageiros:**R Industrial, 177, B Industrial / R Santa Fé, 149, B Industrial / R Dr Francisco Beltrão, 1083, B Industrial / R Anchieta, 769, B São Vicente / R Altamira, 930, B Bonatto / R Willbat, 43, B Morumbi / R Lupicinio Rodrigues, 160, B Morumbi / R Lupicinio Rodrigues, 649, B Morumbi / R Marília, 843, B São Roque / R Terezinha Duarte, sn, São Roque / R Ivai, 1250, B Jardim Floresta / R Ivai, 1053, B Jardim Floresta / R Ivai, 1580, B Jardim Floresta / R Ivai, 677, B Pinheirinho / R Xavier, 146, B Pinheirinho / R Amamai, 275, B Pinheirinho / R Iguatemi, 202, B Pinheirinho.

## **ATA de Registro de Preços de Nº 120/2023**

### **Relatório de Medição nº 01**

Empresa Contratada: **NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Responsável: **Matheus Henrique Neves da Silva**

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:



Rua Industrial, nº 177 - Bairro Industrial.



Rua Santa Fé, nº 149 - Bairro Industrial.



Rua Dr Francisco Beltrão, nº 1083 - Bairro Industrial.



Rua Anchieta, nº 769 - Bairro São Vicente.



Rua Altamira, nº 930 - Bairro Bonatto.



Rua Willibat, nº 43 - Bairro Morumbi.



Rua Lupicínio Rodrigues, nº 160 - Bairro Morumbi.



Rua Lupicínio Rodrigues, nº 649 - Bairro Morumbi.



Rua Marília, nº 843 - Bairro São Roque.



Rua Terezinha Duarte, nº S/N - Bairro São Roque.



Rua Ivai, nº 1580 - Bairro Jardim Floresta.



Rua Ivai, nº 1250 - Bairro Jardim Floresta.






Rua Ivai, nº 1053 - Bairro Jardim Floresta.



Rua Ivai, nº 677 - Bairro Pinheirinho.



Rua Xavier, nº 146 - Bairro Pinheirinho.

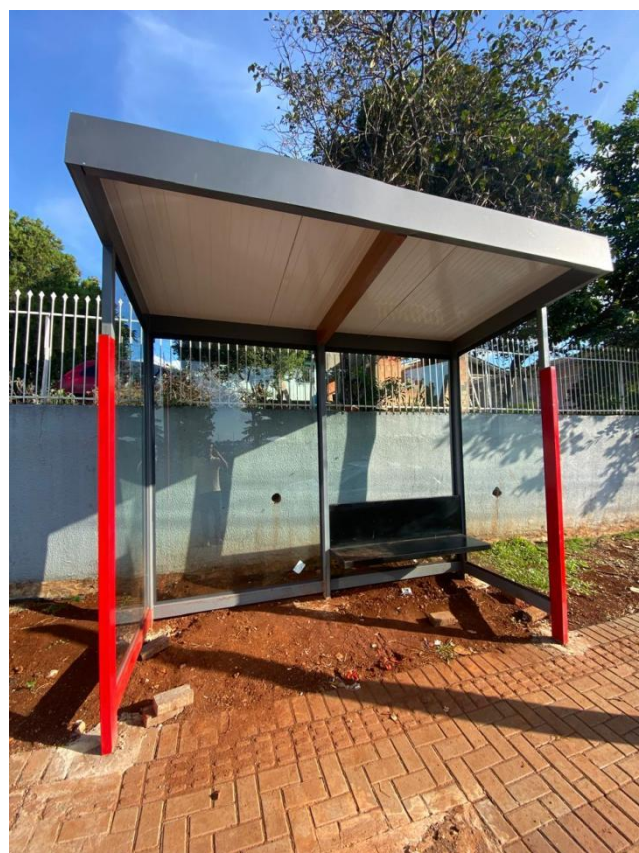

Rua Amambai, nº 275 - Bairro Pinheirinho.



Rua Iguatemi, nº 202 - Bairro Pinheirinho.

Conforme ATA, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, a Contratada se obriga a substituir os bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação da Contratada, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, em um **prazo máximo de 10 (dez) dias**.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados no valor de **R\$ 185.691,00**.

Pato Branco, 10 de maio de 2024.

Fabricio Correia da Silva  
Chefe do Setor de Transporte Coletivo
