



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:		PATO BRANCO	Mês	Abr	REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO Amsop
SUBPROJETO:		PRAÇA - Parque do Som	SAM	74	PARCELA 1ª	DATA 11/04/2024 - qui
FIRMA EMPREITEIRA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
			Ano	2024	Nº 19/2024	Nº
					DATA: 09/02/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,25	80,00%	0,0273	2,18%	73,50	6.306,30	7.882,88	1.576,58
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-				-	-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	100,00%	0,0536	5,36%	154,65	15.465,00	15.465,00	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	33,33%	0,0323	1,08%	1.554,47	3.108,63	9.326,82	6.218,19
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	774,12	100,00%	0,0012	0,12%	0,46	356,10	356,10	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37,00	100,00%	0,0025	0,25%	19,66	727,41	727,41	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104,00	100,00%	0,0025	0,25%	6,82	709,28	709,28	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTÊXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	275,46		0,0094		9,89	-	2.724,30	2.724,30
3	4		ESTRUTURAS							-	-	-
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9,64		0,0039		116,76	-	1.125,57	1.125,57
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00		0,0201		17,33	-	5.805,55	5.805,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Abr	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	SAM	74	PARCELA	1ª	DATA	11/04/2024 - qui
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3	CONTRATO EMPREITADA:	Nº	19/2024	ORDEM DE SERVIÇO:
		Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
91835		SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0026	0,26%	15,22	761,00	761,00	-
91847		SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00		0,0069		19,81	-	1.981,00	1.981,00
8.2.3.2			ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	-
91871		SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00		0,0002		18,74	-	56,22	56,22
91872		SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00		0,0004		24,62	-	123,10	123,10
8.2.5			CABOS		-				-	-	-	-
8.2.5.1			ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
91926		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00		0,0083		4,80	-	2.400,00	2.400,00
91932		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00		0,0028		17,82	-	801,90	801,90
8.2.8			CAIXAS		-				-	-	-	-
97881		SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,0004		117,36	-	117,36	117,36
8.2.9			QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
101879		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0029		830,06	-	830,06	830,06
8.2.11			DISJUNTORES		-				-	-	-	-
8.2.11.1			MONOPOLARES		-				-	-	-	-
93655		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0001		15,52	-	15,52	15,52
8.2.11.2			BIPOLARES		-				-	-	-	-
93662		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		68,26	-	68,26	68,26
93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,0006		84,67	-	169,34	169,34
8.2.21			REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
101632		SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0002		46,98	-	46,98	46,98
x			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
16.105.0000	PINI - fev/23		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,0094	0,94%	2.720,52	2.720,52	2.720,52	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

		Mês	Abr	REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO Amsop
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	PARCELA 1ª	DATA 11/04/2024 - qui
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	Lote	3	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	Nº 19/2024	Nº
				DATA: 09/02/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,00	10,00%	0,0022	0,02%	107,89	64,73	647,34	582,61
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4,50	10,00%	0,0010	0,01%	65,42	29,44	294,39	264,95
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0007		207,93	-	207,93	207,93
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00		0,0063		130,54	-	1.827,56	1.827,56
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00		0,0966		2.145,38	-	27.889,94	27.889,94
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRACA PARQUE DO SOM	UNID	1,00		0,0049		1.403,23	-	1.403,23	1.403,23
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00		0,0022		52,56	-	630,72	630,72
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA						-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	166,29	166,29	166,29	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		0,0004		102,65	-	102,65	102,65
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA						-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO						-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,65		0,0005		15,52	-	149,77	149,77
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA						-	-	-	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00		0,0001		11,84	-	35,52	35,52
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00		0,0001		16,29	-	32,58	32,58
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,65		0,0003		45,33	-	74,79	74,79
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						-	-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00		0,0009		31,62	-	252,96	252,96
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0001		30,70	-	30,70	30,70
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS						-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

		Mês	Abr	REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO Amsop
				PARCELA 1ª	DATA 11/04/2024 - qui
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	Lote	3	Nº 19/2024	Nº
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA: 09/02/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0032		912,16	-	912,16	912,16
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150,54		0,0351		67,37	-	10.141,88	10.141,88
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,02		0,0186		73,55	-	5.370,62	5.370,62
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275,46		0,1039		108,85	-	29.983,82	29.983,82
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483,46		0,0047		2,82	-	1.363,36	1.363,36
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94,00		0,0159		48,87	-	4.593,78	4.593,78
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16,00		0,0062		111,62	-	1.785,92	1.785,92
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	296,97		0,0150		14,60	-	4.335,76	4.335,76
	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	95,78	95,78	95,78	-
	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	84,53	84,53	84,53	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	13,77		0,0058		121,31	-	1.670,44	1.670,44
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	179,05		0,0136		21,89	-	3.919,40	3.919,40
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00		0,0018		522,79	-	522,79	522,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO Amsop	
Mês	Abr	PARCELA 1ª	DATA 11/04/2024 - qui
SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
Lote	3	Nº 19/2024	Nº
Ano	2024	DATA: 09/02/2024	DATA

MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0085		2.457,72	-	2.457,72	2.457,72
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0098		2.840,72	-	2.840,72	2.840,72
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTÍNUO EM "S" (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E ELIMINAÇÃO	M	19,29	81,64%	0,1113	9,09%	1.665,44	26.227,94	32.126,34	5.898,40
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	34,98%	0,0453	1,58%	2.177,76	4.570,68	13.066,56	8.495,88
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	UNID	1,00	11,00%	0,2802	3,08%	80.889,71	8.897,87	80.889,71	71.991,84
8	12		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1		LIMPEZA		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	399,02		0,0034		2,47	-	985,58	985,58
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-

GLOBAL - LOTE 1				% PREVISTO	25,21%	% EXECUTADO :	25,58%	SOMAS	73.836,49	288.652,40	214.815,91
-----------------	--	--	--	------------	--------	---------------	--------	-------	-----------	------------	------------

OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$288.652,40
								Medição Acumulada:	73.836,49
								Total Anterior:	-
								Valor Desta Medição:	R\$73.836,49

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de
Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

Jorge Eduardo Chioqueta
Município de Pato Branco
Jorge Eduardo Chioqueta
Engenheiro Civil Crea PR-125.425/D
Port. 402/2013 de 26/04/2013

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

PROJETO/LOTE: Nº 74 / LOTE 03

PROGRAMA: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

**CONTRATADA: MÁRCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

CONTRATO Nº 19/2024

OBJETO

Revitalização da Praça Parque do Som, na Rua Araribóia, Lote 01 – Quadra 1174 – Bairro Parque do Som. Contendo: área de convivência, pergolado e áreas de jogos e paisagismo. Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações, estruturas, instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimento de paredes e piso, impermeabilizações, pinturas e argamassa, pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto.

MEDIÇÃO Nº 01

DATA DA VISTORIA: 11/04/2024

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 09/02/2024 até 11/04/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS (mínimo 08 fotos neste relatório, as demais fotos devem estar no Portal dos Municípios - Fotos - Mínimo 8 em formato jpg)


Rua Ararigóia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br




F1: PLACA DA OBRA ATUALIZADA (FOTO OBRIGATÓRIA)



F2: DETALHE DA PLACA DA OBRA (QRcode) (FOTO OBRIGATÓRIA)

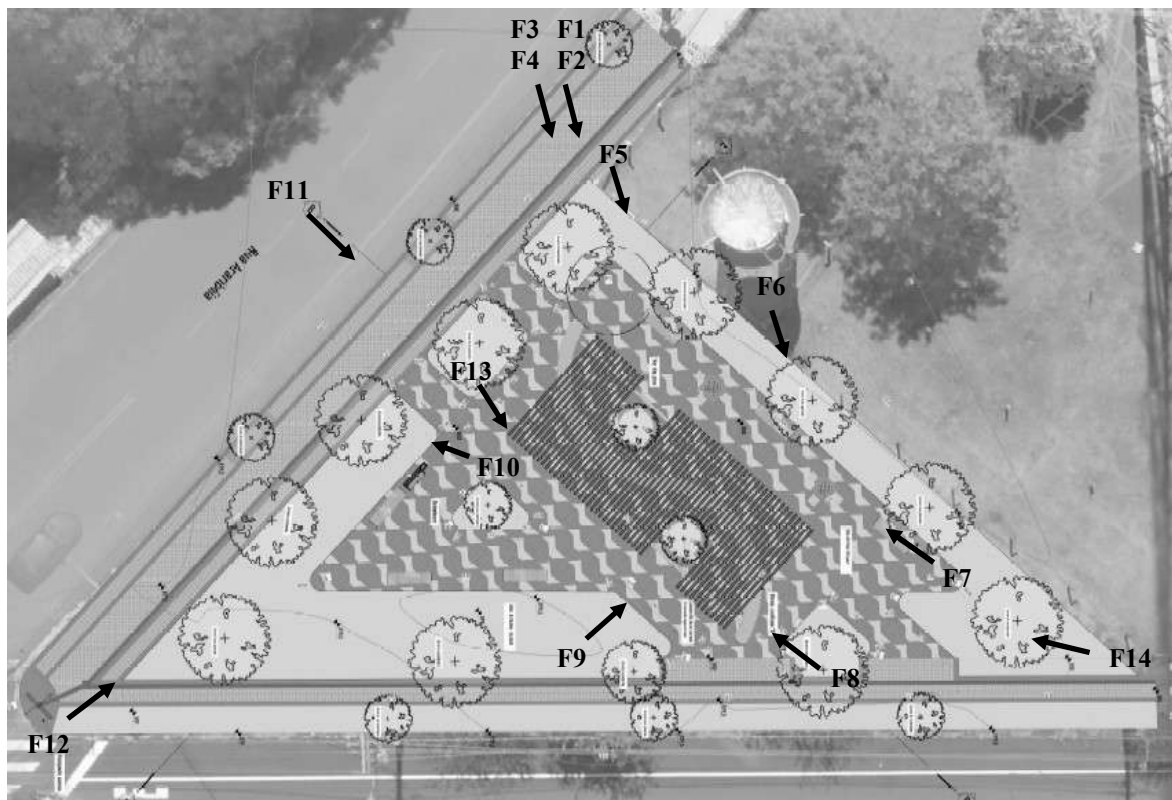

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS

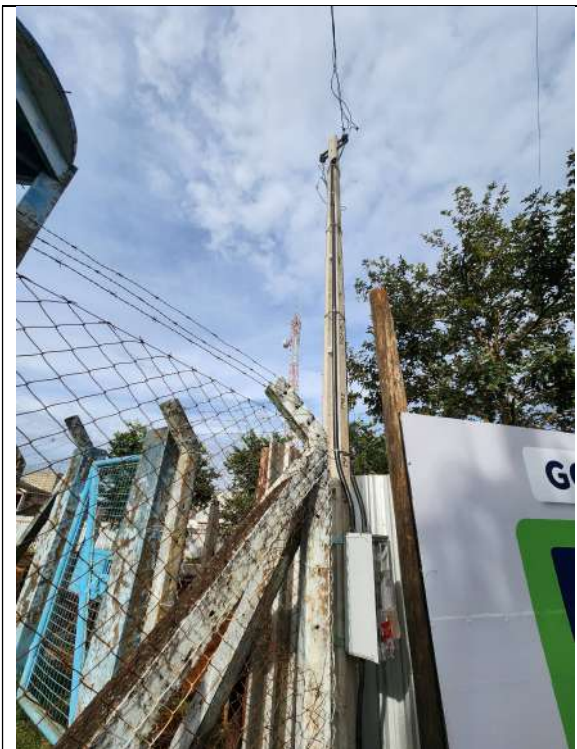

F3: POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA



F4: MEDIDOR DE ENTRADA DE ENERGIA



F5: BANCO EM FORMATO DE S, ESTRUTURA DO PERGOLADO



F6: MONTAGEM DOS BANCOS DE CONCRETO



F7: MONTAGEM DOS BANCOS DE CONCRETO



F8: BANCO DE CONCRETO EM S



F9: BANCO EM FORMATO DE S, ESTRUTURA DO PERGOLADO



F10: ENTRADA DE ÁGUA, CONTAINER



F11: PLACA DE OBRA, TAPUME



F12: TAPUME



F13: ELETRODUTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



F14: FOTO PANORÂMICA

Pato Branco, 11 de abril de 2024.

JORGE EDUARDO
CHIOQUETA:05149671
967

Assinado de forma digital por
JORGE EDUARDO
CHIOQUETA:05149671967
Dados: 2024.04.15 11:19:23 -03'00'

Assinado eletronicamente

Jorge Eduardo Chioqueta
CREA-PR 125.426/D
ART de fiscalização: 1720241337961
