



PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS	16/01/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
194/2023	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	12.244.460/0001-44	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		19/03/2024 a 15/04/2024
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 93,82%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS					TOTAL:	3.430.684,51	55,49	38,33	93,82	1.903.602,08	1.314.897,84	3.218.499,92
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO				3.430.684,51	55,49	38,33	93,82	1.903.602,08	1.314.897,84	3.218.499,92	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				16.256,64	60,00	40,00	100,00	9.753,98	6.502,66	16.256,64	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				16.256,64	60,00	40,00	100,00	9.753,98	6.502,66	16.256,64	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				235.547,42	17,57	14,18	31,76	41.394,60	33.405,90	74.800,50	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)				4.508,52	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019				151.727,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				4.511,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				74.800,50	55,34	44,66	100,00	41.394,60	33.405,90	74.800,50	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				3.112.327,69	59,52	38,83	98,35	1.852.453,50	1.208.436,52	3.060.890,02	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30				74.944,59	27,36	4,01	31,37	20.504,84	3.002,08	23.506,92	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C				131.205,22	64,32	35,68	100,00	84.391,20	46.814,02	131.205,22	
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				2.742.879,26	59,65	40,35	100,00	1.636.127,48	1.106.751,78	2.742.879,26	
1.3.4.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020				16.927,43	59,65	40,35	100,00	10.097,21	6.830,22	16.927,43	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				146.371,19	69,23	30,77	100,00	101.332,77	45.038,42	146.371,19	
1.4.	SINALIZAÇÃO				66.552,76	-	100,00	100,00	-	66.552,76	66.552,76	
1.4.1.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO				28.983,58	-	100,00	100,00	-	28.983,58	28.983,58	
1.4.2.	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA				6.349,64	-	100,00	100,00	-	6.349,64	6.349,64	
1.4.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				31.219,54	-	100,00	100,00	-	31.219,54	31.219,54	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR

Local

segunda-feira, 15 de abril de 2024

Data

ANDERSON
CACERES

FARIAS

ROSSATTO:066
18906946

Assinado de forma digital por ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO:06618906946
Dados: 2024.04.29 10:17:11 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANDERSON ROSSATTO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-124.502/D
ART/RRT: 1720240384990

Recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico e pavimento asfáltico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Maria Daminelli Marini Travessa Ademar Cantu no Parque Industrial Eduardo Daggios, com área de 11.078,00m², nas Ruas A, B e C do Parque Industrial CETIS, com área de 3.603,00m² e nas Ruas Getúlio Dal Pasqualle, Ulisses Viganó, Pedro Detoni e Avenida Piacentini no Parque Industrial Theófilo Petrycoski, com área de 13.524,00m², totalizando uma área de 28.205,00m².

CONTRATO Nº 194/2023/GP

Relatório de Medição nº 2 e Aditivo

DATA: 15/04/2024

Empresa Contratada: **VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Responsável: Guilherme Elias Piassa CREA-PR 86.745/D
ART Nº 1720240461936

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2ª medição (FINAL) do contrato e medição do Aditivo, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens nas planilhas de medição em anexo.

Seguem fotos da obra:



Foto 01: Reforço de Base Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.



Foto 02: Reperfilagem Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.

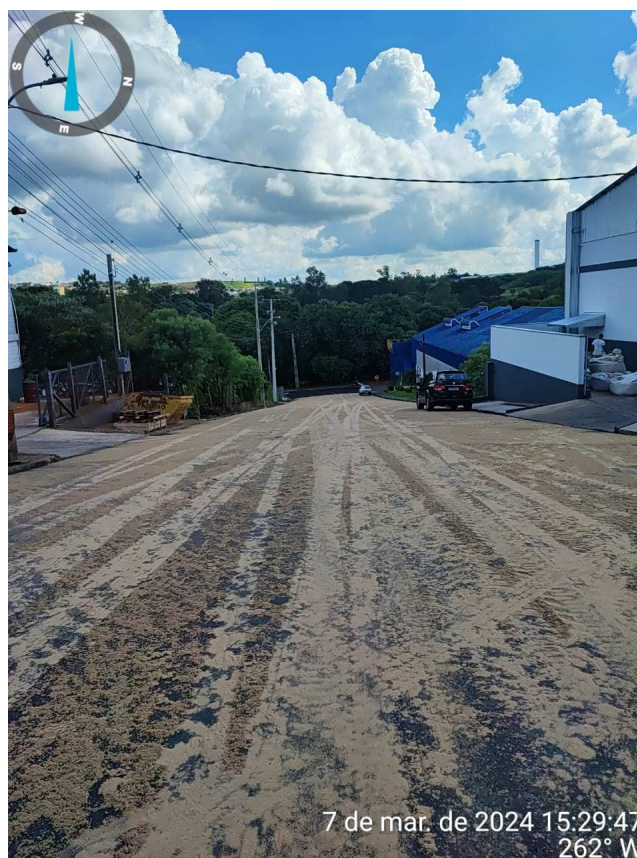


Foto 03: Execução de CBUQ Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 2.



Foto 04: Execução de CBUQ Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 05: Reperfilagem Rua Ulisses Viganó.



Foto 06: Execução de CBUQ Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.



Foto 07: Reperfilagem Rua Ulisses Viganó.



Foto 08: Execução de CBUQ Rua Ulisses Viganó.



Foto 09: Execução de CBUQ Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 10: Execução de Base Rua Pedro Detoni Trecho 2.



Foto 11: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 1.



Foto 12: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 1.



Foto 13: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 2.



Foto 14: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 2.



Foto 15: Extração de Corpo de Prova Rua Ulisses Viganó.



Foto 15: Extração de Corpo de Prova Rua Ulisses Viganó.

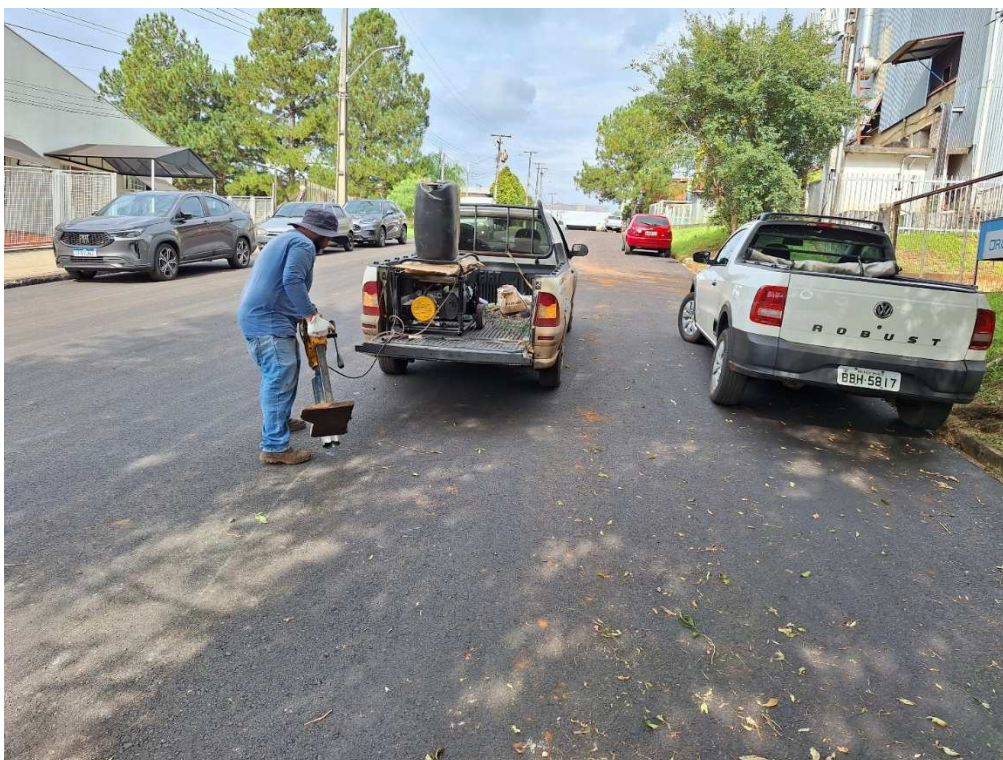


Foto 17: Extração de Corpo de Prova Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 18: Extração de Corpo de Prova Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 19: Execução de CBUQ Rua Pedro Detoni Trecho 2.



Foto 20: Sinalização Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 21: Sinalização Travessa Ademar Cantu.

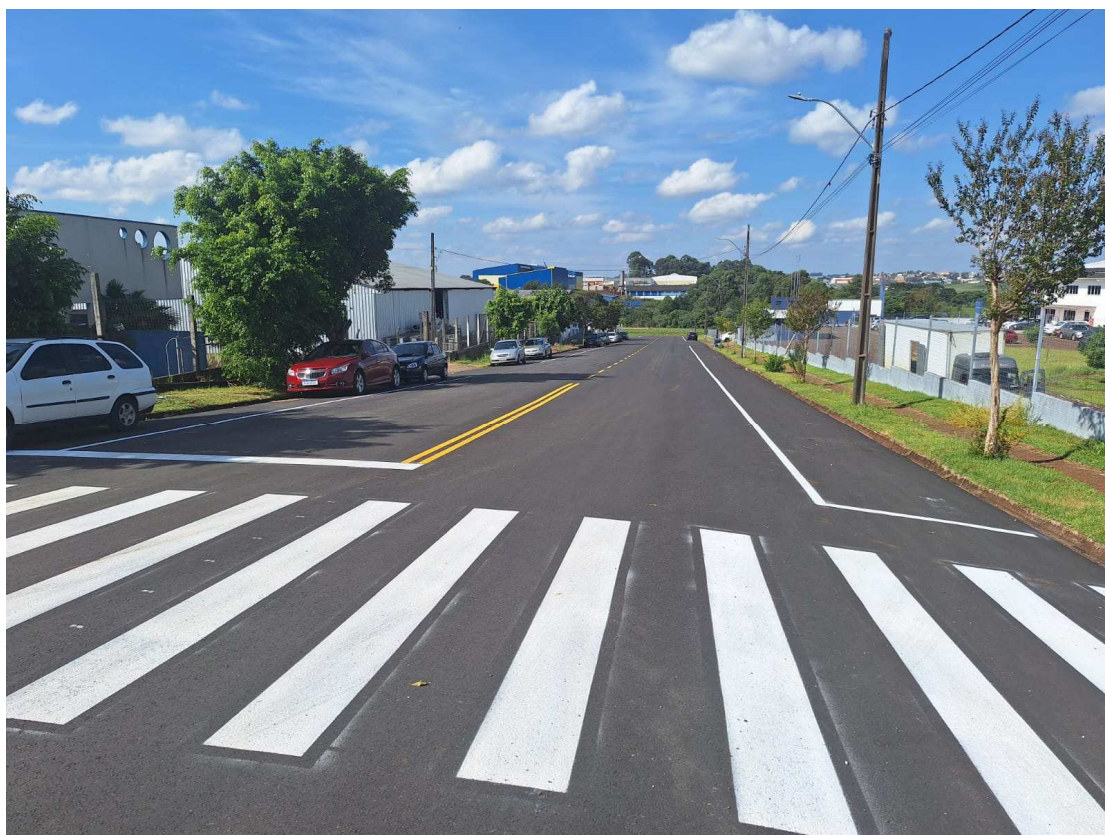


Foto 22: Sinalização Rua Maria Daminelli Marini.

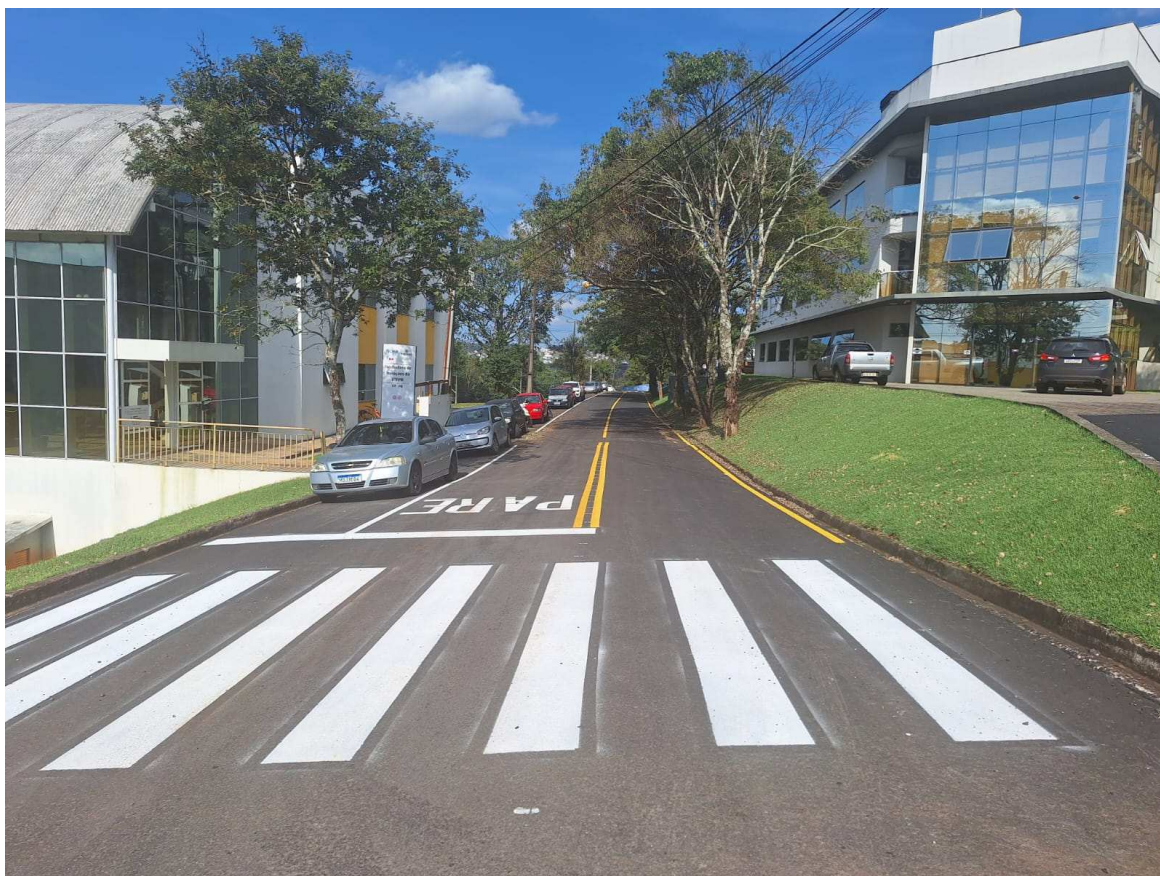


Foto 23: Sinalização Rua A.



Foto 24: Sinalização Rua B.



Foto 25: Sinalização Rua C.



Foto 26: Sinalização Rua Pedro Detoni Trecho 2.



Foto 27: Sinalização Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 28: Sinalização Rua Ulisses Viganó.



Foto 29: Sinalização Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.



Foto 30: Sinalização Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 31: Sinalização Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 2.

Conforme a Cláusula Décima Primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II- Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

O laudo de controle tecnológico da massa asfáltica empregada e sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART 1720241276350) estão arquivados em formato digital na pasta da obra no diretório “Z:” na Secretaria de Engenharia e Obras.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando o percentual dos serviços executados, totalizando o valor de **R\$ 1.314.897,84**, do valor total licitado, será glosado de forma definitiva o valor de R\$ 212.184.59.

Também em anexo, segue cópia do Boletim de Medição referente a serviços aditados ao contrato, demonstrando o percentual dos serviços executados, totalizando o valor de **R\$129.732,26**.

Pato Branco, 15 de abril de 2024.

ANDERSON	Assinado de forma
CACERES FARIAS	digital por ANDERSON
ROSSATTO:0661	CACERES FARIAS
8906946	ROSSATTO:0661890694
	6
	Dados: 2024.04.29
	11:59:02 -03'00'

ANDERSON ROSSATTO
CREA-PR 124.502/D
ART DE FISCALIZAÇÃO 1720240384990
