

BOLETIM DE MEDIÇÃO	
Abrigos de Passageiros	
Data da Ata de Registro de Preços: 18/04/2023	Nº da ATA 120/2023
Contratada: NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 41.171.531/0001-24
Nº do Empenho 3168/2024	
Data de envio do empenho/ordem de serviço: 16/02/2024	Período da Medição 19/03/2024 a 24/07/2024
Objeto: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.	
Localização: R Ambrosio Bez 105, B São Luiz / R Papa Joao XXIII, 1183, B São Cristovão / R Papa Joao XXIII, 1577, B São Cristovão / R Papa Joao XXIII, 971, B São Cristovão / R Marilia, 361, B São Roque/ R Saul Vigano, 1160, B Aeroporto / R Jose Leonardi, 194, B Aeroporto / R Taubate, 210, B Sao Roque / R Alexandre Gusmao, 923, B Sao Cristovao / R Luiz Xavier, 1378, B Sao Cristovao / R Luiz Xavier, em frente escola, B Sao Cristovao / R da Hortencias, 36, B Novo Horizonte / R dos Geranios, 360, B Novo Horizonte / R Bento Golçalves, 1218, B Novo Horizonte / R Bento Golçalves, 498, B Novo Horizonte / R Bento Golçalves, 712, B Novo Horizonte.	Valor do empenho: R\$174.768,00(cento e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais).

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Total Medição 01	Valor total (R\$)
01	16	Abrigo de ônibus - dimensão aproximada 3100 MM X 1700 MM X 2500 MM Estrutura: Os pilares da fachada posterior serão em perfil tubular 150x50 (mm) com espessura 2,25mm, com pintura esmalte cinza escuro e fundo anticorrosivo. Os pilares da fachada frontal serão em perfil tubular 100x50 (mm) com espessura de 2,0mm, com pintura esmalte vermelha e fundo anticorrosivo. As vigas de cobertura serão em perfil tubular 150x50 (mm) com espessura 2,25 mm, com pintura esmalte cinza escuro e fundo anticorrosivo. Vidros: Os vidros deverão ser temperados 10 mm de espessura fixos em caixilhos de alumínio cinza escuro fixados na estrutura metálica. Telhamento e Revestimento em ACM na platibanda: A cobertura deverá ser em telha trapezoidal metálica termoacústica e = 30 mm, com pintura no lado inferior na cor branca e calha na traseira da cobertura. A platibanda será em placa de ACM na cor cinza escura com estrutura metálica. Revestimento de madeira: As vigas de cobertura (exceto as vigas de extremidade) serão revestidas em madeira de 1ª qualidade cor imbuia, espessura 18mm, com acabamento em verniz semi brilho. Bancos: Os assentos serão em perfil de chapa 1/8", tubo redondo 3" na traseira, encostos e assentos em chapa perfurada 1,5mm (#16) com divisões entre os assentos em tubo redondo 3/4"x1,5mm	10.923,00	1	174.768,00

Pato Branco, 24 de julho de 2024.

*Fabricio da Silva*

Fabricio Correia da Silva  
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização



Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.

**Empenho N° 3168/2024 – 16 abrigos de Passageiros:** R Ambrosio Bez 105, B São Luiz / R Papa Joao XXIII, 1183, B São Cristovão / R Papa Joao XXIII, 1577, B São Cristovão / R Papa Joao XXIII, 971, B São Cristovão /R Marilia, 361, B São Roque/ R Saul Vigano, 1160, B Aeroporto / R Jose Leonardi, 194, B Aeroporto / R Taubate, 210, B Sao Roque / R Alexandre Gusmao, 923, B Sao Cristovao / R Luiz Xavier, 1378, B Sao Cristovao / R Luiz Xavier, em frente escola, B Sao Cristovao / R da Hortencias, 36, B Novo Horizonte / R dos Geranios, 360, B Novo Horizonte / R Bento Golçalves, 1218, B Novo Horizonte / R Bento Golçalves, 498, B Novo Horizonte / R Bento Golçalves, 712, B Novo Horizonte.

## **ATA de Registro de Preços de N° 120/2023**

### **Relatório de Medição n° 01**

Empresa Contratada: **NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Responsável: **Matheus Henrique Neves da Silva**

---


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:



Rua Luiz Xavier - Frente escola - B São Cristovao



Rua Luiz Xavier, nº 137 - B São Cristovao

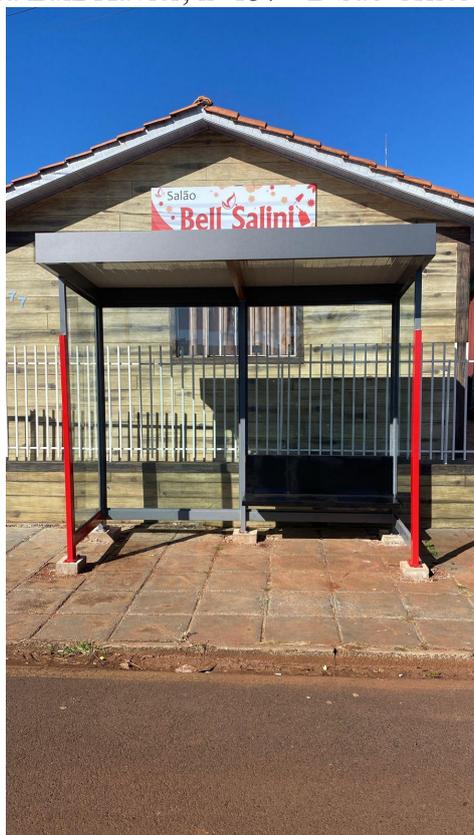

Rua Papa Joao XXIII, nº 1577 - B Sao Cristovao



Rua Papa Joao XXIII nº 1183 - B São Cristovao



Rua Papa Joao XXIII nº 971 - B São Cristovao



Rua Taubaté nº 210 - B sao roque



Rua Marília nº 361 - B Sao Roque



Rua Ambrosio Bez, 105 - B Sao Luiz



Rua Jose Leonardi nª 194 - B Aeroporto



Rua Saul Viagano - nº 1160 - B Aeroporto



Rua das Hortencias nº 36 - B Novo Horizonte



Rua Bento Golçalves nº 712 - B Novo Horizonte



Rua Bento Golçalves nº 498 - B Novo Horizonte



Rua Bento Golçalves nº 1218 - B Novo Horizonte



Rua dos Gerânios nº 360 - B Novo Horizonte



Rua Alexandre Gusmao nº 923 - B Sao cristovao

Conforme ATA, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, a Contratada se obriga a substituir os bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação da Contratada, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. A Contratada deverá reparar corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, em um **prazo máximo de 10 (dez) dias**.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados no valor de **R\$ 174.768,00**.

Pato Branco, 24 de julho de 2024.

Fabricio Correia da Silva  
Chefe do Setor de Transporte Coletivo
