

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 36.130,22M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 23/2024	150	26/03/2024	R\$ 4.843.051,15	100,00%
14	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 36.130,22M ² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2025	150	26/03/2024	R\$ 4.843.051,15	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69427; 69429; 69526; 69534; 69535; 69606; 69607; 69870; 69898; 69899; 69900; 69966; 70006; 77934; 77987; 78146

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
3406	2024	20/03/2024	12433
3408	2024	20/03/2024	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	580522	20/03/2024
12433	2032	580522	20/03/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*2**39**	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*2*.9**-54	ART (CREA)	17**2*6**37**	Orçamento	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**58**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32884	R\$ 4.844.359,88	24/11/2023	
Contrato	23	2024	76.995.448/0001-54	32885	R\$ 4.843.051,15	19/02/2024	100,00%
Aditivo	5	2025	76.995.448/0001-54	33299	R\$ 239.182,93	20/05/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32955	Medição	1	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	0,10%
32977	Medição	2	Jurisdicionado	27/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	15,65%
33023	Medição	3	Jurisdicionado	27/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	15,65%

33068	Medição	4	Jurisdicionado	29/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	15,65%
33090	Medição	5	Jurisdicionado	28/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	70,09%
33129	Medição	6	Jurisdicionado	27/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	70,09%
33150	Medição	7	Jurisdicionado	18/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33188	Medição	8	Jurisdicionado	27/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33218	Medição	9	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33238	Medição	10	Jurisdicionado	28/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33260	Medição	11	Jurisdicionado	26/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33279	Medição	12	Jurisdicionado	27/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33295	Medição	13	Jurisdicionado	28/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	88,83%
33298	Medição	14	Jurisdicionado	30/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	100,00%
33300	Medição	15	Jurisdicionado	30/05/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2025	100,00%
33301	Conclusão	16	Jurisdicionado	30/05/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900191311271



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	
0		0

LOCALIDADE S	DATA BASE	
CURITIBA		09-23 (N. DES.)
Item	Fonte	Código

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.		
1.1.		
1.1.1.	Composição	01
1.2.		
1.2.1.	Composição	02
1.2.2.	SINAPI	99814
1.2.3.	DER-PR	505000
1.3.		
1.3.1.	SINAPI	101125
1.3.2.	SINAPI	95875
1.3.3.	SINAPI	100576
1.3.4.	Composição	04
1.3.5.	Composição	05
1.3.6.	SINAPI	100974
1.3.7.	Composição	06
1.4.		

1.4.1.	SINAPI	90102
1.4.2.	Composição	24
1.4.3.	SINAPI	92210
1.4.4.	DER-PR	603100
1.4.5.	SICRO	2003626
1.4.6.	SINAPI	102737
1.4.7.	SICRO	2003475
1.5.		
1.5.1.	PRCIDADE	810250E
1.5.2.	SINAPI	100576
1.5.3.	SINAPI	96622
1.5.4.	SINAPI	92396
1.5.5.	SINAPI	93679
1.5.6.	SINAPI	98504
1.5.7.	SINAPI	101125
1.5.8.	SINAPI	95875
1.5.9.	PRCIDADE	6050001
1.6.		

1.6.1.	Composição	08
1.6.2.	Composição	03
1.6.3.	SINAPI	94273
1.7.		
1.7.1.	Composição	09
1.7.2.	Composição	18
1.7.3.	SINAPI	100985
1.7.4.	SINAPI	102333
1.8.		
1.8.1.	SICRO	5213863
1.8.2.	SICRO	5213416
1.8.3.	Composição	19

Encargos sociais: Para elaboração

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas Siglas da Composição do Investimento: RA - Ra

PATO BRANCO/PR

Local

sexta-feira,24 de novembro de 2023

Data

| PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASEÁLTICO

PATO BRANCO/PR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PATO BRANCO/PR					
Descrição	Unidade	Quantidade				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00				
SERVIÇOS PRELIMINARES						
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)	UN	1.00				
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36,130.22				
FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO	m3	366.23				
SUB-BASE E BASE						
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	МЗ	139.50				
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	697.48				
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	781.50				
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MACADAME (BASE 96400)	M3	156.30				
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BGS (BASE 96396)	M3	117.24				
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	273.54				
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	781.50				
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	МЗ	569.10
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (BASE: 93360)	МЗ	519.58
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	М	394.00
GRADE FERRO P/ BOCA DE LOBO	ud	7.00
BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA METÁLICA	UNIDADE	39.00
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1.00
DISSIPADOR DE ENEREGIA - DED 01	UNIDADE	1.00
URBANIZAÇÃO		
FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM-0,0171M3/M)	M	2,447.53
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3,983.64
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	М3	79.92
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	804.51
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	793.70
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,385.43
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	МЗ	589.68
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	2,948.44
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 04 - 5,94M2	UNIDADE	108.00
MEIO-FIO		

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO, PALLETIZAÇÃO E TRANSPORTE	М	552.00
REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	М	552.00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	44.20
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	60,052.64
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. EQUIPAMENTOS DER-PR	М3	2,045.73
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	2,045.73
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61,372.06
SINALIZAÇÃO		
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	195.00
PLACA EM AÇO № 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	M2	49.10
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1,927.17

deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicac

decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapar

Responsável Técnico

Nome: DANIEL PARCIANELI

CREA/CAU: SC-720406/D

ART/RRT: 1720236233789

Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 20.50% BDI (%)	BDI 2 0.00% Preço Unitário (com BDI)	BDI 3 0,00% Preço Total (R\$)
	. ,	(R\$)	
			4,844,359.88
			4,844,359.88
12,541.20	BDI 1	15 112 15	15,112.15 15,112.15
12,541.20	PDIT	15,112.15	206,880.06
1,251.87	BDI 1	1,508.50	1,508.50
2.35	BDI 1	2.83	102,248.52
233.68	BDI 1	281.58	103,123.04
			24,803.65
15.44	BDI 1	18.61	2,596.10
2.54	BDI 1	3.06	2,134.29
2.70	BDI 1	3.25	2,539.88
24.21	BDI 1	29.17	4,559.27
14.53	BDI 1	17.51	2,052.87
9.19	BDI 1	11.07	3,028.09
8.38	BDI 1	10.10	7,893.15
			142,050.60

12.70	BDI 1	15.30	8,707.23
25.10	BDI 1	30.25	15,717.30
146.05	BDI 1	175.99	69,340.06
386.51	BDI 1	465.74	3,260.18
917.23	BDI 1	1,105.26	43,105.14
1,048.99	BDI 1	1,264.03	1,264.03
544.95	BDI 1	656.66	656.66
			324,725.55
19.48	BDI 1	23.47	57,443.53
2.70	BDI 1	3.25	12,946.83
126.62	BDI 1	152.58	12,194.19
65.76	BDI 1	79.24	63,749.37
71.57	BDI 1	86.24	68,448.69
11.22	BDI 1	13.52	32,251.01
15.44	BDI 1	18.61	10,973.94
2.54	BDI 1	3.06	9,022.23
443.34	BDI 1	534.22	57,695.76
			26,076.70

		1	
8.53	BDI 1	10.28	5,674.56
25.91	BDI 1	31.22	17,233.44
59.49	BDI 1	71.69	3,168.70
			3,929,247.54
2.80	BDI 1	3.37	202,377.40
1,481.64	BDI 1	1,785.38	3,652,405.43
7.80	BDI 1	9.40	19,229.86
0.75	BDI 1	0.90	55,234.85
			175,463.63
455.72	BDI 1	549.14	107,082.30
419.95	BDI 1	506.04	24,846.56
18.75	BDI 1	22.59	43,534.77

la.				

tida; OU - 100% Outros.



Contrato nº 23/2024/GP.

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Que entre si celebram, o Município de Pato Branco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Robson Cantu, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.461.328/0001-29, Inscrição Estadual nº 9056363839, com sede na Rodovia BR 158, nº 2800, KM 513, Cx Postal 156, Bairro São Francisco, no município de Pato 85.501-970, Telefone (46)3224-1715, (46)licitacoes@grupozancanaro.eng.br, neste ato representada pelo Sr. Fernando Zancanaro, inscrito no CPF nº 006.839.409-88, portador do RG nº 7.115.542-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, nº 780, Bairro Menino Deus, no município de Pato Branco/PR, CEP 85.502-260, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execução dos serviços, adiante especificado, cuja licitação foi promovida através do Edital de Concorrência nº 14/2023, Processo nº 260/2023, sob protocolo nº 21.644/2023 que independente da sua transcrição, integra o presente contrato que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do Código Civil e do Código do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Objeto

I - O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 36.130,22m², através do Contrato de Repasse № 951642/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

Cláusula Segunda – Localização

- I A execução dos serviços terá como ponto de referência as seguintes coordenadas:
 - a) Rua Marins Camargo (Entre a Rua Paraná e a Rua 10 de Maio);

Coordenadas: Início: 26° 13' 24.80" S 52° 40' 48.60" O

Final: 26° 13′ 30.10″ S 52° 40′ 55.40″ O

b) Rua Padre Anchieta Trecho A (Entre a Rua Paraná e a Rua 10 de Maio);

Coordenadas: Início: 26° 13' 19.80" S 52° 40' 53.50" O

Final: 26° 13' 24.90" S 52° 41' 00.20" O

c) Rua Marechal Costa e Silva (Entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Maria Bueno);

Coordenadas: Início: 26° 13' 22.30" S 52° 40' 57.10" O

> Rua Caramuru, 271 · 85.501-064 · Pato Branco/PR 46. 3220-1544 · www.patobranco.pr.gov.br



Final: 26° 13′ 18.90" S 52° 41′ 00.50" O

d) Rua Victor Biazus (Entre a Rua Mal. Costa e Silva e a Rua Visconde de Nacar);

Coordenadas: Início: 26° 13' 20.60" S 52° 40' 58.90" O

Final: 26° 13′ 26.80″ S 52° 41′ 07.00″ O

e) Rua Machado de Assis (Entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Afonso Pena);

Coordenadas: Início: 26° 13' 36.90" S 52° 41' 15.40" O

Final: 26° 13′ 39.40″ S 52° 41′ 10.30″ O

f) Rua dos Dedaleiros (Entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Afonso Pena);

Coordenadas: Início: 26° 13' 39.30" S 52° 41' 16.10" O

Final: 26° 13' 41.00" S 52° 41' 11.00" O

g) Rua Monteiro Lobato (Entre a Rua Afonso Pena e a Rua Itabira);

Coordenadas: Início: 26° 13' 48.10" S 52° 41' 13.10" O

Final: 26° 13' 52.50" S 52° 41' 10.40" O

h) Rua Vicente Machado (Entre Rua Argentina e Rua Itabira);

Coordenadas: Início: 26° 13' 57.20" S 52° 41' 04.40" O

Final: 26° 13' 51.30" S 52° 41' 08.00" O

i) Rua Dalton Trevisan (Entre a Rua Tapir e a Rua Marechal Rondon);

Coordenadas: Início: 26° 13' 39.10" S 52° 41' 05.50" O

Final: 26° 13' 44.60" S 52° 41' 04.90" O

j) Rua Generoso Marques (Entre a Rua Tapir e a Rua Marechal Rondon);

Coordenadas: Início: 26° 13' 44.00" S 52° 41' 03.50" O

Final: 26° 13' 39.10" S 52° 41' 02.90" O

k) Rua Ercília Corona (Entre a Rua Itabira e a Rua Argentina);

Coordenadas: Início: 26° 13' 55.30" S 52° 41' 14.00" O

Final: 26° 13' 58.10" S 52° 41' 09.80" O

I) Rua Martins Afonso de Souza (Entre a Rua Vinícius de Moraes e a Rua Ademir Cunico);

Coordenadas: Início: 26° 12' 38.90" S 52° 41' 09.10" O

Final: 26° 12' 41.00" S 52° 41' 24.60" O

m) Rua Maria Madalena Tatto (Entre a Rua Clevelândia e a Rua Vinícius de Moraes);

Coordenadas: Início: 26° 12' 34.30" S 52° 41' 15.60" O

Final: 26° 12' 27.80" S 52° 41' 08.50" O

n) Rua Augustinho Tatto (Entre a Rua Clevelândia e a Rua José Fraron);

Coordenadas: Início: 26° 12' 34.50" S 52° 41' 26.10" O

Final: 26° 12' 26.80" S 52° 41' 26.90" O

o) Rua Padre Anchieta Trecho B (Entre a Rua Ver. Cacique Ângelo Cretã e a Rua Emiliano Perneta);

Coordenadas: Início: 26° 13' 35.30" S 52° 39' 09.80" O

Final: 26° 13' 41.30" S 52° 41' 16.90" O

p) Rua Rosina Ortolan (Trecho completo);

Coordenadas: Início: 26° 12' 32.00" S 52° 41' 45.30" O

Rua Caramuru, 271 · 85.501-064 · Pato Branco/PR 46. 3220-1544 · www.patobranco.pr.gov.br

verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6223-6E05 Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU



Final: 26° 12' 30.70" S 52° 41' 25.10" O

q) Rua Marechal Rondon (Entre a Rua Caetano Munhoz da Rocha até a Rua Generoso Marques);

Coordenadas: Início: 26° 13' 38.60" S 52° 41' 07.40" O

Final: 26° 13' 39.10" S 52° 41' 02.90"

Cláusula Terceira - Valor

I - O valor global certo e ajustado para a execução do presente contrato é de R\$ 4.843.051,15 (quatro milhões oitocentos e quarenta e três mil cinquenta e um reais e quinze centavos).

Cláusula Quarta - Projetos E Planilhas E Alterações Contratuais

- I Em caso de divergência ou duplicidade, em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
- a) Projetos, especificações e memoriais descritivos.
- b) Planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços.
- II A planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços será meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatório.
- III A omissão ou imprecisão dos instrumentos técnicos instrutores de serviços essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço não exime a contratada da responsabilidade por sua execução, sem ônus adicional para a Contratante.
- IV- As eventuais alterações contratuais que se fizerem necessárias, sob a alegação de falhas ou omissões nos projetos que integram o presente Edital, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, II, do Decreto nº 7.983/13.

Cláusula Quinta - Condições E Regime De Execução

- I A obra será regida sob a forma de execução indireta por regime de "empreitada por preço global", nos termos do Art. 10, II, "a" da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
- II Na execução dos serviços, objetos da presente licitação deverão ser observados, de modo geral, as especificações e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações da fiscalização e dos órgãos ambientais e de controle.
- III Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos e instruções da fiscalização do Município de Pato Branco - PR, através da Secretaria de Engenharia e Obras.
- IV Toda e qualquer alteração que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante.

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6222-6E05 verificar a validade das assinaturas, acesse Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU



Cláusula Sexta - Prazos De Execução E Vigência Contratual

- I Os serviços deverão ser iniciados em até cinco dias após a emissão da Ordem de Serviço, sob pena rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- II Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de serviço após quinze dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Município dar-se-á início da contagem do prazo
- III A contratada terá um prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura da Ordem de Serviço.
- IV O período de vigência contratual será de 300 (trezentos) dias, contados da sua assinatura.
- V O prazo contratual poderá ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- VI O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Cláusula Sétima - Subcontratação

I - Não será permitida a subcontratação.

Cláusula Oitava - Condições De Pagamento

- I O pagamento será efetuado conforme cronograma físico/financeiro aprovado. Vinculadas as medições, com o Laudo de Liberação. A empresa deverá emitir a nota fiscal após autorização no Laudo de Liberação; sendo que os pagamentos deverão ser realizados em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal e demais documentos vinculantes as medições.
- II O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.
- III Não será dispensado na nota fiscal ou fatura, informações básicas, como, descrição do objeto e/ou serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da contratante e da contratada, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato bem como pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, mesmo contendo o código de barras.
- IV A nota fiscal/fatura deverá conter discriminação resumida do objeto, total para cada produto, número da licitação, número do Contrato, número do empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas, deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e dentro de padrão uniforme e nos termos da instrução normativa 1234/12, da RFB que dispõe sobre o IR retido na fonte, requer seja destacado na nota fiscal a alíquota e valor do IR a ser retido.
- V A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).



- VI Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante, juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.
- VII A contratada deverá apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Município, Matrícula do INSS e ART de execução da obra, em até 2 (dois) dias após a emissão da Ordem de Serviço, ou incorrerá no não recebimento da liberação da parcela.

Cláusula Nona - Dotação Orçamentária

- I Para suporte da despesa do objeto da presente licitação serão empregadas as seguintes Dotações Orçamentárias:
- a) 06 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Serviços Públicos. 06.02 Departamento de Engenharia. 154510019.1.001000 Pavimentação e Conservação de vias urbanas - 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Fonte nº 9013 - Convênio Contrato de repasse nº 951642/2. Ação nº 1001. Despesa nº 13552. Desdobramento nº 13553.
- b) 06 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Serviços Públicos 06.05 Departamento de Transito. 267820021.2.032000 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito. 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Fonte nº 509. Gerência de Transito. Ação nº 2032. Despesa nº 536. Desdobramento nº 10305.

Cláusula Décima - Recebimento Da Obra

- I O objeto deverá executado mediante solicitação formal da contratante através da assinatura da Ordem de Serviço.
- II O recebimento do objeto se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso I alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n.º 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:
- A Recebimento provisório pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada.
- 1 Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório pelo Fiscal da Obra, cumpre à contratada a guarda e manutenção dos serviços em perfeitas condições de conservação e funcionamento,
- 2 Após a realização de vistoria que constate o objeto estar de acordo com o que foi contratado ou que já tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal do Contrato emitirá o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório.
- 3 Recebimento Definitivo será realizado pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de Engenharia e Mão de Obra do Município de Pato Branco, para atestar se os serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6222-6E09

termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, limitado a 90 (noventa) dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

- III Durante o prazo de observação de até 90 (noventa) dias, a comissão designada deverá aferir o adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existência de eventuais problemas durante a utilização do bem, tais como:
- A O surgimento de trincamentos, desníveis, ondulação ou afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.
- IV Os defeitos construtivos verificados deverão ser corrigidos pela empresa executante nos termos do art. 69 da lei Federal nº 8.666/93, antes da emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.

Cláusula Décima Primeira - Garantia Dos Serviços E Materiais

- I A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.
- II Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.
- III A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Cláusula Décima Segunda - Obrigações Da Contratada

- I Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas nesse Contrato.
- II Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a vigência do contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, informando a Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.
- III Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e na proposta de preço apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas.
- IV A contratada é responsável perante o Município, por todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicação escrita, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada, inconveniente pelo Município, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias, sindicais, indenizações e despesas por acidentes de trabalho, considerada como única empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.

950E-69E1-6222-6E09 1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 1 pessoa:

- V Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.
- VI Certificar-se preliminarmente de todas as condições exigidas no Contrato, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
- VII Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizações necessárias.
- VIII Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação.
- IX A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.
- X Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso na entrega do objeto desta licitação.
- XI A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho.
- XII Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, contratação de pessoal e demais encargos pertinentes aos serviços, serão de total responsabilidade da Contratada.
- XIII Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e prepostos.
- XIV A Contratada deverá apresentar ao gestor e/ou fiscal do contrato, relação atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.
- XV Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).
- XVI Mensalmente, a contratada enviará à fiscalização cópia do relatório de controle tecnológico dos serviços executados naquele mês.
- XVII Manter em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
- XVIII A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1 1doc.com. verificar a validade das assinaturas, acesse Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU

- XIX Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- **XX** As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou fiscal do contrato.
- **XXI** Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória.
- **XXII** Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser apresentados ao fiscal e/ou gestor do contrato, para sua definição e determinação.
- **XXIII** Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.
- **XXIV** A Contratada deverá apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Município, a ART de execução do projeto em até 2 (dois) dias após a emissão da Nota de Empenho.

Cláusula Décima Terceira - Obrigações Da Contratada Relativas A Critérios De Sustentabilidade

- I As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.
- II Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador (es) das mudanças de comportamento.
- **III** Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
- IV Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
- V Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.
- VI Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
- VII Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
- **VIII** Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
- **IX** Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
- **X** Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6222-6E09 verificar a validade das assinaturas, acesse Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU



- XI Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
- XII É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
- XIII Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
- **XIV** Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- **XV** Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
- XVI Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
- **XVII -** A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
- a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
- **b)** Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
- **XVIII -** Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- XIX Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

Cláusula Décima Quarta - Obrigações Da Contratante

- I Designar pessoa responsável para o acompanhamento, avaliação e conferência da execução dos serviços contratados e os mesmos deverão estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de Serviço.
- **II -** Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
- **III -** Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas.
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
- V Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.
- VI Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
- **VII -** Conferir e acompanhar os serviços, através do fiscal e do gestor do contrato, e caso haja alguma divergência com o serviço solicitado e o entregue, requerer a sua reexecução imediata.



Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU

- **VIII -** Permitir que os funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de execução dos serviços.
- IX Proceder o recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens, designada pelo Município, nos termos da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I.
- **X -** Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.

Cláusula Décima Quinta - Fiscal da Obra, Gestor do Contrato, Técnico Responsável e do Preposto I - Fiscal Da Obra

- a) A Administração indica como fiscal da obra: a Engenheira Civil, **Fernanda Zianni Manarim**, matrícula nº 7.447-0, lotada na Secretaria de Engenharia e Obras.
- **b)** Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal nº 8.296 de 17 de abril de 2018.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

II - Gestor Do Contrato

- a) A administração indica como gestor do contrato, ou outro que vier a substituí-lo:
- i) O Secretário Municipal de Engenharia e Obras, Daniel Parcianello, matrícula nº 11.391-3.
- **b)** Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal nº 8.296 de 17 de abril de 2018, bem como as atribuições previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

III - Técnico Responsável E Do Preposto

- a) O técnico responsável pelo serviço será **Rodrigo Siliprandi** CREA/PR nº PR 28455/D, indicado pela Contratada.
- **b) -** O contratado manterá como preposto, o Sr. **Rodrigo Siliprandi** no local do serviço, para representálo na execução do contrato, a quem poderão ser dirigidas eventuais notificações decorrentes da execução do contrato.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

Cláusula Décima Sexta - Garantia Na Contratação Da Obra

- I Na assinatura do instrumento de contrato, a contratada apresentou a garantia dos serviços, no valor de 5% do valor total do contrato, totalizando **R\$ 242.152,56** (duzentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), na modalidade Seguro Garantia.
- II A garantia prestada pelo contratado somente será liberada ou restituída após a execução do contrato,
 e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6222-6E09 ROBSON CANTU verificar a validade



- **III -** Poderá a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento ou rescisão unilateral do contrato.
- IV Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser mantida atualizada até o recebimento definitivo da obra, independentemente de notificação do Município de Pato Branco, sob pena de rescisão contratual.
- **V** A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitação de eventuais indenizações.
- VI Quando da celebração de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada deverá apresentar renovação da garantia do serviço, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

Cláusula Décima Sétima - Medição e Fiscalização

- I O Município de Pato Branco poderá, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a fiscalização, medição e demais ações que se fizerem necessárias a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado.
- II As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas constantes do cronograma físico financeiro. Para efeito de medição e de faturamento relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico financeiro, que será peça integrante do contrato.
- **III** As medições da obra ou serviços serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem de serviço. A Contratada deverá apresentar a planilha de medição compatível com o cronograma físico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 5 (cinco) dias úteis para análise e conferência da mesma.
- IV A contratada é obrigada a manter o histórico dos serviços executados e condições climáticas para execução dos trabalhos, tais medidas serão observadas através do preenchimento dos diários de obras (conforme modelo disponibilizado em mídia digital). O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dará pela seguinte forma:
- a) Os Diários de Obra serão preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues à Secretaria de Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitação de cada medição ou sempre que solicitado pela fiscalização.

Cláusula Décima Oitava - Penalidades

- I Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e **conforme previsto no Art. 5º do Decreto Municipal nº 8.441/19**, a Contratada ficará sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado pela Administração inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidade das seguintes espécies:
- a) Advertência
- **b)** Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6222-6E05 verificar a validade das assinaturas, acesse Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU



- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração.
- d) Declaração de inidoneidade.
- e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
- II As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item I, poderão ser aplicadas cumulativamente com a do subitem "b".

III - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7º do Decreto Municipal nº 8.441/19:

- a) A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de forma diferente no contrato, poderá ser:
- 1 de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
- 2 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos.
- 3 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante.
- b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais.
- 1 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.
- 2 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração.
- IV O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.
- V A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
- VI Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma.
- VII O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente.

Cláusula Décima Nona - Rescisão

I - Constituem motivos para rescisão contratual, o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos e prazos, a lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria



Municipal de Engenharia e Obras a presumir a não conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados.

II - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei nº 8.666/93, o Município de Pato Branco poderá, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da LL.

Cláusula Vigésima - Reajuste Dos Preços

- I O valor a ser pago para a execução do objeto poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, pelo índice de inflação com a menor variação no período, dentre os seguintes índices: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) e Indicador Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV), considerando-se como data-base para o primeiro reajuste a data da apresentação da proposta.
- II Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
- **III -** Não será concedido reajuste de preços resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorrência da incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.
- a) Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, relativamente a previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerá as condições seguintes:
- i) Quando houver atrasos, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerá os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação.
- ii) Se os preços diminuírem prevalecerá os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação.
- **b)** A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer a mora.

Cláusula Vigésima Primeira - Anticorrupção

I - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.





Cláusula Vigésima Segunda - Foro

- I Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco PR. Para dirimir questões relativas ao presente contrato, com a expressa e formal renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
- II Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposições do Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 19 de Fevereiro de 2024.

Município de Pato Branco - Contratante Robson Cantu - Prefeito Municipal

FERNANDO


***COMPANDA CONTRA C

F. Zancanaro Terraplenagem Ltda - Contratada
Fernando Zancanaro - Representante Legal

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09 e informe o código 950E-69E1-6229-6E09 Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU

CABINETE DO PR

Planilha de Contrato



TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despe sas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	8,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,70%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



Anexo I – Quadro de Composição do BDI

Fonte

Composição

Composição

SINAPI

DER-PR

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Composição

Composição

SINAPI

Composição

SINAPI

Composição

SINAPI

DER-PR

SICRO

SINAPI

SICRO

PRCIDADE

SINAPI

SINAPI

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.1.1.

12

1.2.2

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6

1.3.7.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5

1.4.6.

147

1.5.1.

1.5.2

153

Código

99814

95875

100576

05

100974

06

92210

603100

2003626

2003475

810250E

100576

Planilha de Contrato

Unidade

UN

UN

M2

m3

МЗ

M3XKM

M2

МЗ

МЗ

МЗ

M2

МЗ

МЗ

M

ud

UNIDADE

UN

UNIDADE

M

M2

Quantidade

1,00

1.00

36.130,22

366.23

139,50

697.48

781,50

156,30

117.24

273,54

781.50

569,10

519,58

394,00

7,00

1,00

1,00

2.447,53

3.983,64

79.92

39,00

Descrição

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL. INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF 07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MACADAME

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

DE BRITA GRADUADA SIMPLES - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BGS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, CON SOLO DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS COM

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

RANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016 (BASE: 93360)

BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA METÁLICA

FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM-0,0171M3/M)

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF 08/2017

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0.8Mº/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1.5 A 2.5.

UBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015

ESCONSIDADE DE 0°. INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS, AF 07/2021

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB-BASE E BASE

(BASE 96396)

SERVICOS PRELIMINARES

FRESAGEM CONTINUA A FRIO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

GRADE FERRO P/ BOCA DE LOBO

DISSIPADOR DE ENEREGIA - DED 01

URBANIZAÇÃO

BDI 1

20,50%

BDI

(%)

BDI 1

Custo Unitário

(sem BDI) (RS)

12.537,44

1.251.49

2.35

233.61

15.44

2.54

2,70

24,20

14.53

8.38

12,70

25,09

146,01

386,39

916,95

1.048,68

544,79

19,47

2,70

126 58

BDI 2

0.00%

Preço Unitário

(com BDI) (R\$)

15.107,62

1.508.05

2,83

281.50

18,6

3,06

3,25

29,16

17,51

11,07

10.10

15,30

30,23

175,94

465,60

1.104.92

1.263,66

656,47

23,46

3,25

152,53

0.00%

Preço Total

4,843.051,15

4.843.051,15

15.107,62

15.107,62

206.850.32

1.508,05

102.248.52

103.093.75

24.802,09

2.596,10

2.134.29

2.539.88

4.557,71

2.052,87

3.028,09

7.893.15

8.707,23

15.706.90

69.320.36

3.259.20

1.263,66

324.648,91

57.419,05

12.946,83

12.190,20

656 47

43.091.88

142.005,70

www.patobranco.pr.gov.br 85.501-064 Pato Branco/PR

PATO BRANCO

Planilha de Contrato

			-						
1.5.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	804,51	65,74	BDI 1	79,22	63.733,28
1.5.5.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	793,70	71,55	BDI 1	86,22	68.432,81
1.5.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2C18	M2	2.385.43	11.22	BDI 1	13,52	32.251,01
1.5.7.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COMTRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 5,18M3). AF_07/2020	М3	589,68	15.44	BDI 1	18,61	10.973,94
1.5.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2 948 44	2,54	BDI 1	3,06	9.022,23
1.5.9.	PRCIDADE	6050001	RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL (NBR 9050) - MODELO 04 - 5,94M2	UNIDADE	108,00	443,21	BDI 1	534,07	57.679,56
1.6.			MEIO-FIO						26.069,85
1.6.1.	Composição	08	RETIRADA DE MEIO-FIC DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO, PALLETIZAÇÃO E TRANSPORTE	М	552,00	8,53	BDI 1	10,28	5.674,56
1.6.2.	Composição	03	REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	552.00	25,90	BDI 1	31,21	17.227,92
1.6.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	М	44,20	59,47	BDI 1	71,86	3.167,37
1.7.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						3.928.163,30
1.7.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	60.052.64	2.80	BDI 1	3,37	202.377.40
1.7.2.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. EQUIPAMENTOS DER-PR	M3	2.045,73	1.481,20	BDI 1	1.784,85	3.651.321,19
1.7.3.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	2.045,73	7,80	BDI 1	9,40	19.229,86
1.7.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61.372.06	0,75	BDI 1	0,90	55.234,85
1.8.			SINALIZAÇÃO						175.403,36
1.8.1.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	195,00	455,53	BDI 1	548,97	107.049,15
1.8.2.	SICRO	5213416	PLACA EM AÇO № 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	M2	49,10	419,82	BDI 1	505,88	24.838,71
1.8.3.	Composição	19	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.927,17	18,74	BDI 1	22,58	43.515,50

Valor (R\$)

4.843.051,15

15.107,62

206.850,32

24.802,09

142.005,70

324.648,91

26.069,85

3.928.163,30

175,403,36

Parcelas:

% Período:

% Período:

% Periodo;

% Periodo:

% Período:

% Período:

% Período:

% Período:

% Período:

Investimento:

Investimento:

%:

1

9.12%

39.74%

14,13%

24,50%

16,70%

9,55%

6,73%

9,12%

9,12%

441.527,01

441.527,01

2

23,45%

41,15%

10,73%

21,52%

24,34%

11,14%

23,82%

23,45%

32,57%

1.135.819,57

1.577.346.58

3

26,57%

19,11%

37,66%

32,44%

20,29%

35,33%

28,43%

26,57%

59,14%

1.286,985,16

2.864.331,74

4

21,65%

3,25%

3,44%

28,04%

12,36%

24,15%

21,65%

80,80%

1.048.714,56

3.913.046,30

5

19,20%

100,00%

34,23%

18,00%

10,63%

31,62%

16,87%

100,00%

19,20%

100,00%

930.004,85

4.843.051,15

Total:	R\$ 4.843.051,15	Período:	
		Acumulado:	
		Acuitulauo.	

Descrição

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SUB-BASE E BASE

URBANIZAÇÃO

MEIO-FIO

SINALIZAÇÃO

Item

1.3.

1.6.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 950E-69E1-6222-6E09

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 20/02/2024 17:10:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon REB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/950E-69E1-6222-6E09

Medição 01

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

% Realizado Acum.: 15,65%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV

PROPONENTE TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOME DA EMPRESA F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

% Realizado Período.: 15,65%

Nº CTEF 0

Medição: RUA MARINS
CAMARGO
PAUNE
ANCHIETA TRECHO A
TRECHO A
MARECHAL
COSTA E
RUA VICTOR
BIAZUS

Período: 26/03/2024 a 27/05/2024 MONTEIRO LOBATO RUA VICENTE MACHADO RUA DALTON TREVISAN

MARECHAL RONDON RUA ROSINA ORTOLAN

Nº do	
Evento	Título dos Eventos
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	SUB-BASE E BASE
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6	URBANIZAÇÃO
7	MEIO-FIO
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
9	SINALIZAÇÃO

	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																				
							1		1		1				1			1			
							1		1		1				1						
***************************************																 	***************************************				

Medições					
Períod	o:				
Acumulad	o:				

	Data das Medições											
	27/05/2024											
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	758.053,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%
R\$	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41

PATO BRANCO/PR

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização Fernanda Zianni Manarim Nome:

Profissão: Engenheira Civil CREA/CAU: 107.389/D ART/RRT: 1720242053959

Documento assinado digitalmente FERNANDA ZIANNI MANARIM Data: 13/06/2024 08:56:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 36.130,22m², através do Contrato de Repasse № 951642/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

CONTRATO Nº23/2024/GP

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro

Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Página **1** de **9**

27/05/2024

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





Página 2 de 9





Página **3** de **9**





Página **4** de **9**





Página **5** de **9**





Página **6** de **9**





Página **7** de **9**






Página **8** de **9**



Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 758.053,41.**

Pato Branco, 27 de Maio de 2024.



Fernanda Zianni Manarim Engenheira Civil CREA-PR 107.389/D





Créditos: Município de Pato Branco











Medição 02

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Período:

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

% Realizado Acum.: 70,09%

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPONENTE TOMADOR

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

28/05/2024 a 28/08/2024

NOME DA EMPRESA
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

% Realizado Período.: 54,44%

N° CTEF

UA MARINS AMARGO AURE NCHIETA -
1 CAMAR TRECHIE

				_																				
CAMARGO	ANCHIETA - TRECHO A	KUA MARECHAL COSTA F	RUA VICTOR BIAZUS		KUA MACHADO DE ASSIS	RUA DOS DEDALEIROS	kua Monteiro Lobato	RUA VICENTE MACHADO	RUA DALTON TREVISAN	KUA GENEROSO MARQUES	RUA ERCÍLIO CORONA	KUA MAKTIN AFONSO DE SOUZA	KUA MADALENA TATTO	KUA AUGUSTINHO TATTO	KUA PADRE ANCHIETA - TRCHO B		KUA MARECHAL RONDON	RUA ROSINA ORTOLAN	GERAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe shaive a NUMERO DA MEDICÃO em que os eventos foram concluídos																							

Nº do	
Evento	Título dos Eventos
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	SUB-BASE E BASE
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6	URBANIZAÇÃO
7	MEIO-FIO
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
9	SINALIZAÇÃO

					Inform	ne abai	xo o N	ÚMER	O DA N	1EDIÇ <i>Â</i>	O em	que os	evento	s fora	m cond	luídos					
				2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1		2	2	1			
				2	2		2		2		2	2	2			2	2	-			
				2	2		2	2	2			2	2				2				
											2										
				2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1		2	2				

Medi	ções
	Período:
А	cumulado:

						Data das	Medições					
	27/05/2024	28/08/2024										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,65%	54,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	758.053,41	2.636.323,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	15,65%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%
R\$	758.053,41	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47

PATO BRANCO/PR

Loca

quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fernanda Zianni Manarim

Profissão: Engenheira Civil CREA/CAU: 107.389/D ART/RRT: 1720242053959

Medição 02

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPONENTE TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOME DA EMPRESA

F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

N° CTEF 0

Nº do	
Evento	Título dos Eventos
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	SUB-BASE E BASE
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6	URBANIZAÇÃO
7	MEIO-FIO
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Medições
Período:
Acumulado:

						Data das	Medições					
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,65%	54,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	758.053,41	2.636.323,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	15,65%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%	70,09%
R\$	758.053,41	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47	3.394.376,47

PATO BRANCO/PR

quarta-feira, 28 de agosto de 2024 **Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização Fernanda Zianni Manarim

Nome: Profissão: Engenheira Civil CREA/CAU: 107.389/D ART/RRT: 1720242053959

Documento assinado digitalmente FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 28/08/2024 15 Data: 28/08/2024 16:41:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 36.130,22m², através do Contrato de Repasse № 951642/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

CONTRATO Nº23/2024/GP

Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro

Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





Página 2 de 21





Página 3 de 21





Página 4 de 21





Página **5** de **21**





Página **6** de **21**





Página **7** de **21**





Página 8 de 21





Página **9** de **21**





Página **10** de **21**





Página **11** de **21**





Página **12** de **21**





Página **13** de **21**





Página **14** de **21**





Página **15** de **21**





Página **16** de **21**





Página **17** de **21**





Página **18** de **21**





Página **19** de **21**





Página **20** de **21**

Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 2.636.323,06.**

Pato Branco, 28 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente


FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 19/09/2024 11:58:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda Zianni Manarim Engenheira Civil CREA-PR 107.389/D

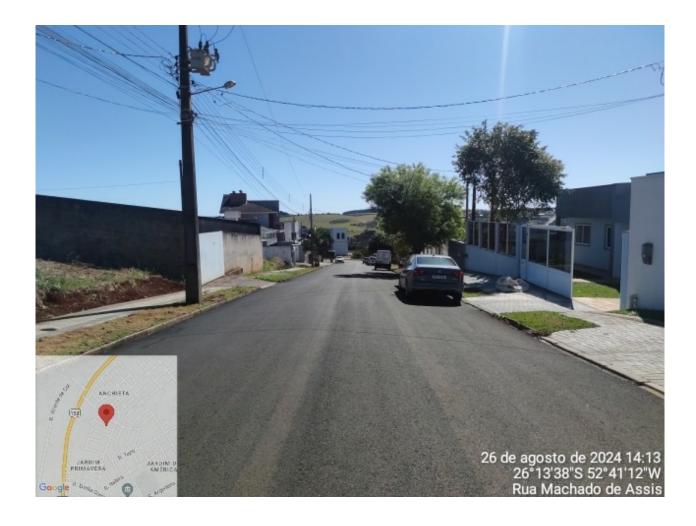






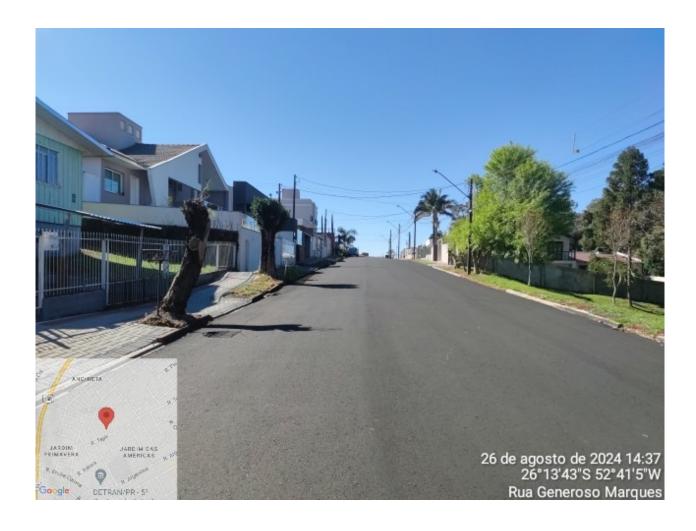





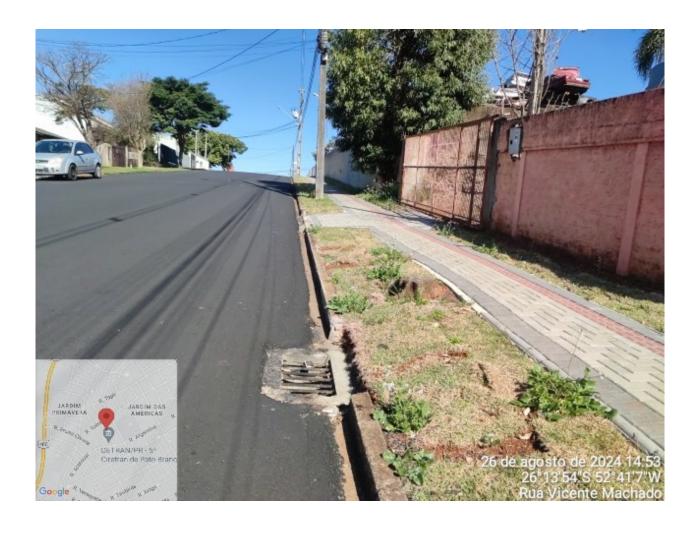












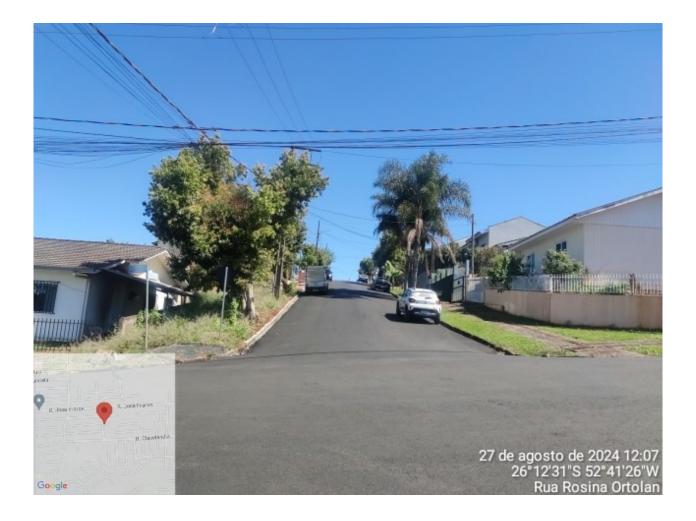







CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Período:

DO DE

Grau de Sigilo #PUBLICO

% Realizado Acum.:

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV 951642/2023 PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Medição:

APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

29/08/2024 a 14/10/2024

NOME DA EMPRESA F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

% Realizado Período.: 18,74%

N° CTEF 023/2024-GP

88,83%

Nº do	
Evento	Título dos Eventos
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	SUB-BASE E BASE
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6	URBANIZAÇÃO
7	MEIO-FIO
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
9	SINALIZAÇÃO

L RUA N	Z ANCHI	3 MARE	RUA V BIAZU	5	MACH ASSIS	2 RUA D DEDAI	RUA MONT LOBAT	6 MACH	RUA D TREVI	KUA GENEI MARO	RUA E CORO	KUA IV ROAFON SOUZ,	MADA TATTO	HOA TATTO	FUA P ANCHI TRCH	17	KUA MARE ROND	80 RUA R	20	21	22	23	24	2!
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
3	3	3	3		2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1		2	2	1					
3	3	3	3		2	2		2		2		2	2	2			2	2						
3	3	3	3		2	2		2	2	2			2	2				2						
												2												
3	3	3	3		2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1		2	2						

Medições	
Período):
Acumulado):

	Data das Medições														
	27/05/2024	28/08/2024	14/10/2024												
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12			
%	15,65%	54,44%	18,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
R\$	758.053,41	2.636.323,06	907.776,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
%	15,65%	70,09%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%	88,83%			
R\$	758.053,41	3.394.376,47	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33	4.302.153,33			

PATO BRANCO/PR

Loca

segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fernanda Zianni Manarim

Profissão: Engenheira Civil CREA/CAU: 107.389/D ART/RRT: 1720242053959

Documento assinado digitalmente



FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 18/10/2024 17:04:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Execuçãode serviços de recapeamento asfáltico sobrepavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetrourbano do município de Pato Branco, com área total de 36.130,22m², através do Contrato de Repasse №951642/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades,Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando aExecução De Ações Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da SecretariaMunicipal de Engenharia e Obras.

CONTRATO Nº23/2024/GP

Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro


Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a terceira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:






Página **2** de **6**

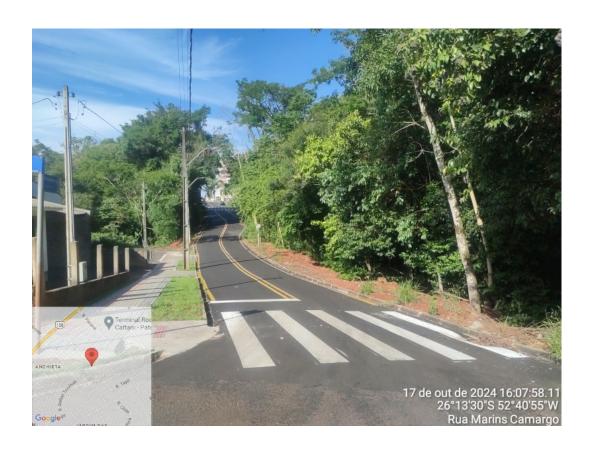



Página **3** de **6**

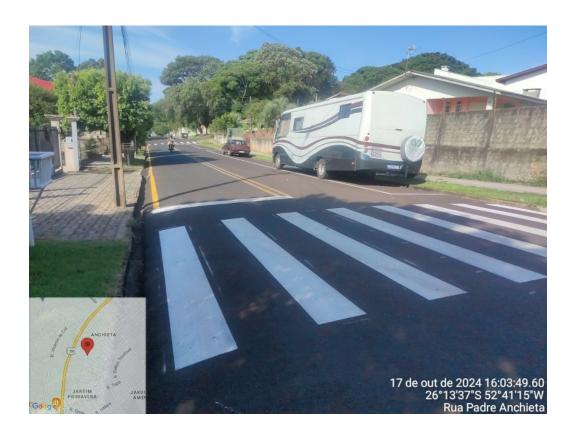




Página **4** de **6**





Página **5** de **6**

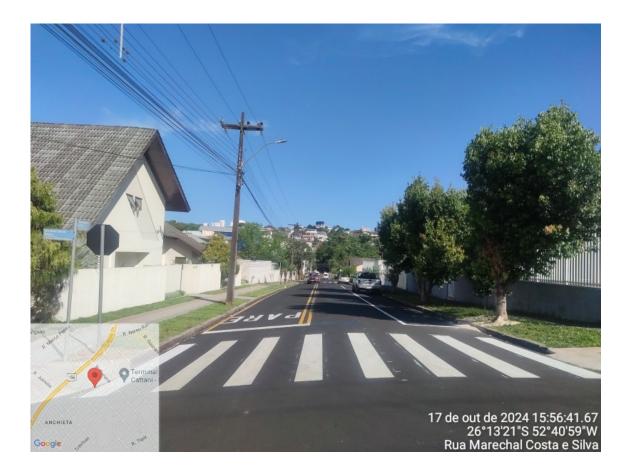

Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de**R\$907.776,86.**

Pato Branco, 14 de Outubro de 2024.



Fernanda Zianni Manarim Engenheira Civil CREA-PR 107.389/D

Página 6 de 6

